

Oaxaca

Mitla-Entronque Tehuantepec II



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance físico Global:

Programado: 100%

Semanal: 0.00%

Real: 99.14%

Avance físico Tramo 2:

Real: 97.42%

Avance Financiero:

Real pagado: 88.56%

Con deuda: 97.42%

Nota: De este porcentaje se tiene una deuda de 2,635.1 mdp incluye IVA, por trabajos ejecutados.



Descripción		Descripción		Descripción	
1	PIV km 87+900. 40% *	8	Entronque Llano Laguna km 98+200.	15	PIV km 112+270.
2	PIV km 91+530.	9	Entronque Cerro Pascale km 100+500.	16	PIV km 114+766.
3	PIPR km 92+436.	10	PIV km 106+570.	17	Entronque Agua Blanca Km 122+600.
4	PIV km 92+438.	11	PIV km 108+570.	18	Entronque Quiavicuzas Km 137+900.
5	PIV km 92+680. 0% *	12	PIV km 109+247.	19	Túnel El Tornillo km 139+400 (Colapsado). En elaboración proyecto del puente.
6	Entronque Llano Crucero km 92+690. 82% *	13	PIV km 110+460.	20	PIPG Km 146+840. 95% *
7	Muro de pilas km 92+700. 32% *	14	Entronque Danigare km 111+600.	21	PIPG km159+400. 95% *

**Inversión:** 29,749.2 mdp incluye I.V.A sin incluir reclamos

**Término:** Inaugurada y puesta en operación 24 de enero de 2025 (pendiente obras complementarias)

**Meta:**169.23 km; el cual son 159.29 km de Troncal, 6.54 km de puentes, 1.78 km de viaductos y 1.62 km de túneles.
65 puentes, 14 viaductos, 10 túneles, 20 entronques, 2 casetas y 17 pasos de servidumbre.
En proceso: Trabajos en la troncal, 1 entronque y 8 pasos de servidumbre
❖ **Nota: De los pasos de servidumbre 9 están terminados, 2 con un 95%, 1 al 40% y 5 sin iniciar**
❖ **El Túnel Tornillo se encuentra colapsado y en proceso proyecto del puente**

**10 Empleos directos generados**
30 Empleos indirectos generados
**+1 millón 400 mil habitantes beneficiados**
**2 hrs. de ahorro en tiempo**

Concesionaria: Autovía Mitla Tehuantepec, S.A. de C.V. (IDEAL)

* No hay avances debido a la falta de asignación de recursos

Oaxaca

Mitla-Entronque Tehuantepec II


Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	03/04/26 al 09/04/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Muro de pilas km 92+700						
Perforación de pilastrones	38	17	21	0	0	• Trabajos suspendidos por falta de asignación de recursos.
Armado y colado de pilastrones	38	17	21	0	0	

❖ Nota: A partir de esta fecha, ya no existirán avances debido a la considerable deuda que se tiene con las empresas contratadas por la concesionaria a la fecha y la falta de recursos presupuestales.

Maquinaria:

- Excavadora (1) inactivo

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Mitla - Tehuantepec

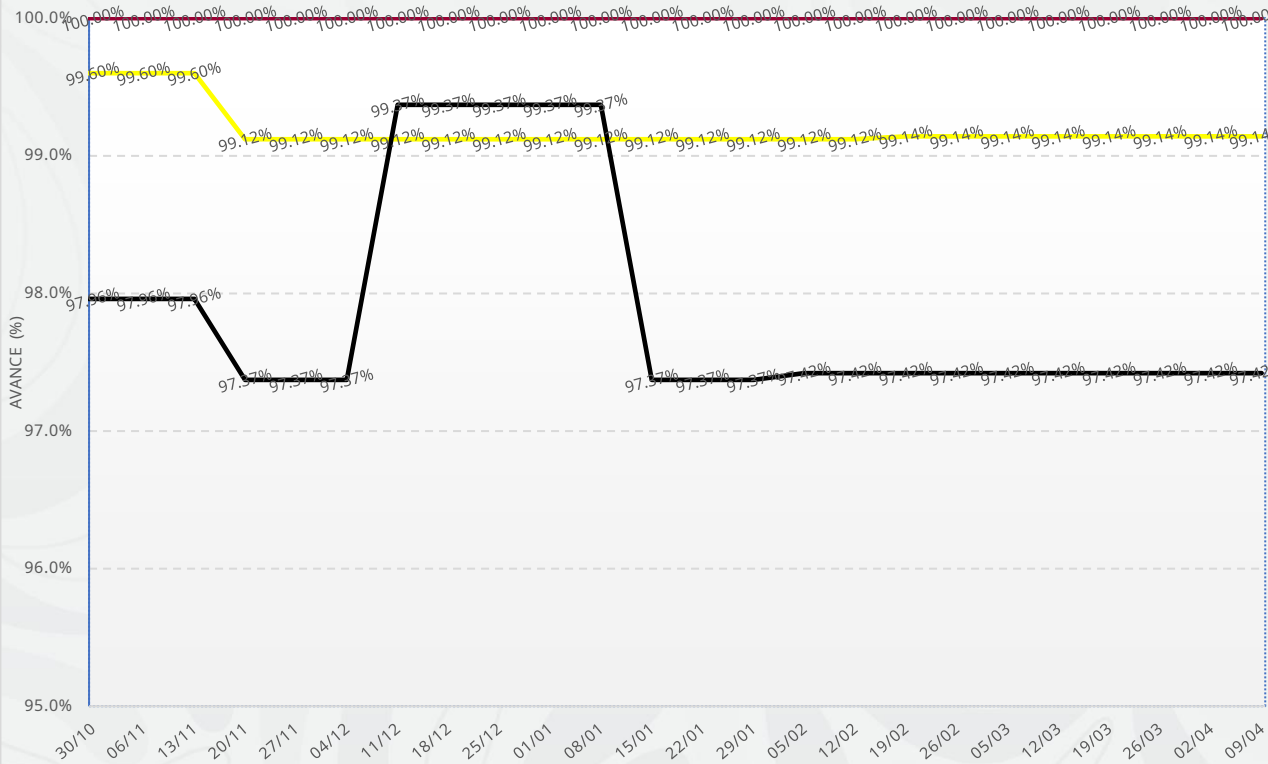

Avance Programado Avance físico Avance Financiero

	27 de marzo al 02 de abril de 2026	03 de abril al 09 de abril de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	10	10
Maquinaria	0	0
Frente de Trabajo	No Aplica	No Aplica
