


Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

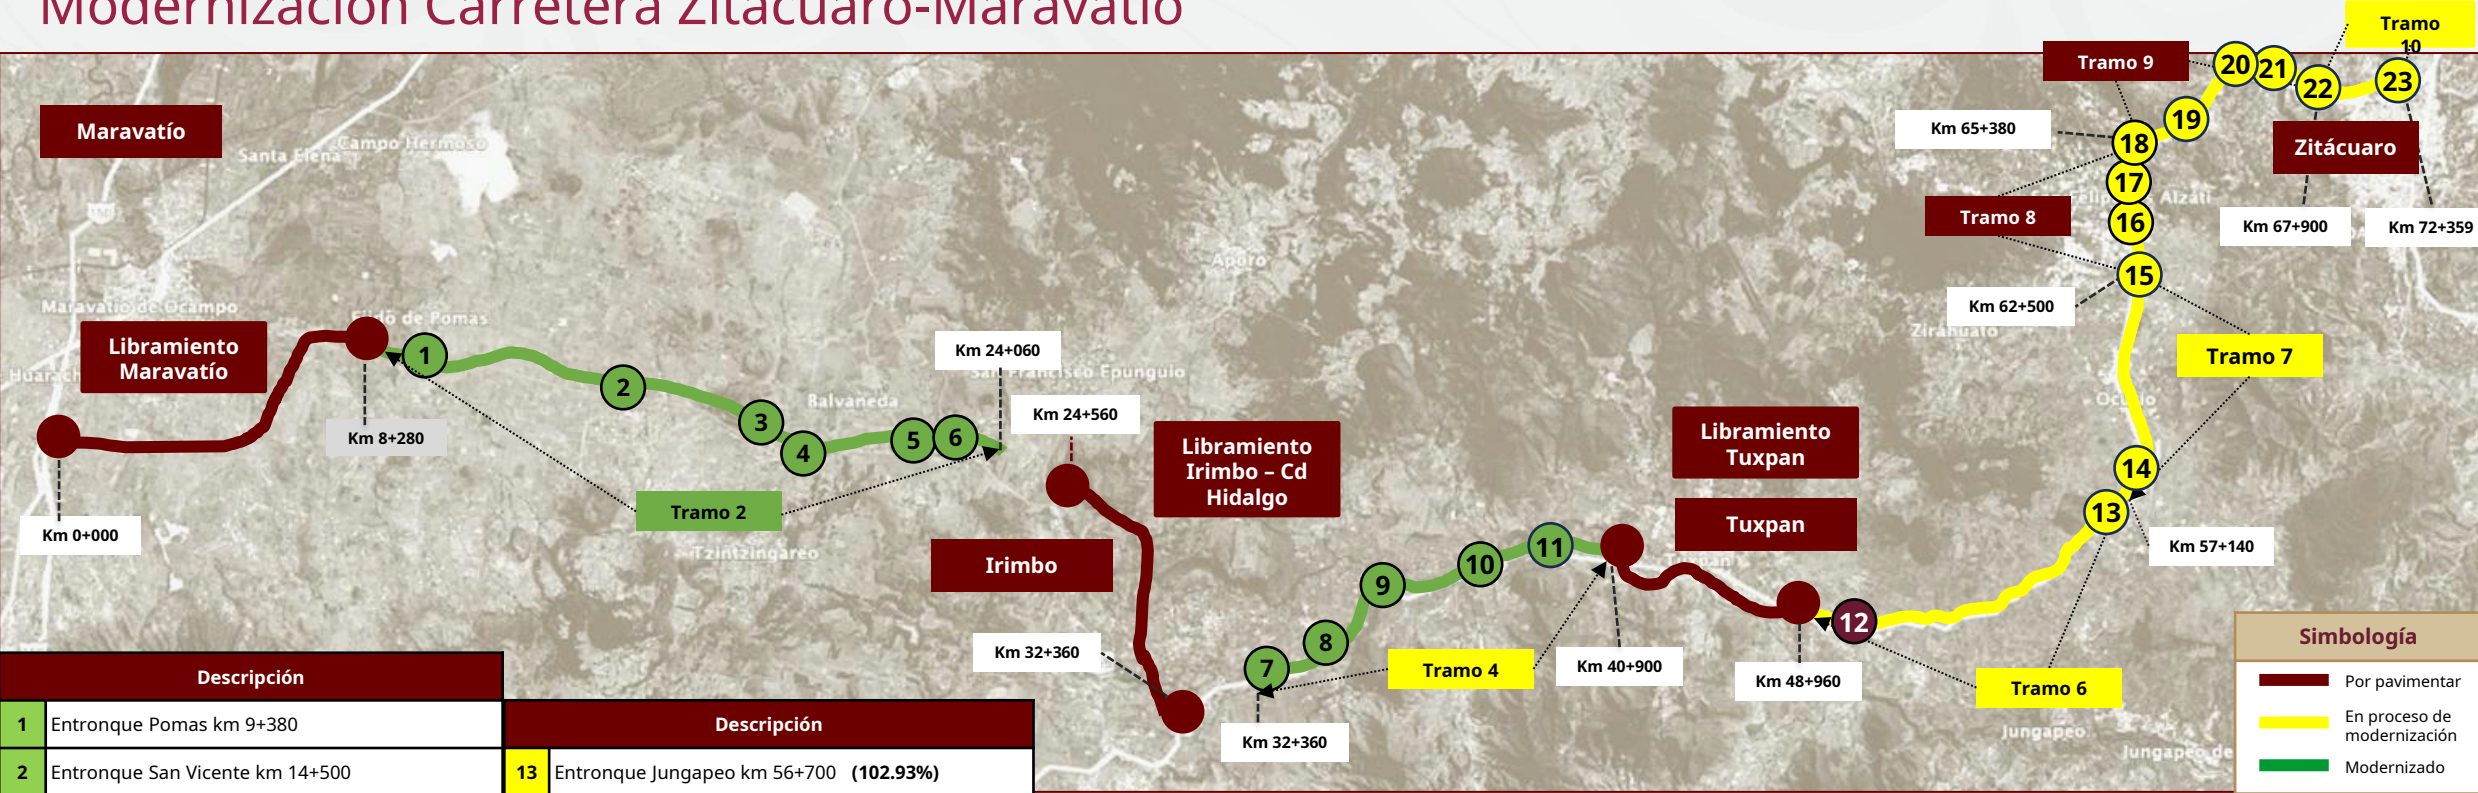

Avance físico

- Programado: 62.12% (Reprogramación T8)
- Real: 64.36%
- Semanal: 0.54%
- Financiero: 17.56%

Nota 1:

Los avances se calculan en relación a la Inversión total del Ramal

*Transición de PSV a PIV con incremento en volúmenes de obra y ejecución.



Inversión: \$4,575.3 mdp (total Ramal)
\$3,048.81 mdp (modernización)
\$1,526.49 mdp (Libramientos)



4,800 empleos generados



Meta: 71.3 Km



126,000 habitantes beneficiados



Inicio: septiembre 2020
Reinicio: 27 de enero de 2024
Término: 31 de diciembre de 2026




Ahorro en tiempo: 25 min

Concesionaria: Red de carreteras de occidente

Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

TERRACERIAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 03 abr al 09 abr 26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Cortes (m3)	705,558.00	775,145.89	-69,587.89	0.00	2,895.11	
Terraplén (m3)	445,687.00	451,164.38	-5,477.38	496.58	2,958.34	
Subyacente (m3)	256,097.00	271,001.24	-14,904.24	240.15	1,702.23	
Subrasante (m3)	170,688.00	175,717.26	-5,029.26	392.92	1,065.69	
PAVIMENTOS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 03 abr al 09 abr 26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Base Hidráulica (m3)	125,659.04	125,558.86	100.18	1,169.86	1,526.93	
Bacheo (m3)	1,800.00	1,835.25	-35.25	29.23	4.50	SE ESTÁN TRABAJANDO TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 6 Y 9
Fresado (m3)	10,676.00	10,837.08	-161.08	39.23	54.16	
Rayado Carpeta (Ha)	30.24	29.83	0.41	0.27	0.33	
Base Asfáltica (m3)	120,414.05	122,368.60	-1,954.55	1,106.80	1,128.62	
Carpeta Asfáltica (m3)	45,247.80	33,909.17	11,338.63	41.40	766.69	
ESTRUCTURAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 03 abr al 09 abr 26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
PSV SAN FELIPE	1.00	0.5224	0.4776	0.0415	0.0043	CONFORMACIÓN DE TERRACERÍAS
PSV SAN JUAN VIEJO	1.00	0.9763	0.0237	0.0201	0.0079	APROCHE DE CABEZALES
PSV ZITÁCUARO	1.00	0.9601	0.0399	0.0533	0.0033	CONFORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA
DEFENSA METÁLICA	35,327.00 ml	31,632.52 ml	3,694.48 ml	142.08 ml	132.05 ml	SE INSTALA EN TRAMOS AISLADOS DISPONIBLES
BALIZAMIENTO	157,137.60 ml	82,638.75 ml	74,498.85 ml	965.69 ml	1,091.95 ml	CONTINÚA LA COLOCACION EN TRAMO 6.
CUNETAS	12,028.95 ml	10,740.63 ml	1,288.32 ml	74.19 ml	33.50 ml	CONTINÚA LA CONSTRUCCIÓN EN TRAMO 6
BOTONES	12,041.00 pza	9,381.00 pza	2,660.00 pza	27.00 pza	35.00 pza	INICIA LA COLOCACION EN TRAMO 6.
VERTICAL BAJO	1,011.00 pza	678.00 pza	333.00 pza	6.00 pza	14.00 pza	INICIA LA COLOCACIÓN EN TRAMO 6.

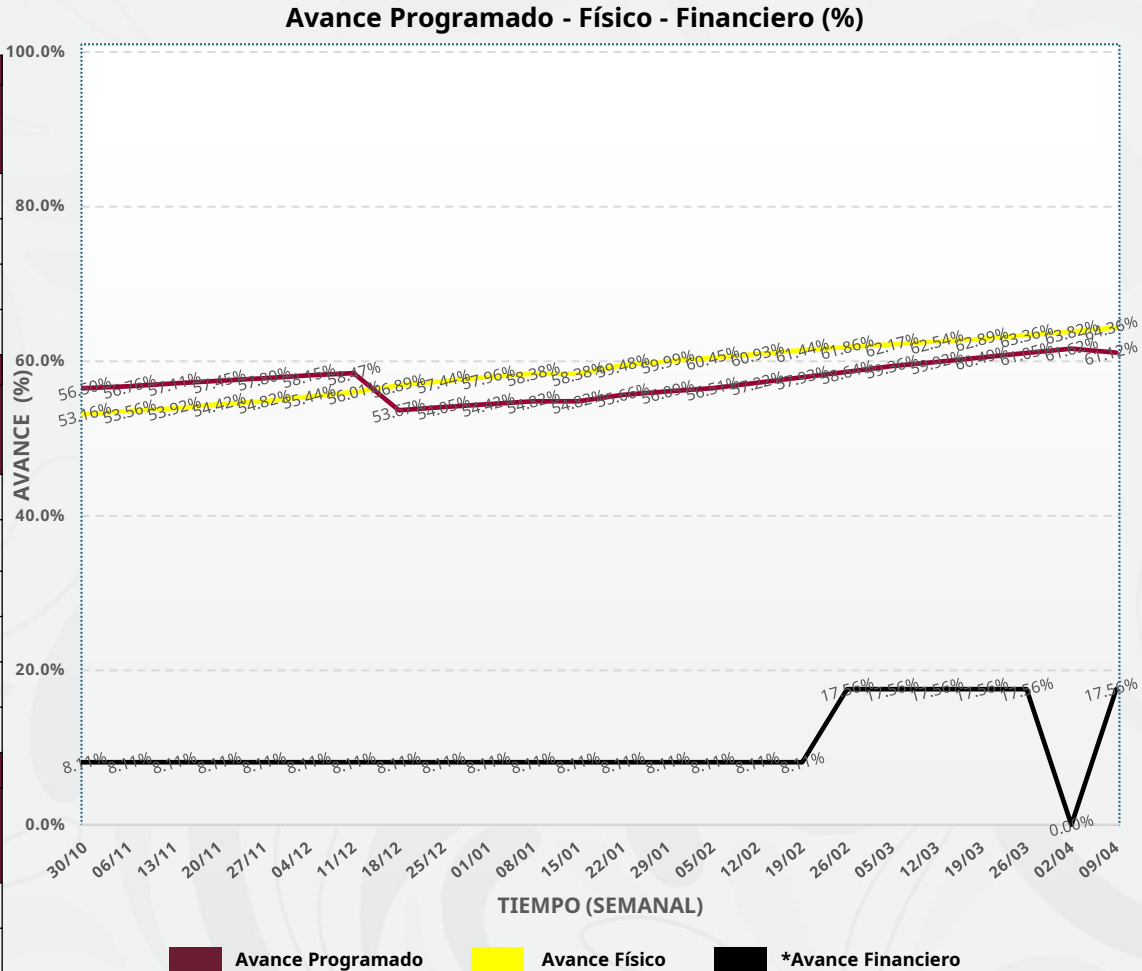

	Del 27 mar al 02 de abr 26	Del 03 al 09 de abr 26
Fuerza de Trabajo (personas)	289	289
Maquinaria	190	191
tramos activos	IV, VI, VII, VIII, IX, X	IV, VI, VII, VIII, IX, X
Frentes de trabajo (totales)	28	28
