

# San Luis Potosí

## La Pitahaya-Libramiento Oriente de S.L.P. y el Ramal Villa de Reyes



**Comunicaciones**

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

**Avance físico** • Programado: **7.96%**  
• Real: **4.65%**

**Avance financiero: 5.26%**



**Inversión:** 8,331.12 mdp.  
Incluye I.V.A.



**Inicio:** julio 2024  
**Término:** 14 de febrero 2028



**Meta:** 68.5 km. + 2.4 Km del Ramal  
79 Estructuras; Puentes, PSV'S,  
PSFCC, PIV'S.  
1 Plaza de Cobro, 5 Entronques,  
165 ODT'S.




**2000** Empleos directos generados  
**600** Empleos indirectos generados



**128 000** habitantes beneficiados

**20 minutos** de ahorro en tiempo

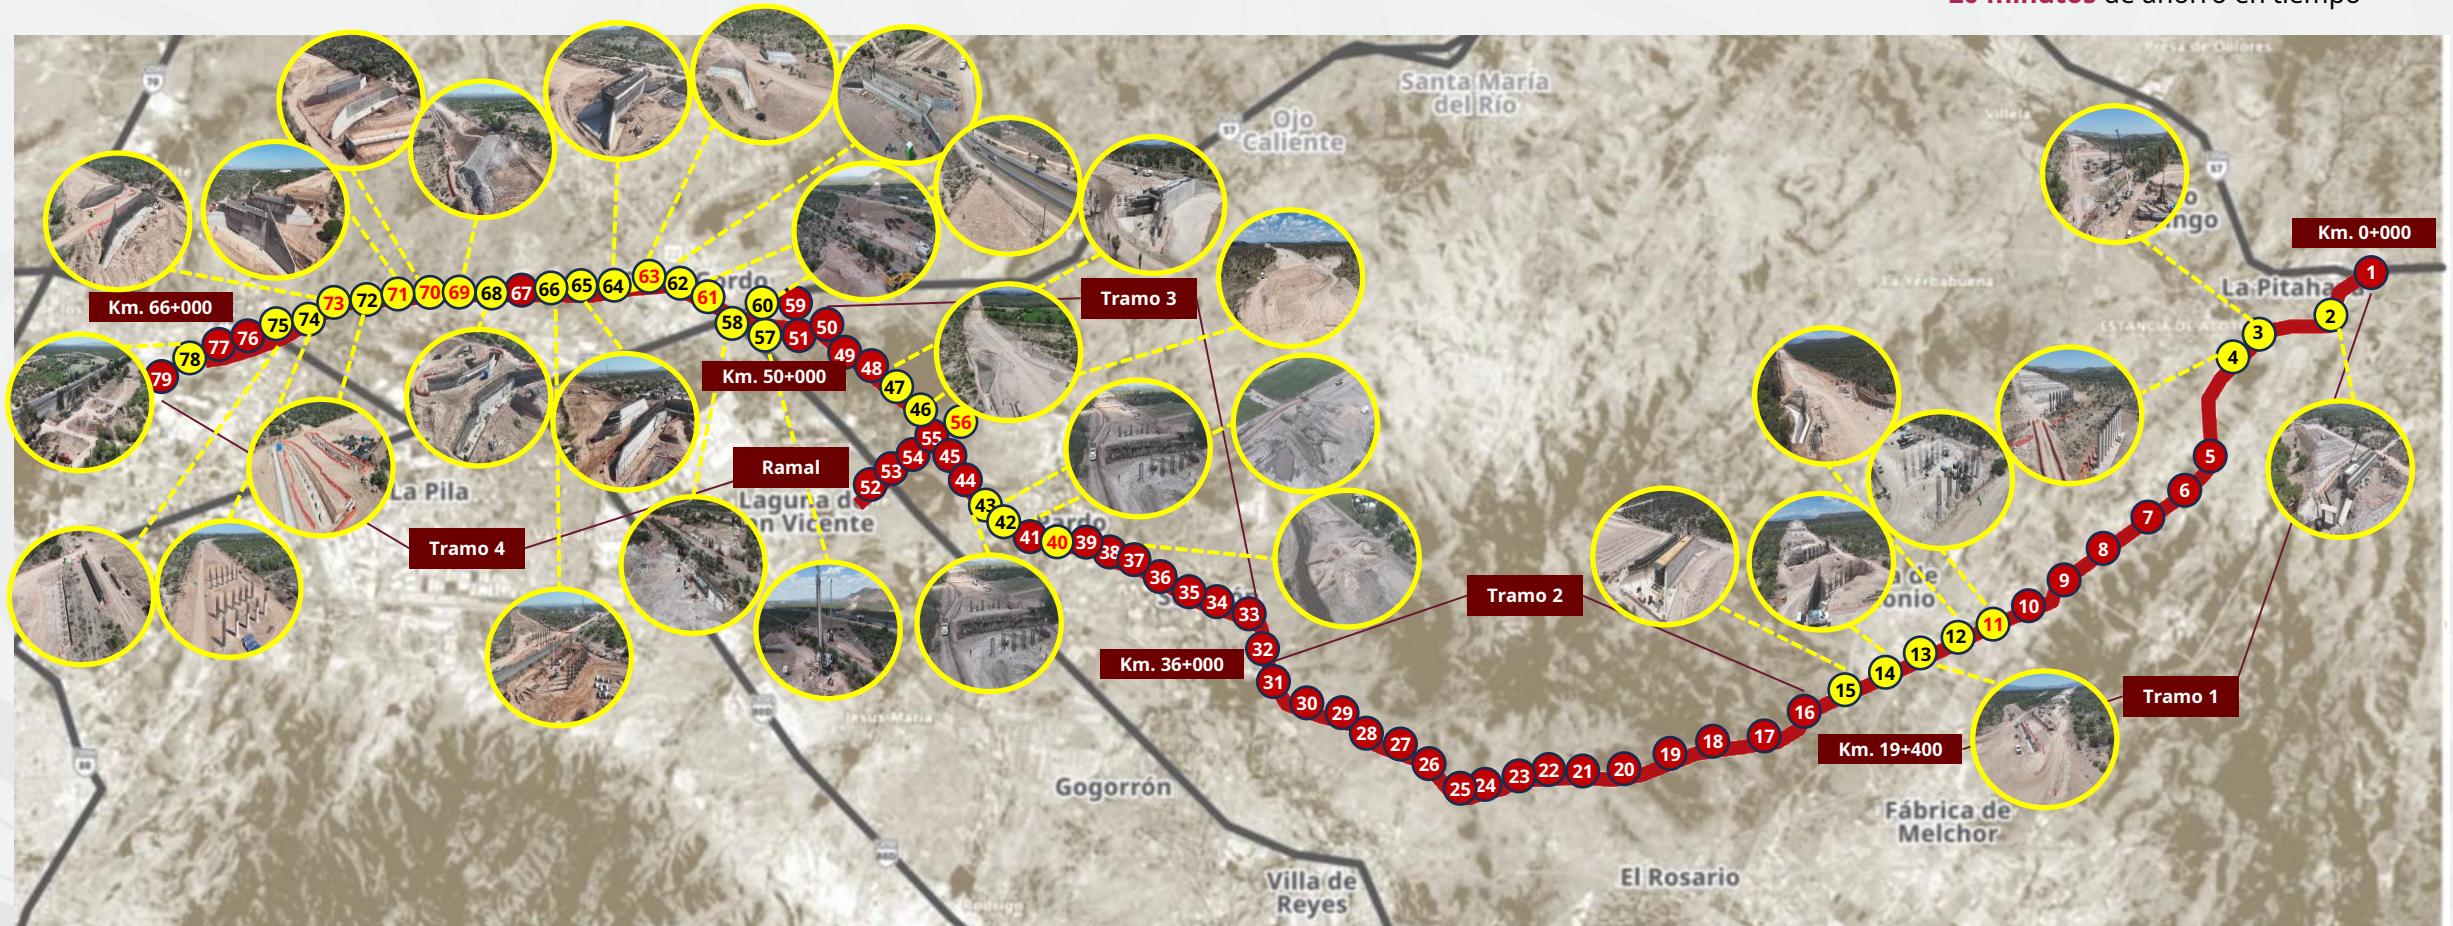





### Estructuras Proyectadas por Tramo

#### Tramo 1

| Descripción                      | Descripción                       | Descripción                        |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 Ent. La Pitahaya Km. 0+500     | 7 PSFFCC Km. 12+780               | 13 Ducto Km. 18+426 <b>35.00%</b>  |
| 2 PSV Km. 2+096.73 <b>56.00%</b> | 8 PIV Km. 12+930                  | 14 Puente Km.18+610 <b>40.00%</b>  |
| 3 Puente Km. 2+481 <b>3.30%</b>  | 9 PSV Km. 14+043                  | 15 Dob Ca Km. 18+820 <b>78.00%</b> |
| 4 Ducto Km. 2+680 <b>43.0%</b>   | 10 PIV Km. 14+810                 |                                    |
| 5 PIV Km. 9+289.75               | 11 PSFFCC Km. 16+250 <b>5.90%</b> |                                    |
| 6 Ducto Km. 10+853               | 12 PIV Km. 17+530 <b>28.0%</b>    |                                    |

#### Tramo 2

| Descripción           | Descripción          | Descripción                    |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 16 PSG Km.121+870     | 22 Ducto Km. 129+005 | 28 Puente Km. 134+662          |
| 17 PSV Km. 123+453    | 23 PSV Km. 130+725   | 29 PSG Km. 135+950             |
| 18 Puente Km. 123+608 | 24 PSG Km. 131+530   | 30 PIV Km. 137+310             |
| 19 PSV Km. 126+360    | 25 PSV Km. 132+820   | 31 Puente Carranco Km. 137+820 |
| 20 PSV Km. 128+210    | 26 Ducto Km. 134+020 |                                |
| 21 Puente Km. 128+420 | 27 PSV Km. 134+604   |                                |

#### Estructuras Sin Actividad

|    |                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | PSFFCC Km. 16+250 <b>5.90%</b> (la fuerza de trabajo se movió a otra actividad)                                       |
| 56 | Ec.IndPSVKm18+700 <b>4.80%</b> (la fuerza de trabajo se movió a otra actividad)                                       |
| 73 | PSV Km. 63+517.92 <b>46.60%</b> (la fuerza de trabajo se movió a otra actividad)                                      |
| 40 | PSG Km. 41+981.48 <b>3.00%</b> (en espera del suministro de acero)                                                    |
| 61 | Ec Carr. 57 Km.51+800 <b>0.01%</b> (la fuerza de trabajo se movió a otro actividad)                                   |
| 63 | PIV Km. 53+150.26 <b>46.60%</b> (la fuerza de trabajo se movió a otro actividad)                                      |
| 69 | PSV Km. 59+030 <b>2.01%</b> (se esta revisando unas filtraciones)                                                     |
| 70 | PSV Km. 60+5.79 <b>39.00%</b> (pendiente de autorizar libranza de postes de CFE)                                      |
| 71 | PSV Km. 61+561.78 <b>67.00%</b> (estructura sin actividad en espera la colocación de neoprenos y montaje de traveses) |

#### Tramo 3

| Descripción                       | Descripción                        | Descripción                       |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 32 PIV Km. 36+719.53              | 41 PSV Km. 42+386                  | 50 PIV Km. 49+120                 |
| 33 PIV Km. 37+739.99              | 42 PSG Km. 42+650 <b>1.00%</b>     | 51 PIV Km. 49+900                 |
| 34 PSV Km. 38+242.30              | 43 Puente Km. 42+990 <b>15.90%</b> | 52 E.c. Car 37 PSV Km. 16+540     |
| 35 Puente Altamira Km. 39+520     | 44 PSV Km. 43+456.78               | 53 PSV Km. 17+040                 |
| 36 PSG Km. 39+750                 | 45 PSV Km. 43+577.34               | 54 PSV Km. 17+610                 |
| 37 PIV Km. 40+349.53              | 46 PIV Km. 44+243.13 <b>6.50%</b>  | 55 PIV Km. 18+365                 |
| 38 PIV Km. 41+119.44              | 47 PSG Km. 45+380 <b>90.50%</b>    | 56 Ec.IndPSVKm18+700 <b>4.80%</b> |
| 39 Ducto Km. 41+532.47            | 48 Ducto Km. 45+517                |                                   |
| 40 PSG Km. 41+981.48 <b>3.00%</b> | 49 PSG Km. 46+930                  |                                   |

#### Tramo 4

| Descripción                           | Descripción                        | Descripción                         |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 57 Ducto Km. 51+500 <b>11.46%</b>     | 66 PSV Km. 55+407 <b>18.90%</b>    | 75 Ducto Km. 65+79.31 <b>32.45%</b> |
| 58 Ducto Km. 10+333 <b>52.14%</b>     | 67 PIV Km. 56+354.38               | 76 Ec Lib Ote Km. 66+000            |
| 59 PSV Km. 10+500                     | 68 PSV Km. 58+505 <b>36.20%</b>    | 77 PSV Km. 66+441.21                |
| 60 Ducto 20+580 <b>21.40%</b>         | 69 PSV Km. 59+030 <b>2.01%</b>     | 78 PSV Km. 66+449.24 <b>8.90%</b>   |
| 61 Ec Carr. 57 Km.51+800 <b>0.02%</b> | 70 PSV Km. 60+579.85 <b>39.00%</b> | 79 PSV Km. 1+412                    |
| 62 PSG Km. 52+190 <b>32.30%</b>       | 71 PSV Km. 61+561.78 <b>67.00%</b> |                                     |
| 63 PIV Km. 53+150.26 <b>46.60%</b>    | 72 PSV Km. 62+398.36 <b>22.40%</b> |                                     |
| 64 PSV Km. 54+424.37 <b>74.50%</b>    | 73 PSV Km. 63+517.92 <b>46.60%</b> |                                     |
| 65 PSV Km. 54+952.42 <b>61.20%</b>    | 74 PSV Km. 64+800 <b>24.90%</b>    |                                     |

#### Simbología

|                                                                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <span style="background-color: #800000; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></span> | Por construir              |
| <span style="background-color: #FFFF00; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></span> | En proceso de construcción |
| <span style="background-color: #008000; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></span> | Concluido                  |


# San Luis Potosí

## La Pitahaya-Libramiento Oriente de S.L.P. y el Ramal Villa de Reyes



| Volúmenes de obra                                                                            |              |                     |              |           |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------|----------------------|
| Tramo I km. 0+000 al Km. 19+400                                                              |              |                     |              |           |                      |
| Tramo III Km. 36+000 al Km. 50+000                                                           |              |                     |              |           |                      |
| Tramo IV km. 50+000 al Km. 66+000                                                            |              |                     |              |           |                      |
| Elemento                                                                                     | Intervención | Ejecutado acumulado | Faltante     | Ejecutado | 24/04/26 al 30/04/26 |
| Terracerías                                                                                  |              |                     |              |           |                      |
| Desmante, cualquiera que sea su tipo y características en carreteras, sin trasplante,        | 388.22       | 238.71              | 149.51       | -         |                      |
| Despalme de espesor variable en corte y terraplén, el material producto                      | 733,873.06   | 319,221.29          | 414,651.77   | 53.75     |                      |
| Excavaciones en cortes y adicionales debajo de la subrasante, cualquiera que sea su          | 2,860,090.52 | 180,374.55          | 2,679,715.97 | 1,511.10  |                      |
| Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de                | 3,858,592.51 | 212,595.61          | 3,645,996.90 | 39,096.89 |                      |
| Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de                | 3,710,618.07 | 345,827.44          | 3,364,790.63 | 44,015.62 |                      |
| Formación y compactación de terraplenes utilizando materiales compactables                   | 330,950.70   | 22,445.95           | 308,504.75   | 121.90    |                      |
| Formación y compactación de terraplenes utilizando materiales compactables                   | 1,570,694.98 | 10,687.90           | 1,560,007.08 | -         |                      |
| Obras de Drenaje                                                                             |              |                     |              |           |                      |
| Excavación para estructuras u obras de drenaje, cualquiera que sea su clasificación, con una | 53,714.94    | 3,533.48            | 50,181.46    | -         |                      |
| Plantilla de material Granular, P.U.O.T                                                      | 5,780.69     | 274.20              | 5,506.49     | 2.50      |                      |
| Arrope y Relleno con material de calidad de subrasante, compactado al 95% de la              | 74,713.07    | 4,176.97            | 70,536.10    | 142.68    |                      |
| Alcantarilla de concreto reforzado de f'c = 280 kg/cm2, en dirección normal de 152 cm        | 7,394.04     | 611.95              | 6,782.09     | 9.60      |                      |
| Concreto hidráulico de f'c= 100 kg/cm2 en plantilla, por unidad de obra terminada.           | 1,399.10     | 310.17              | 1,088.93     | 1.50      |                      |
| Concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2, por unidad de obra terminada.                         | 3,314.74     | 2,359.43            | 955.31       | 137.26    |                      |
| Concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 en losa, por unidad de obra terminada.                 | 13,274.04    | 406.22              | 12,867.82    | -         |                      |
| Acero para concreto hidráulico con límite elástico igual o mayor de fy = 4200 kg/cm2         | 356,544.18   | 109,518.04          | 247,026.14   | 293.38    |                      |
| Malla electrosoldada 6x6 10-10, P.U.O.T                                                      | 2,330.47     | 670.62              | 1,659.85     | 17.40     |                      |
| Entronques                                                                                   |              |                     |              |           |                      |
| Terracerías                                                                                  |              |                     |              |           |                      |
| Despalme de espesor variable en corte y terraplén, el material producto del                  | 61,394.70    | 44,763.20           | 16,631.50    | 2,015.98  |                      |
| Excavaciones en cortes y adicionales debajo de la subrasante, cualquiera que sea su          | 848,439.10   | 121,551.02          | 726,888.08   | -         |                      |
| Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de                | 325,337.10   | 60,217.89           | 265,119.21   | 1,434.07  |                      |

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

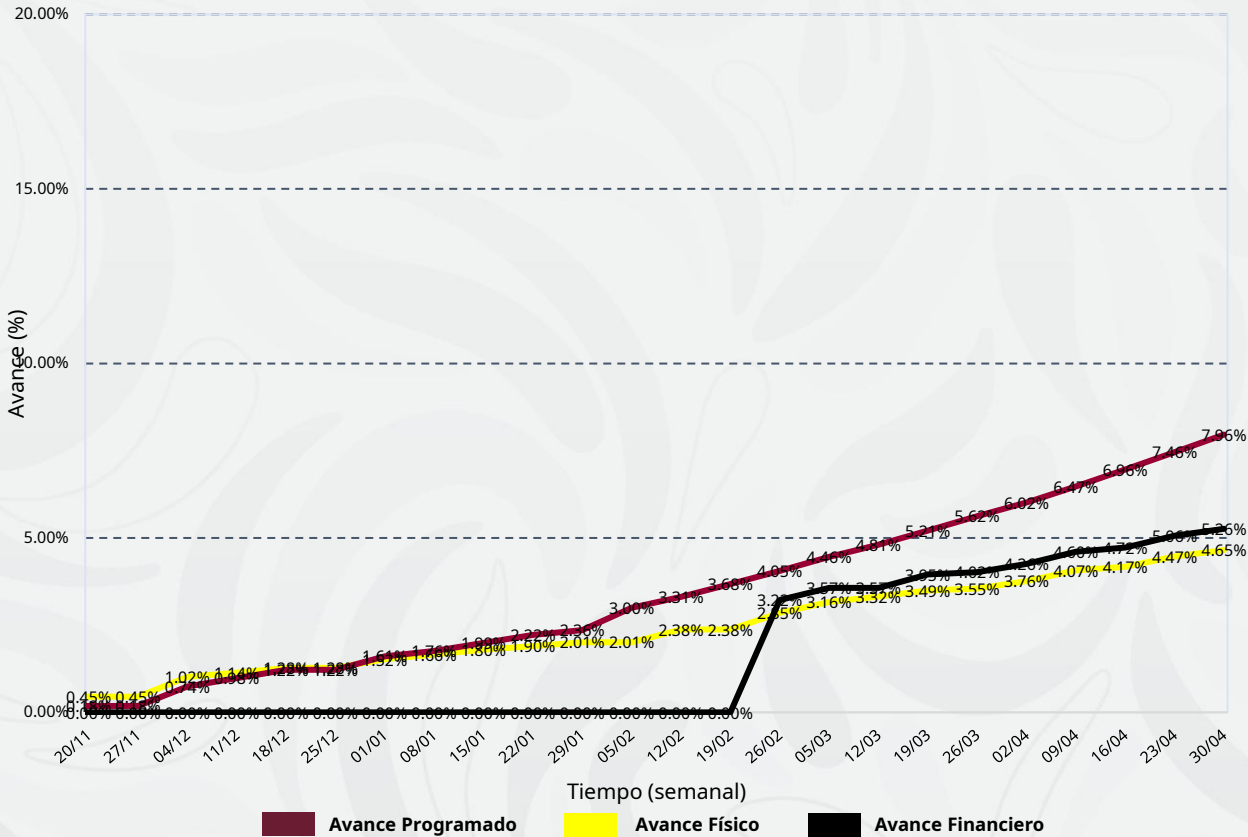

|                              | Del 17 de abril al 23 de abril de 2026 | Del 24 de abril al 30 de abril de 2026 |
|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Fuerza de Trabajo (personas) | 453                                    | 768                                    |
| Maquinaria                   | 176                                    | 194                                    |
| Frente de Trabajo            | Tramo 1/Tramo 3/Tramo 4                | Tramo 1/Tramo 3/Tramo 4                |
