


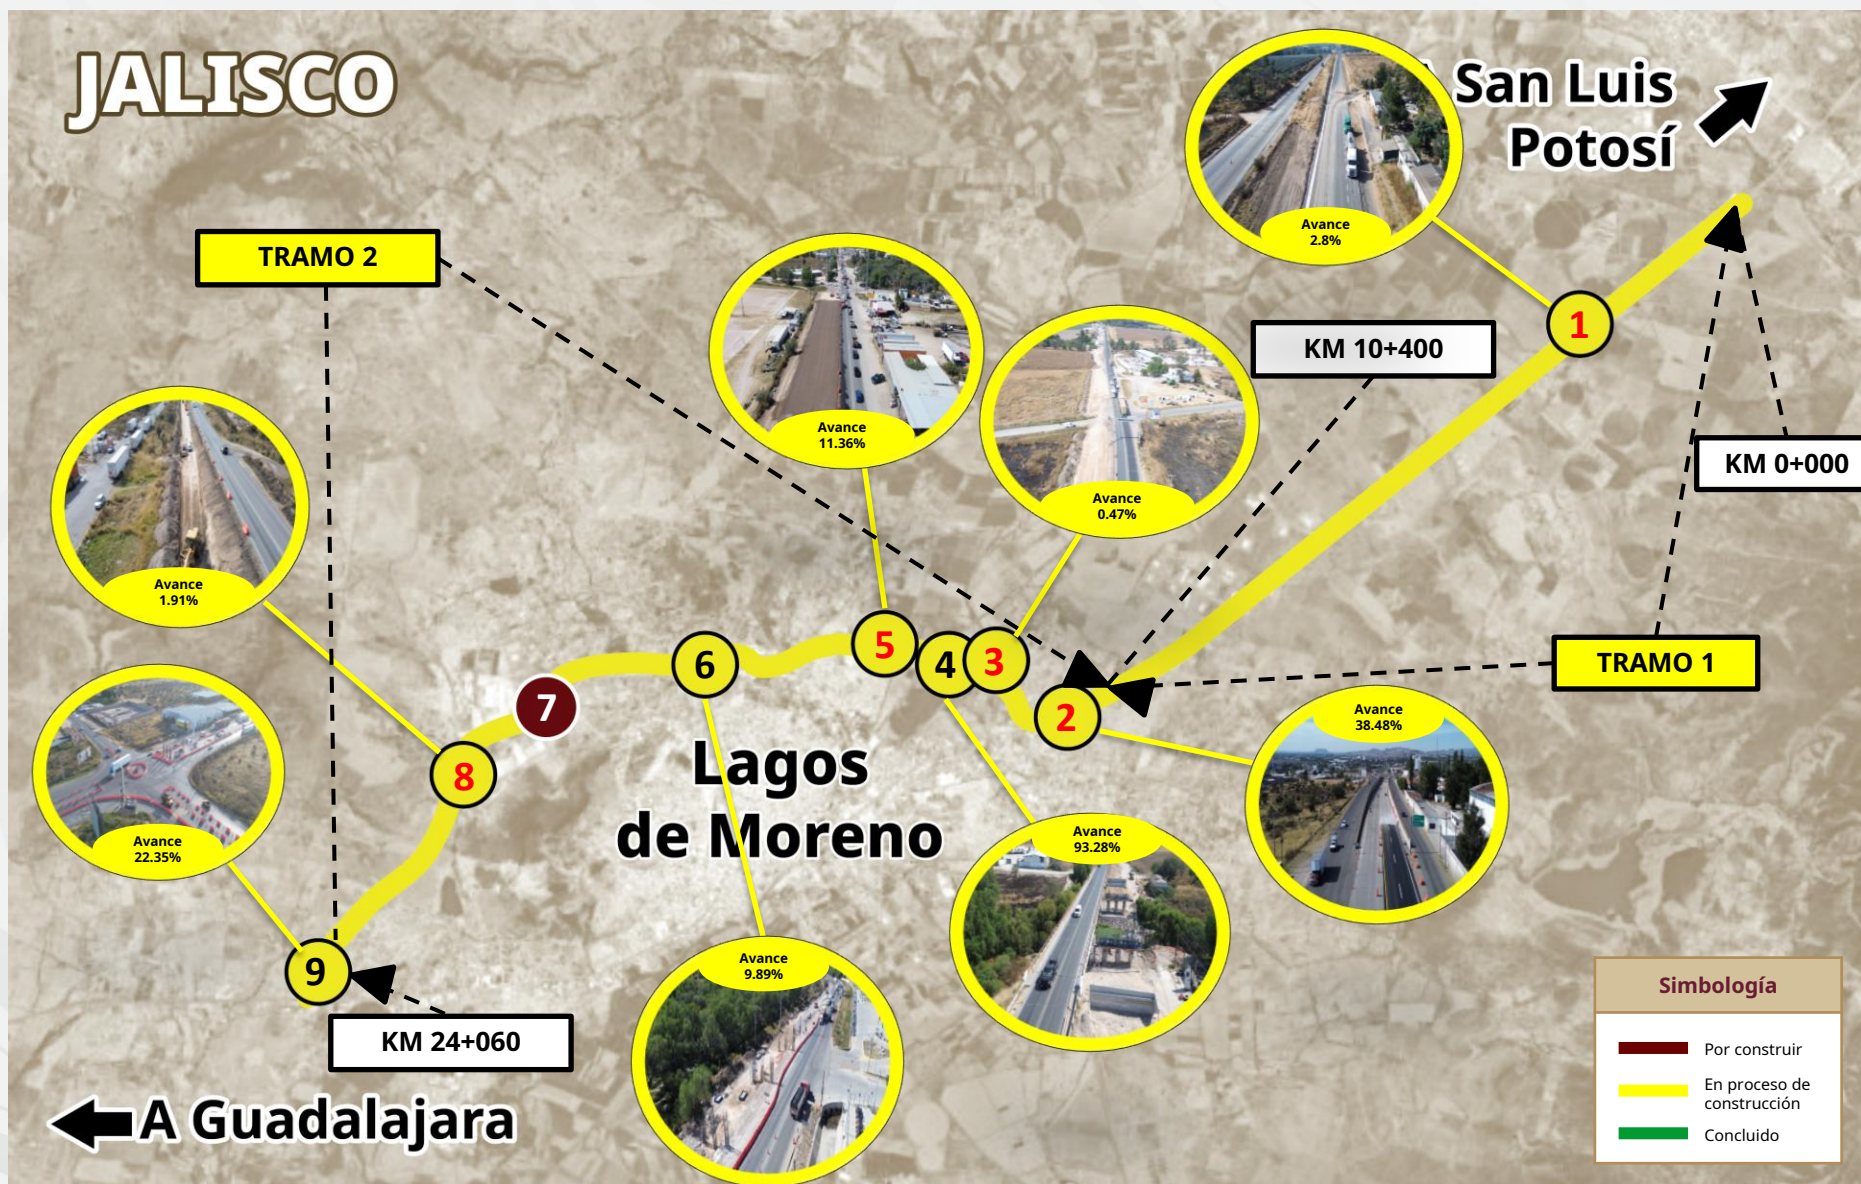

Descripción	
1	PIV con entronque "El Maguey" km 1+300 - Avance 2.8% . (Problemas de DDV. (Modificación de proyecto).
2	Entronque a desnivel Lagos de Moreno Este km 11+800 (adecuación)- Avance 38.48% (se movió la fuerza de trabajo).
3	Entronque a desnivel Lagos de Moreno Este km 11+800 (adecuación)- Avance 38.48% (se movió la fuerza de trabajo).
4	Puente km 12+450 "Rio Lagos"- Avance 93.28% .
5	PIV con entronque "Sepúlveda" km 13+620 Avance 11.36% . (se movió la fuerza de trabajo).
6	PSV con entronque "DRÄXLMAIER" km 15+900 Avance 9.89%
7	PIV con entronque "Encarnación" km 18+200
8	PSFC con retornos km 19+860 Avance 1.91% (se movió la fuerza de trabajo).
9	PIV con entronque Tipo Glorieta "Lagos de Moreno Oeste" km 23+920 Avance 22.35% .

Avance físico general

- Real: 52.75%
- Programado: 51.56%
- Semanal: 0.92%
- Financiero: 34.40%

Inversión: 2,720.20 mdp (C/IVA)

Inicio: 1 de marzo de 2025
Término: diciembre 2027

Meta: 24.06 km

2,345 empleos directos
4,690 empleos indirectos


250,000 habitantes beneficiados

20 minutos de ahorro en tiempo

Jalisco

Ampliación Libramiento Lagos de Moreno

TRAMO 2 - AVANCE TRONCAL Y ENTRONQUES							
Concepto	Unidad	Total	Ejecutado	Faltante	24/04/26 al 30/04/26		Observaciones
					Programado	Ejecutado	
Terracerías Troncal	%	100%	53.01%	46.99%	0.014	0.46%	En proceso
Obras Inducidas	%	100%	26.47%	73.53%	0.00	13.75%	En proceso
Entronque 23+920	%	100%	22.35%	77.65%	0.00	0.25%	En proceso
Entronque km 15+900	%	100%	9.89%	90.11%	0.00	0.18%	En proceso
Puente 12+450	%	100%	93.28%	6.72%	0.00	0.04%	En proceso

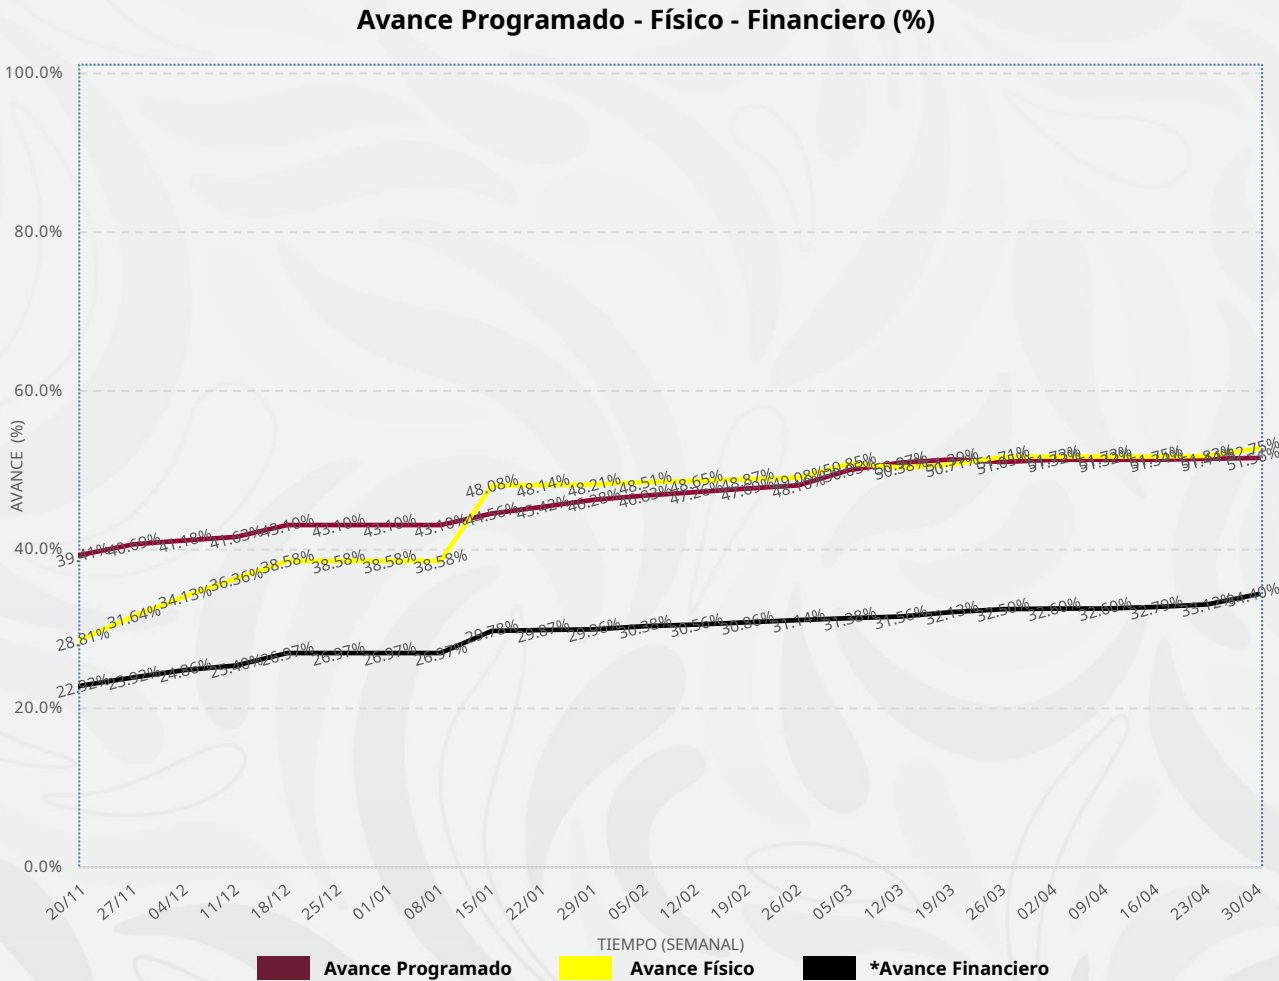

	17 de abril al 23 de abril 2026	24 de abril al 30 de abril 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	246	246
Maquinaria	69	69
