



Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha

Concesionaria: IDEAL
Constructora: MOTA-ENGIL, S.A. de C.V.

VERACRUZ

Villa Candelaria

Boca de Loma

Palma Sola

Villa Litera

Laguna Verde

Villa Rica de la Vera

Tinajitas

Km 186+016

Palmas de Abajo



Soyacuatla

PUENTE 7.3 KM 7+373 Trabajos de perforación y colado de pila 03 en apoyo 02.



Simbología

- Por construir
- En proceso de construcción
- Concluido

Descripción	
1	Entronque Laguna Verde II Km 0+000
2	PSMA 1.5 Km 1+555.5
3	PSMA 2.7 Km 2+703.91
4	PIV 3.05 Km 3+041
5	Entronque Laguna Verde I Km 3+041
6	PSMA 3.9 Km 3+900
7	PSMA 6.0 Km 6+080 (100.00%)
8	PIV 6.8 Km 6+806 (96.00%) (se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo para obra de drenaje en rampa de acceso.).
9	PIV 7.04 Km 7+040 (5.00%) (Se continua con la evaluación de la reubicación de la estructura).
10	PUENTE 7.3 Km 7+330 (7.50%)
11	PUENTE 7.8 Km 7+815, (61.70%) (Se realiza el desvío de línea de media tensión en claro no. 01)
12	PLAZA DE COBRO Km 8+300, (16.00%) (El proyecto ejecutivo está en revisión en la DGDC).
13	PUENTE 8.7 Km 8+665, (96.00%) (a nivel de losa colada).
14	PSMA 8.9 Km 8+960,
15	PUENTE 14 Km 14+000
16	PUENTE 14.7 Km 14+700
17	PSV Km 14+900
18	PSMA 15.3 Km 15+370
19	PSV 16.8 Km 16+800
20	ENTRONQUE LA MANCHA Km 19+841

Avance físico

- Programado: 78.25%
- Real: 30.17% Incluye Ent. Chapachapa
- Financiero: 15.64%
- Semanal: 0.81%



Inversión: 2,252.78 mdp



Inicio: Marzo de 2025
Término: Agosto de 2026



Meta: 19.84 km, 5 Puentes, 1 Plaza de Cobro, 3 Entronques, 2 PSVs, 3 PIVs, 6 PSMA, 59 ODTs y el Entronque Chapachapa



2,252.78 (1)=2,253 empleos directos generados/millón de inversión
2,252.78 (2)= 4,506 empleos indirectos generados/millón de inversión



128,000 habitantes beneficiados



45 minutos de ahorro en tiempo, Tramo 4



Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha

Concesionaria: IDEAL
Constructora: MOTA-ENGIL, S.A. de C.V.



Avance físico

- Real: 100.00%
- Programado: 100.00%
- Financiero: 75.01%
- Semanal: 0.00%

Descripción	
1	Entronque Chapachapa Km 739+733 (Km op. 92+512)
2	ODT 92+827.25
3	PSPyG 92+832.22
4	Ampliación de ODT 100+102,




Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	23/04/26 al 30/04/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Tramo 4 Laguna Verde - La Mancha						
Volumenes de obra						
Despalme	229,302.80	80,781.70	148,521.10	7,165.00	6,563.23	El volumen programado corresponde a los 19.8 km y solo se trabaja en 7.9 km.
Corte	1,414,039.20	188,580.59	1,225,458.61	27,193.00	9,783.25	El volumen programado corresponde a los 19.8 km y solo se trabaja en 7.9 km.
Terraplén	1,155,915.50	206,246.34	949,669.16	20,641.00	2,259.44	El volumen programado corresponde a los 19.8 km y solo se trabaja en 7.9 km.
Pedraplén	97,038.03	54,106.45	42,931.58	4,043.25	380.98	El volumen programado corresponde a los 19.8 km y solo se trabaja en 7.9 km.
Subyacente	162,462.20	65,397.46	97,064.74	27,077.03	772.67	El volumen programado corresponde a los 19.8 km y solo se trabaja en 7.9 km.
Subrasante	124,961.00	20,203.54	104,757.46	17,851.57	2,920.03	El volumen programado corresponde a los 19.8 km y solo se trabaja en 7.9 km.
Base Hidráulica	54,900.80	447.71	54,453.09	9,150.13	447.71	El volumen programado corresponde a los 19.8 km y solo se trabaja en 7.9 km.
Estructuras Tramo 4 Laguna Verde - La Mancha						
Cargaderos	2	0	2	0	0	Puente 7.3 Km 7+373
Apoyos	2	0	2	0	0	Puente 7.3 Km 7+373 Trabajos de perforación y colado de pila 03 en apoyo 02.
Pilas	12	11	1	1	11	Puente 7.3 Km 7+373 Trabajos de perforación y colado de pila 03 en apoyo 02.

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

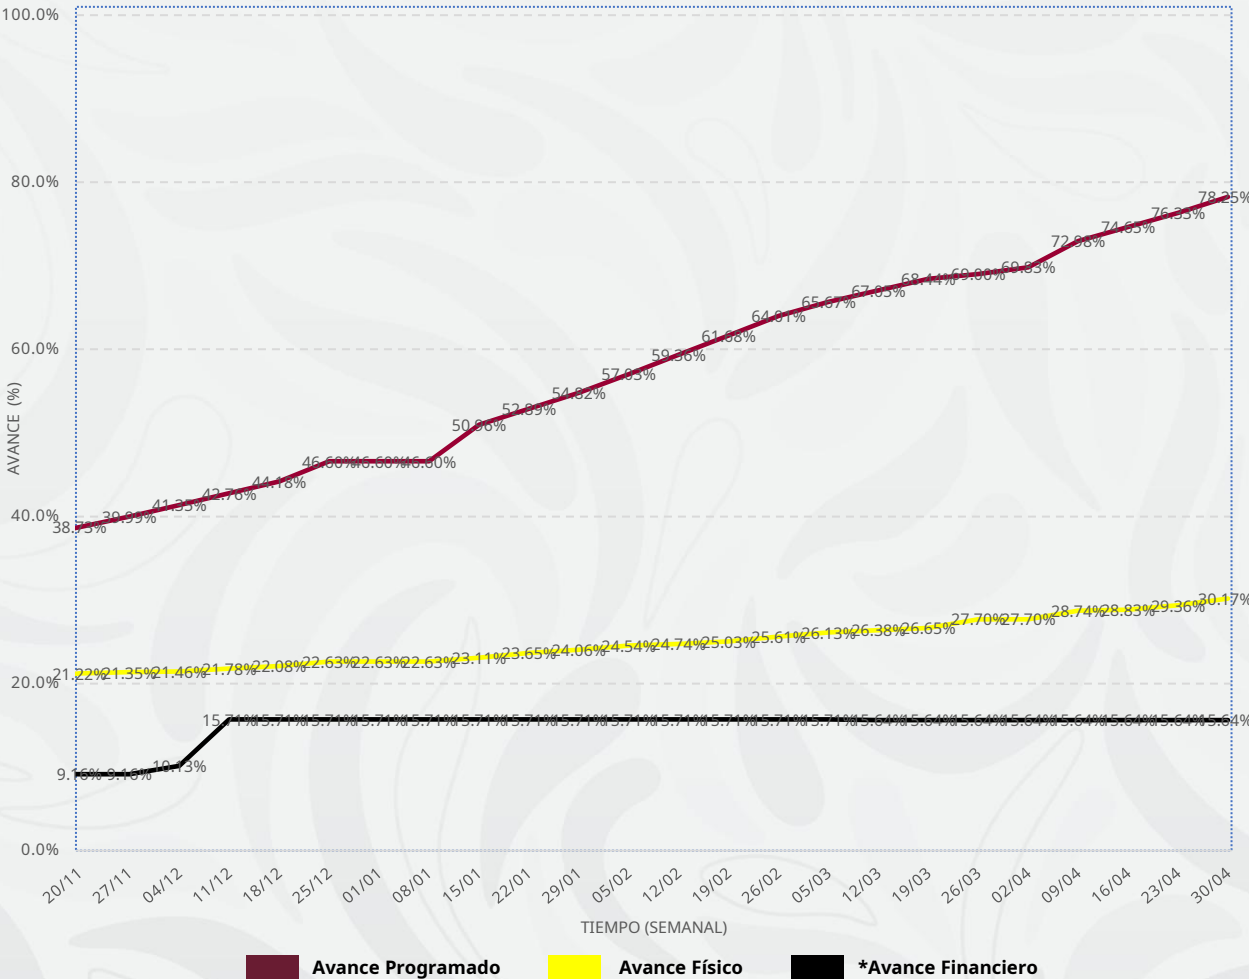

	10 de abril al 16 de abril de 2026	17 de abril al 23 de abril de 2026	24 de abril al 30 de abril de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	118	158	174
Maquinaria	28	27	28
