




## Michoacán

### Lázaro Cárdenas-Nueva Italia

#### Avance físico

- Programado: 0.00%
- Real: 0.080%
- Semanal: 0.005 %
- Financiero: 0.00%

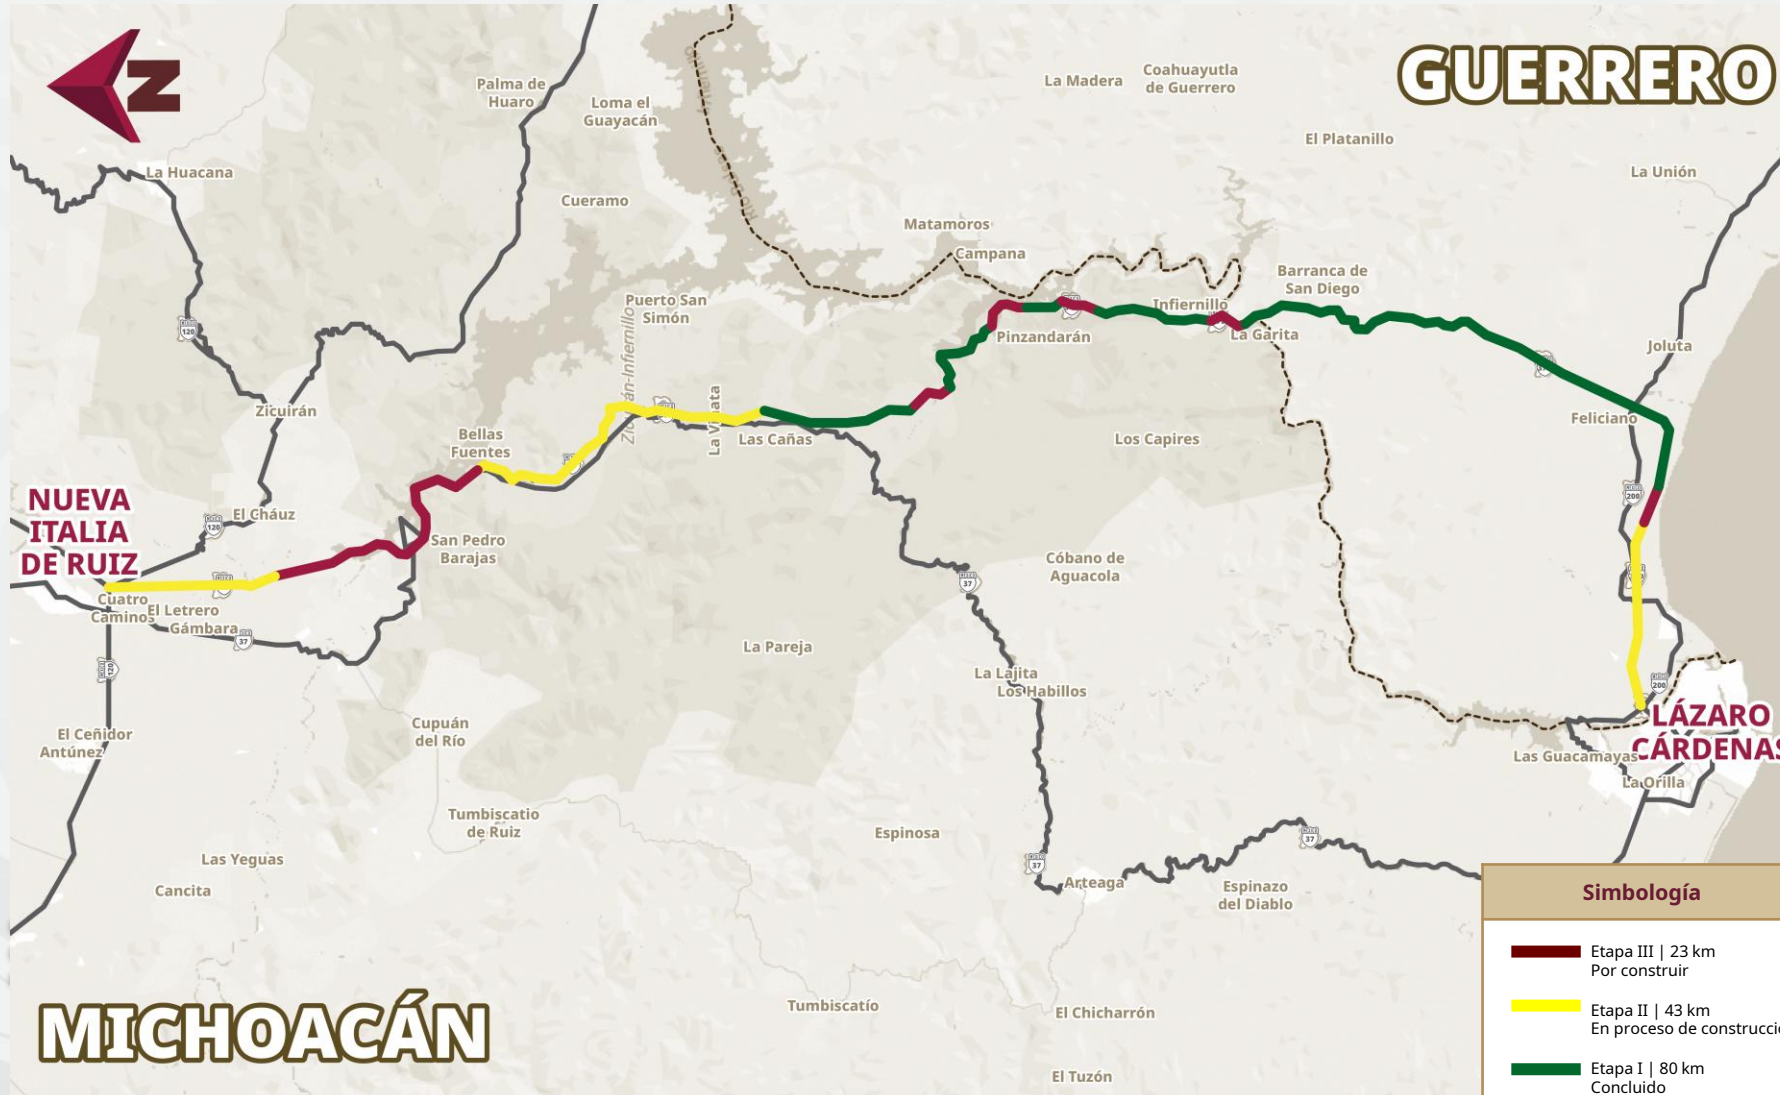

**Inversión: 16,000 mdp**



**Inicio:** Marzo 2026

**Término:** 2029



**Meta: 146 km**

45 PIV's | 3 PSV's | 28

Puentes de concreto | 5 PSFCC  
| 1 Túnel

1 Ampliación de plaza de cobro  
3 Puentes de acero (estructuras  
complejas)



**4,123 empleos generados**



**1,800,000 habitantes  
beneficiados**




# Michoacán

## Lázaro Cárdenas-Nueva Italia

| Elemento              | Meta   | Ejecutado acumulable | Faltante   | 23/04/2026 al 30/04/2026 |           |
|-----------------------|--------|----------------------|------------|--------------------------|-----------|
|                       |        |                      |            | Programado               | Ejecutado |
| Desmonte              | 146 km | 9.40 km              | 136.60 km  | .100 km                  | .100 km   |
| Movimiento de tierras | 146 km | 0.800 km             | 145.200 km | .200 km                  | .200 km   |

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

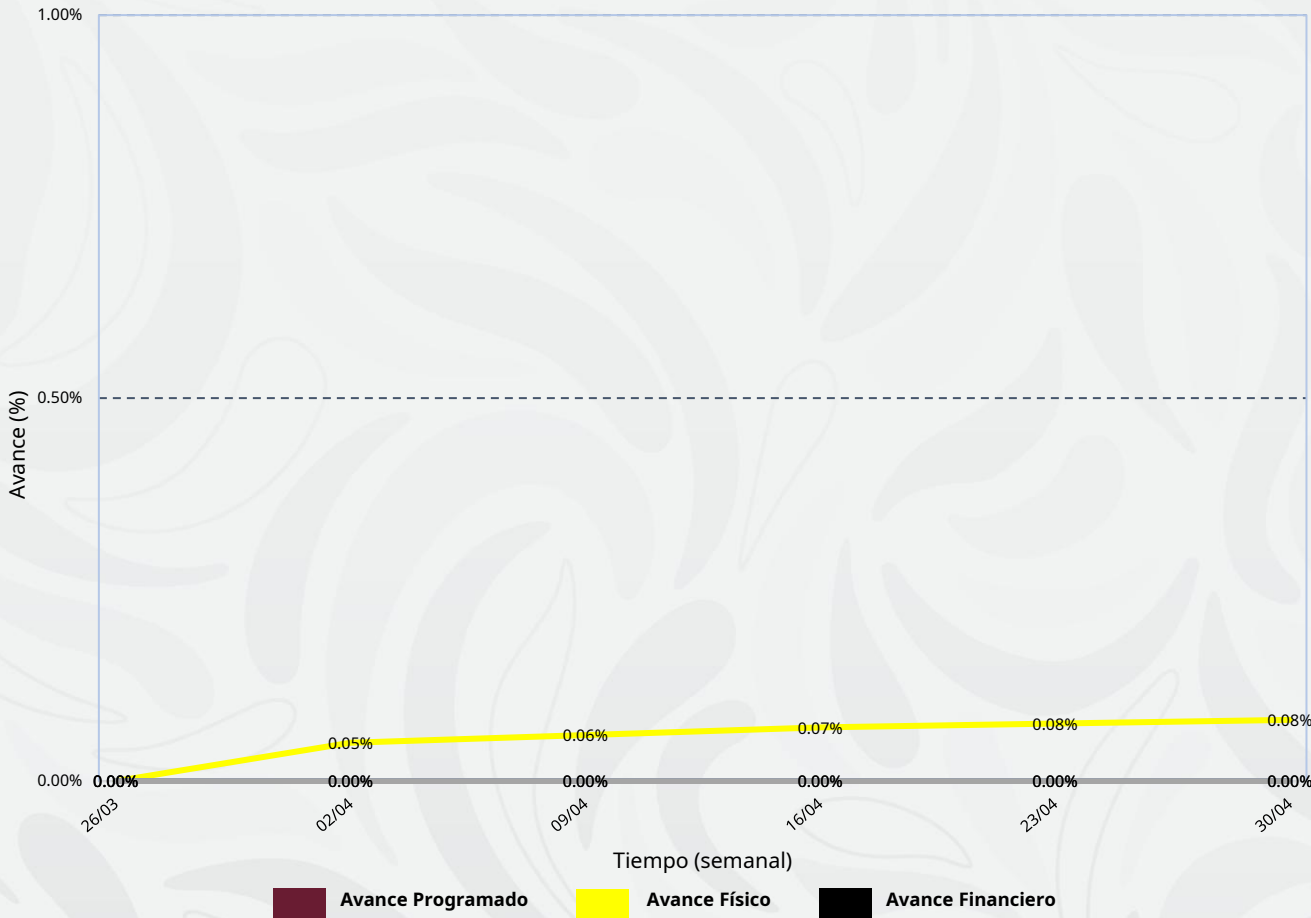

|                              | Del 16 de abril al 23 de abril de 2026. | Del 23 de abril al 30 de abril de 2026. |
|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Fuerza de Trabajo (personas) | 50                                      | 50                                      |
| Maquinaria                   | 20                                      | 20                                      |
| Frente de Trabajo            | Actividades de deshierbe y desmonte     | Actividades de deshierbe y desmonte     |
