

Estado de México

Atizapán-Atlacomulco



Descripción	
1	Entronque Chiluca 15.00% , (sin actividad, falta de recursos)
2	Viaducto Sin Nombre km 20+880.00 53.94% (solo habilitado de acero, sin actividades de armado ni colado en cabezal)
3	Viaducto La Estadía km 22+332.00 54.69%
4	Viaducto Los Gallos km 27+425.00 48.08%
5	Túnel Los Gallos km 27+770.00 95.00% , (sin actividad, faltan todos los elementos electromecánicos y pavimento)
6	Viaducto Sin Nombre km 31+033.00 49.91%
7	Viaducto Tlazala km 31+359.00 45.54%
8	Túnel Cahuacán I km 36+258.00 95.00% , (sin actividad, faltan todos los elementos electromecánicos y pavimento)
9	Viaducto Cahuacán III km 38+995.00 27.21% ,
10	Viaducto Sin Nombre km 42+053.00 5.44% (sin fuerza de trabajo)
11	Entronque Villa del Carbón km 47+974.00 00.00% (no se han iniciado trabajos)
12	Viaducto El Llano km 51+016.00 90.90% (sin actividad, problemas sociales)
13	Viaducto Sin Nombre km 54+770.00 03.80% , sin actividad, problemas sociales
14	Viaducto Los Chaparrales km 73+387.00 00.00% (no se han iniciado trabajos)
15	Viaducto El Pescado km 75+482.00 00.00% (no se han iniciado trabajos)
16	Entronque Ixtlahuaca km 76+188.00 35.00% , (sin actividades, problemas sociales)
17	Entronque La Luna km 83+960.00 00.00% (no se han iniciado trabajos)
18	Viaducto El Salto km 91+874.00 16.80% , (sin actividad, problemas sociales)
19	Entronque Atlacomulco

-  **Inversión:** 9,865.8 mdp a precios de 2014 incluye I.V.A., incluye monto de obra (7,662mdp) y Fondo de Obra Adicional (843 mdp)
-  **Meta:** 74 km, 2 Plazas de cobro, 12 Viaductos, 2 Túneles, 4 Entronques, 80 PSVyG


-  **Inicio:** 01 marzo 2016
 **Término:** 30 junio 2027
-  **Avance físico:**
 - Programado: 97.84%
 - Real: 53.96%
 - Financiero: 25.02%
 - Semanal: 00.04%

-  **132,909** empleos generados
(44,303 directos y 88,606 indirectos)
-  **1 millón 244 mil** habitantes beneficiados
-  **60 minutos** de ahorro en tiempo

Estado de México

Atizapán-Atlacomulco

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	30/04/2026 al 07/05/2026		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Pilotes	344	206	139	2	1	• La mano de obra se incrementó un poco para alcanzar las expectativas correspondientes.
Zapatas	86	50.5	36	1	0.5	
Columnas	96	30	67	1	1	
Cabezales	76	14.5	62	1	0.5	
Caballetes	24	9.5	15	1	0.5	
Trabes de concreto	395	8	387	0	0	
Trabes metálicas	29	1.5	27.5	1	0.0	

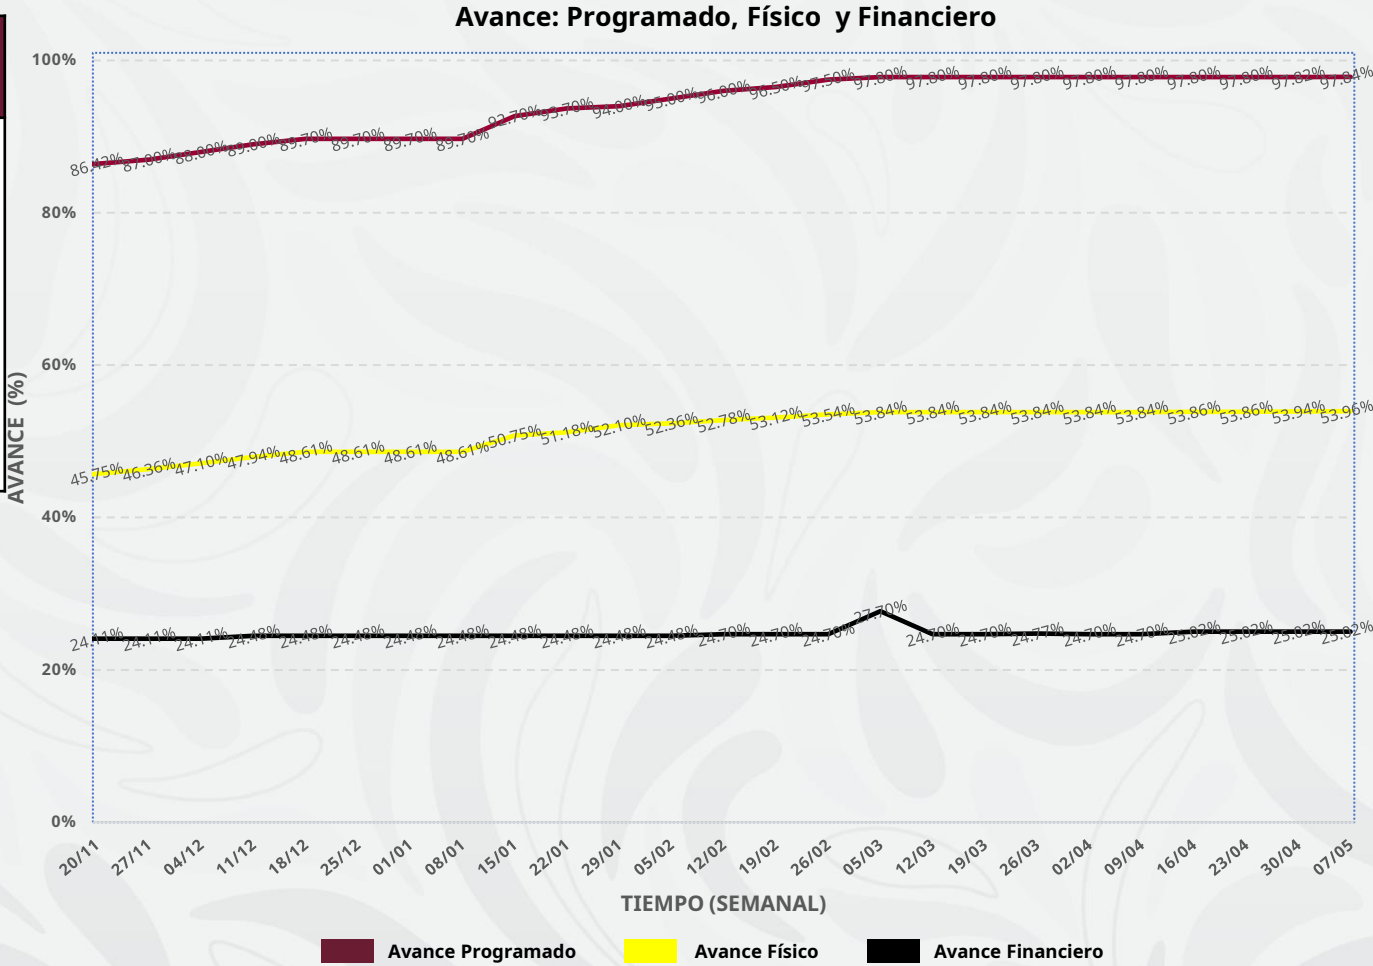

	Del 24 al 30 de abril de 2026	Del 01 al 07 de mayo de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	2,051	2,152
Maquinaria	516	472
Frentes de trabajo	Tramos 01, 2A y 2B	Tramos 01, 2A y 2B
