


Jalisco

Ampliación Libramiento Lagos de Moreno

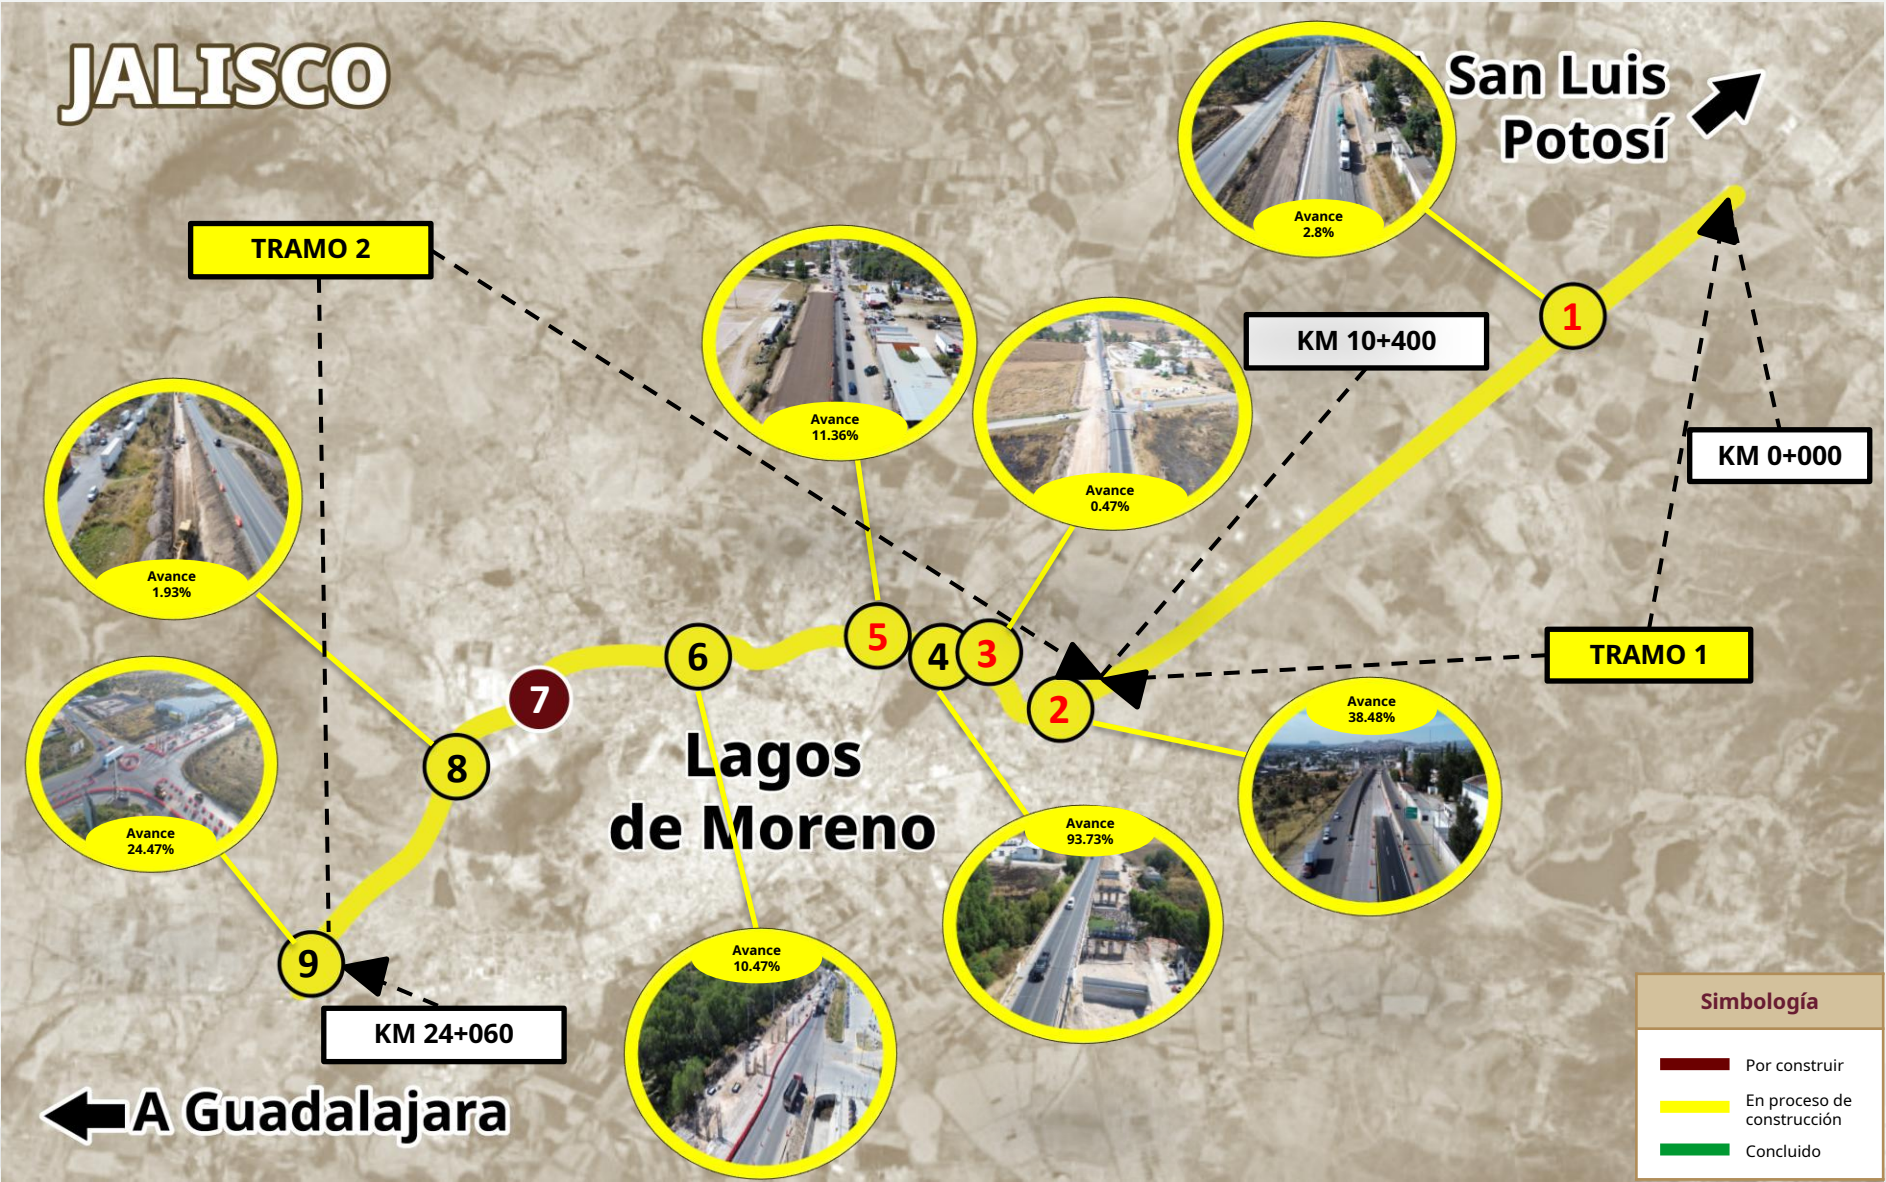


Descripción	
1	PIV con entronque "El Maguey" km 1+300 - Avance 2.8% . Problemas de DDV. (Modificación de proyecto).
2	Entronque a desnivel Lagos de Moreno Este km 11+800 (adecuación)- Avance 38.48% (se movió la fuerza de trabajo).
3	PIV con entronque "Fracc. Andalucía" km 12+120 Avance 0.47% .
4	Puente km 12+450 "Rio Lagos"- Avance 93.73% .
5	PIV con entronque "Sepúlveda" km 13+620 Avance 11.36% . (se movió la fuerza de trabajo).
6	PSV con entronque "DRÄXLMAIER" km 15+900 Avance 10.47%
7	PIV con entronque "Encarnación" km 18+200
8	PSFC con retornos km 19+860 Avance 1.93%
9	PIV con entronque Tipo Glorieta "Lagos de Moreno Oeste" km 23+920 Avance 24.27% .

Jalisco

Ampliación Libramiento Lagos de Moreno

TRAMO 2 - AVANCE TRONCAL Y ENTRONQUES							
Concepto	Unidad	Total	Ejecutado	Faltante	01/05/26 al 07/05/26		Observaciones
					Programado	Ejecutado	
Terracerías Troncal	%	100%	57.71%	42.29%	0.021%	4.70%	En proceso
Obras Inducidas	%	100%	35.42%	64.58%	0.050%	8.95%	En proceso
Entronque 23+920	%	100%	24.27%	75.73%	0.13%	1.92%	En proceso
Entronque km 15+900	%	100%	10.47%	89.53%	0.00%	0.58%	En proceso
Puente 12+450	%	100%	93.73%	6.27%	0.00%	0.45%	En proceso

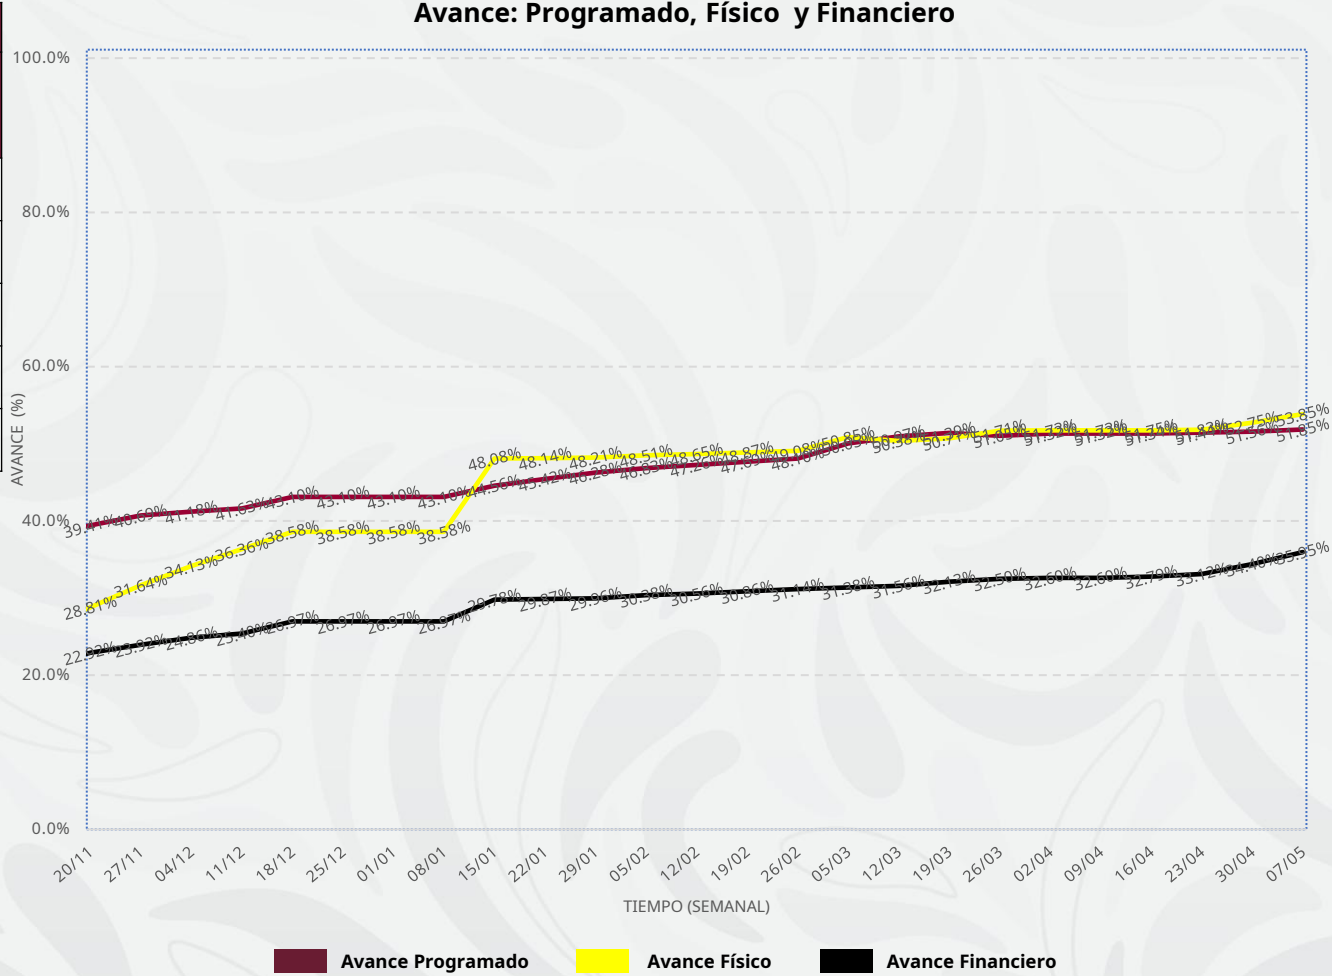

	24 al 30 de abril 2026	01 al 07 de mayo 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	246	246
Maquinaria	69	69
