

Michoacán

Uruapan-Nueva Italia


Avance físico

• Programado: 22.20 %

• Semanal: 0.47 %

• Real: 22.11 %

• Financiero: 19.10%

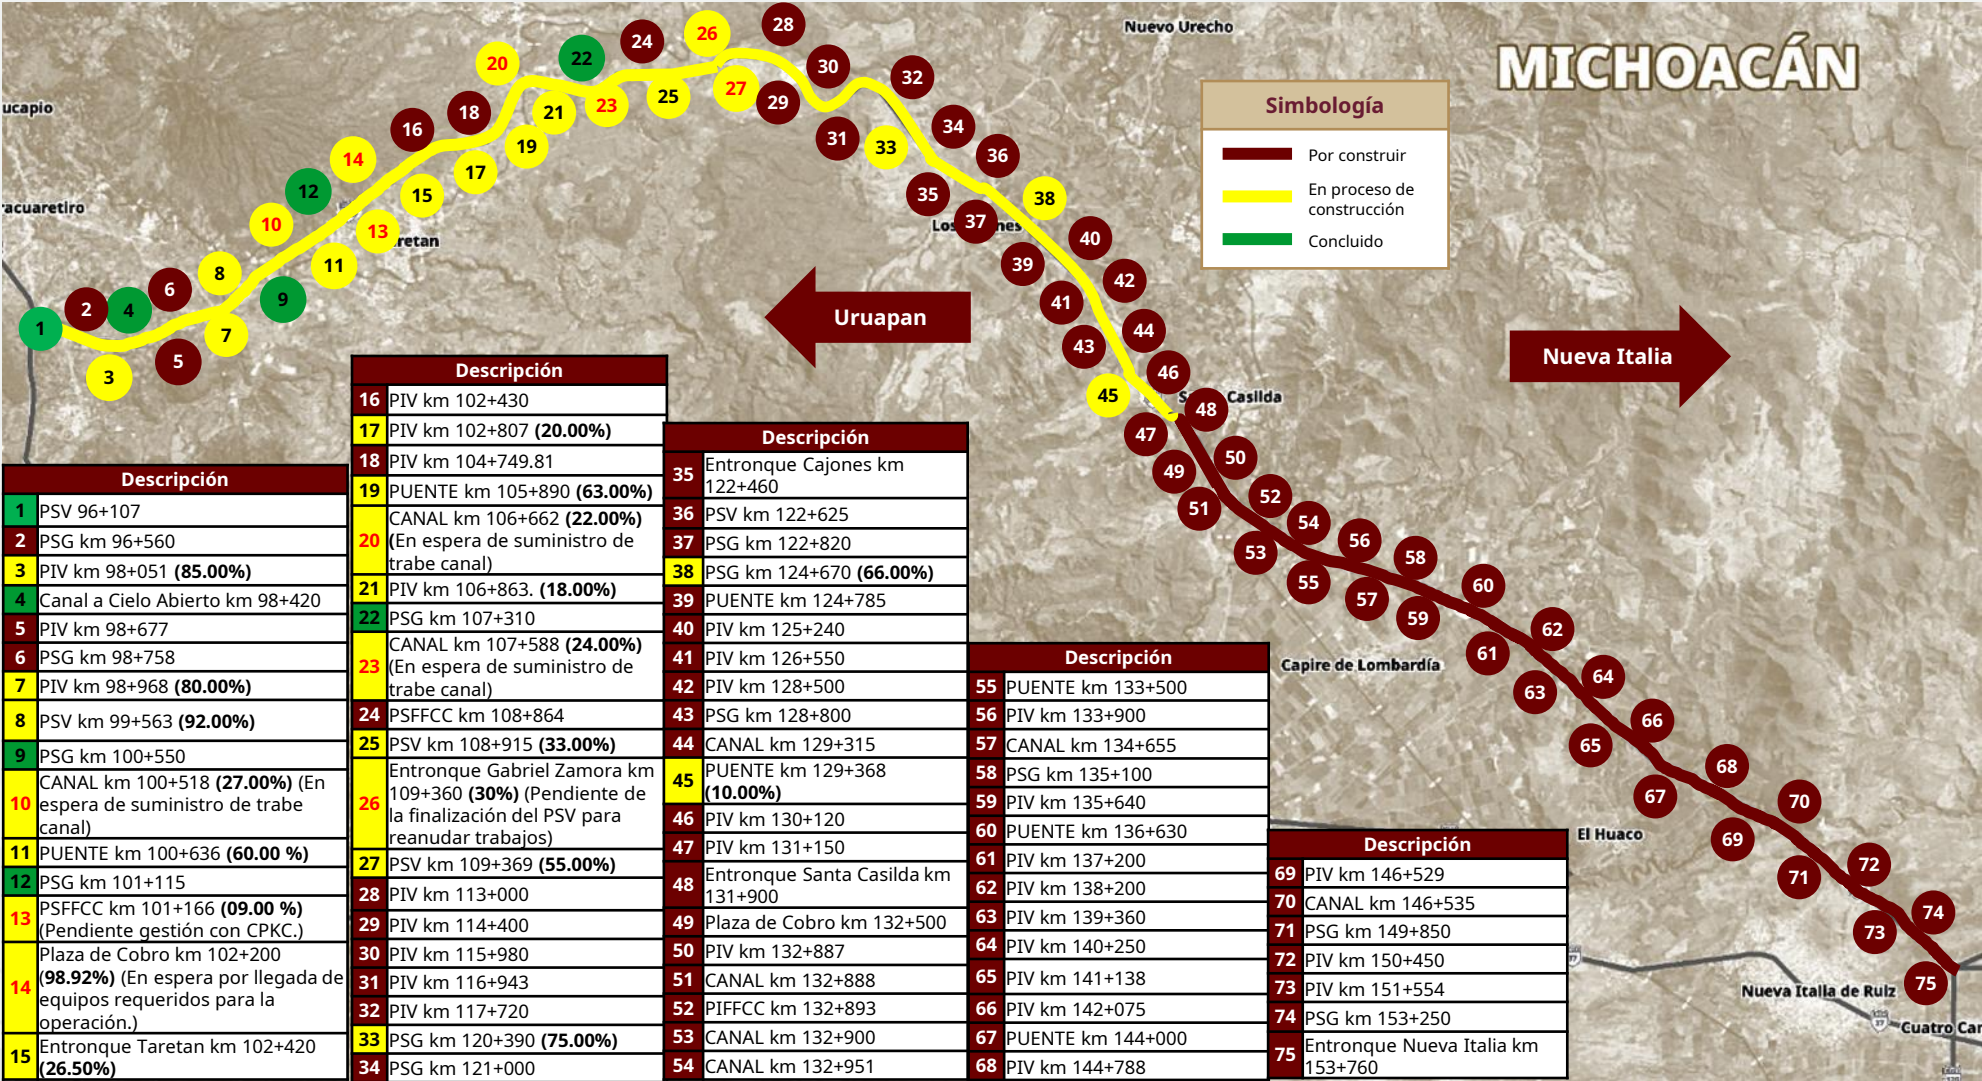

- **Inversión: 7,049.9 mdp**
- **Inicio:** noviembre de 2023
Término: agosto de 2027
- **Meta: 67.09 km**
65.00 km (troncal)
2.09 km (estructuras)
2 Plazas de Cobro, 7 puentes, 5 Entronques, 60 cruces (5 PSV's, 30 PIV's, 13 PSG's, 1 PIFFCC, 2 PSFFCC, 9 trabes canales), 1 canal a cielo abierto (cien fuegos) y múltiples obras de drenaje.
- **21,147** empleos generados
7,049 empleos directos
14,098 empleos indirectos
- **1,800,000** habitantes beneficiados
- **25 minutos** de ahorro en tiempo
- Concesionaria :** PINFRA.

Michoacán

Uruapan-Nueva Italia

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	30/04/2026 al 07/05/2026		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Base Asfáltica	65 km	11.90 km	53.10 km	.200 km	.200 km	
Base Hidráulica	65 km	13.30 km	51.70 km	.300 km	.300 km	
Subbase	65 km	15.20 km	49.80 km	.300 km	.300 km	
Subyacente	65 km	18.20 km	46.80 km	.400 km	.400 km	
PIV Km 98+051 Parapetos	2	1	1	1	1	Construcción de parapetos de concreto
PSV Km 98+968 Parapetos	2	0	2	2	2	Construcción de parapetos de concreto
PIV Km 102+807 Subestructura	1	0	1	1	1	Colado de cabezal #2
PIV Km 104+749 Subestructura	1	0	1	1	1	Colado de zapata pila #2
Puente Km 105+890 Superestructura	7	0	7	7	7	Maniobra de montaje de trabe cajón sobre claro #2
PSV Km 109+369	9	0	9	9	9	Maniobra de montaje de trabe cajón
PUENTE Km 129+368 Cimentación	1	0	1	1	1	Colado de concreto hidráulico en pila

