


Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

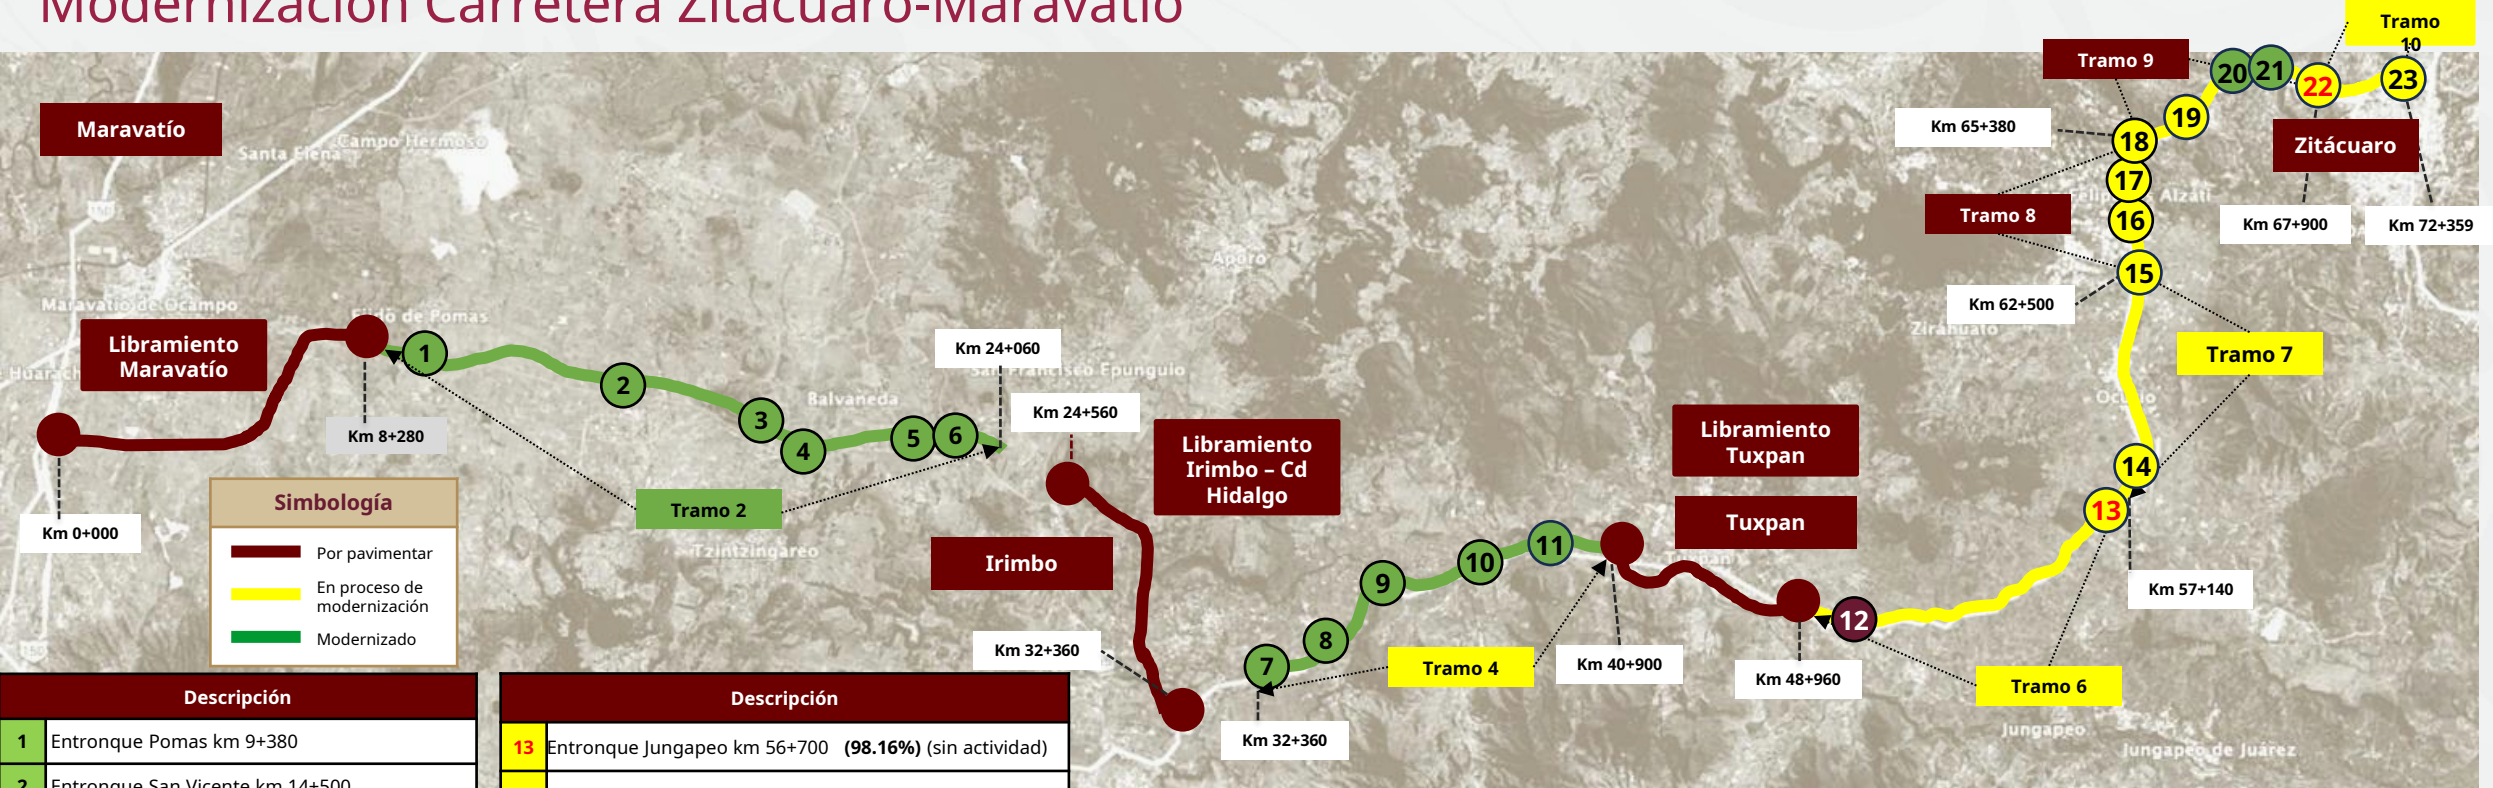

Descripción	
1	Entronque Pomas km 9+380
2	Entronque San Vicente km 14+500
3	PIP km 18+370
4	Entronque Zinzingareo km 18+700
5	Entronque Senguio km 21+280
6	PIP km 22+280
7	Entronque Santa Rosa km 32+420
8	Entronque Ziranda-Jaripeo km 33+500
9	Puente Turundeo Km 36+460
10	Entronque Turundeo I km 37+550
11	Entronque Turundeo II km 38+780
12	Puente Obispo Km 50+400 (0.00%), Sin Iniciar

Descripción	
13	Entronque Jungapeo km 56+700 (98.16%) (sin actividad)
14	Entronque Piedras de Lumbre km 57+700 (74.07%)
15	Entronque Zirahuato km 62+500 (67.06%)
16	Entronque San Felipe I km 64+400 (47.89%)
17	Entronque San Felipe II Km 64+640 (47.89%)
18	Entronque Macutzio km 65+620 (43.61%)
19	Entronque Valle Verde km 67+220 (95.28%)
20	Entronque Curungueo I Km 68+240
21	Entronque Curungueo II Km 68+780
22	Puente San Juan Viejo Km 69+860 (98.75%), (sin actividad)
23	PSV Zitácuaro Km 72+160 (97.26%)

Avance físico

- Programado: 63.95% (Reprogramación T8)
- Real: 65.73%
- Semanal: 0.40%
- Financiero: 17.56%

Nota 1:

Los avances se calculan en relación a la Inversión total del Ramal

Nota 2:

Las Estructuras en proceso remarcadas en color rojo, no presentan avance en el periodo semanal, o no han iniciado.

**Inversión:** \$4,575.3 mdp (total Ramal)
\$3,048.81 mdp (modernización)
\$1,526.49 mdp (Libramientos)

**Meta:** 71.3 Km

**Inicio:** septiembre 2020
Reinicio: 27 de enero de 2024
Término: 31 de diciembre de 2026

 4,800 empleos generados

 126,000 habitantes beneficiados

 Ahorro en tiempo: 25 min

Concesionaria: Red de carreteras de occidente


Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

TERRACERIAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 01 may al 07 may 26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Cortes (m3)	705,558.00	783,499.38	-77,941.38	0.00	2,531.60	
Terraplén (m3)	445,687.00	464,726.71	-19,039.71	0.00	6,091.63	
Subyacente (m3)	256,097.00	277,665.49	-21,568.49	0.00	2,666.61	
Subrasante (m3)	170,688.00	179,635.88	-8,947.88	392.92	1,501.11	

PAVIMENTOS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 01 may al 07 may 26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Base Hidráulica (m3)	125,659.04	129,190.15	-3,531.11	1,083.60	1,200.95	
Bacheo (m3)	1,800.00	1,842.25	-42.25	10.77	0.00	SIN ACTIVIDAD DURANTE ESTE PERIODO
Fresado (m3)	10,676.00	10,903.08	-227.08	47.08	19.72	SE TRABAJA EN TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 6, 7 Y 9
Rayado Carpeta (Ha)	30.24	30.01	0.23	0.32	0.00	SIN ACTIVIDAD DURANTE ESTE PERIODO
Base Asfáltica (m3)	120,414.05	124,861.74	-4,447.69	1,150.72	665.92	SE TRABAJA EN TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 6, 7 Y 9
Carpeta Asfáltica (m3)	45,247.80	35,666.17	9,581.63	59.91	439.20	SE TRABAJA EN TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 6, 7 Y 9

ESTRUCTURAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 01 may al 07 may 26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
PSV SAN FELIPE	1.00	0.5304	0.4696	0.0357	0.0023	CONFORMACIÓN DE TERRACERÍAS
PSV SAN JUAN VIEJO	1.00	0.9875	0.0125	0.0193	0.0000	SIN ACTIVIDAD
PSV ZITÁCUARO	1.00	0.9726	0.0274	0.0420	0.0030	BALIZAMIENTO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
DEFENSA METÁLICA	35,327.00 ml	32,426.07 ml	2,900.93 ml	0.00 ml	275.21 ml	SE INSTALA EN TRAMOS AISLADOS DISPONIBLES
BALIZAMIENTO	157,137.60 ml	91,331.56 ml	65,806.04 ml	0.00 ml	1,946.35 ml	CONTINÚA LA COLOCACION EN TRAMO 6.
CUNETA	12,028.95 ml	10,893.13 ml	1,135.82 ml	0.00 ml	48.00 ml	CONTINÚA LA CONSTRUCCIÓN EN TRAMO 6
BOTONES	12,041.00 pza	9,538.00 pza	2,503.00 pza	0.00 pza	57.00 pza	INICIA LA COLOCACION EN TRAMO 6.
VERTICAL BAJO	1,011.00 pza	725.00 pza	286.00 pza	0.00 pza	6.00 pza	INICIA LA COLOCACION EN TRAMO 6.

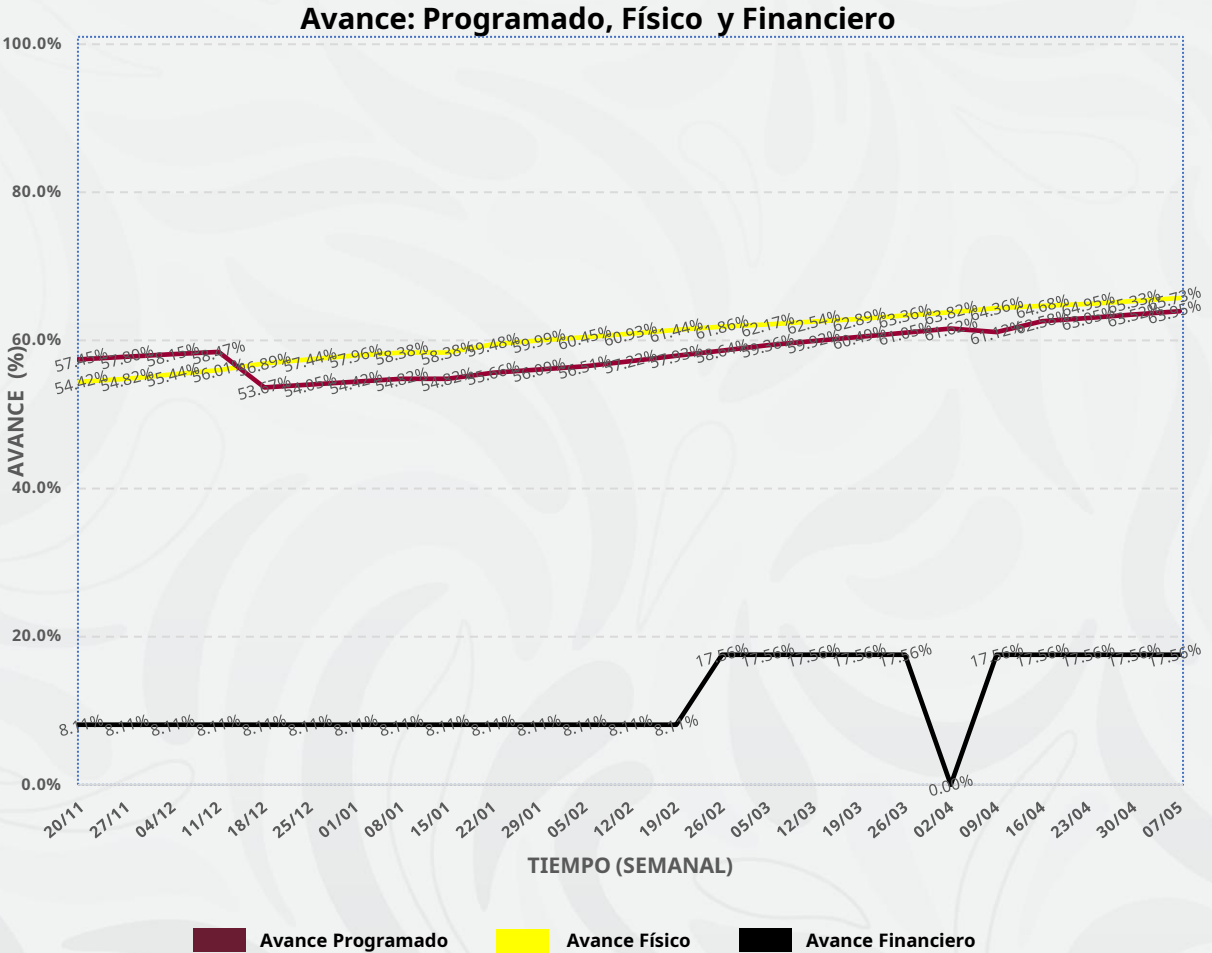

	Del 24 al 30 de abr 26	Del 01 al 07 de mayo 26
Fuerza de Trabajo (personas)	287	288
Maquinaria	192	191
tramos activos	IV, VI, VII, VIII, IX, X	IV, VI, VII, VIII, IX, X
Frentes de trabajo (totales)	24	24
