

Estado de México

Atizapán-Atlacomulco



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



Descripción	
1	Entronque Chiluca 15.00% , (sin actividad, falta de recursos)
2	Viaducto Sin Nombre km 20+880.00 53.94% (solo habilitado de acero, sin actividades de armado ni colado en cabezal)
3	Viaducto La Estadía km 22+332.00 54.71%
4	Viaducto Los Gallos km 27+425.00 48.10%
5	Túnel Los Gallos km 27+770.00 95.00% , (sin actividad, faltan todos los elementos electromecánicos y pavimento)
6	Viaducto Sin Nombre km 31+033.00 49.92%
7	Viaducto Tlazala km 31+359.00 45.57%
8	Túnel Cahuacán I km 36+258.00 95.00% , (sin actividad, faltan todos los elementos electromecánicos y pavimento)
9	Viaducto Cahuacán III km 38+995.00 27.23%
10	Viaducto Sin Nombre km 42+053.00 5.44% (sin fuerza de trabajo)
11	Entronque Villa del Carbón km 47+974.00 00.00% (no se han iniciado trabajos)
12	Viaducto El Llano km 51+016.00 00.90% (sin actividad, problemas sociales)
13	Viaducto Sin Nombre km 54+770.00 03.80% , sin actividad, problemas sociales
14	Viaducto Los Chaparrales km 73+387.00 00.00% (no se han iniciado trabajos)
15	Viaducto El Pescado km 75+482.00 00.00% (no se han iniciado trabajos)
16	Entronque Ixtlahuaca km 76+188.00 35.00% , (sin actividades, problemas sociales)
17	Entronque La Luna km 83+960.00 00.00% (no se han iniciado trabajos)
18	Viaducto El Salto km 91+874.00 16.80% , (sin actividad, problemas sociales)
19	Entronque Atlacomulco



Inversión: 9,865.8 mdp a precios de 2014 incluye I.V.A., incluye monto de obra (7,662mdp) y Fondo de Obra Adicional (843 mdp)



Meta: 74 km, 2 Plazas de cobro, 12 Viaductos, 2 Túneles, 4 Entronques, 80 PSVyG



Inicio: 01 marzo 2016
Término: 30 junio 2027



Avance físico:

- Programado: 100.00%
- Real: **40.49%**
- Financiero: 17.45%
- Semanal: 00.04%
- Real respecto al ejecutable por DDV: **54.02%**
- Financiero respecto al ejecutable por DDV: 28.81%



132,909 empleos generados (44,303 directos y 88,606 indirectos)



1 millón 244 mil habitantes beneficiados



60 minutos de ahorro en tiempo


Nota: Se tiene una actualización de proyecto, presupuesto y reprogramación con nueva fecha de término. Sin embargo, la reprogramación no se encuentra regularizada con la SICT.

Estado de México

Atizapán-Atlacomulco

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	14/05/2026 al 21/05/2026		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Pilotes	344	207	139	2	2	• La mano de obra se incrementó un poco para alcanzar las expectativas correspondientes.
Zapatas	86	51	35	0	0	
Columnas	96	30	66	1	0.5	
Cabezales	76	14.5	61.5	1	0	
Caballetes	24	9.5	14.5	0	0	
Trabes de concreto	395	8	387	0	0	
Trabes metálicas	29	1.5	27.5	1	0.0	

Avance: Programado, Físico y Financiero

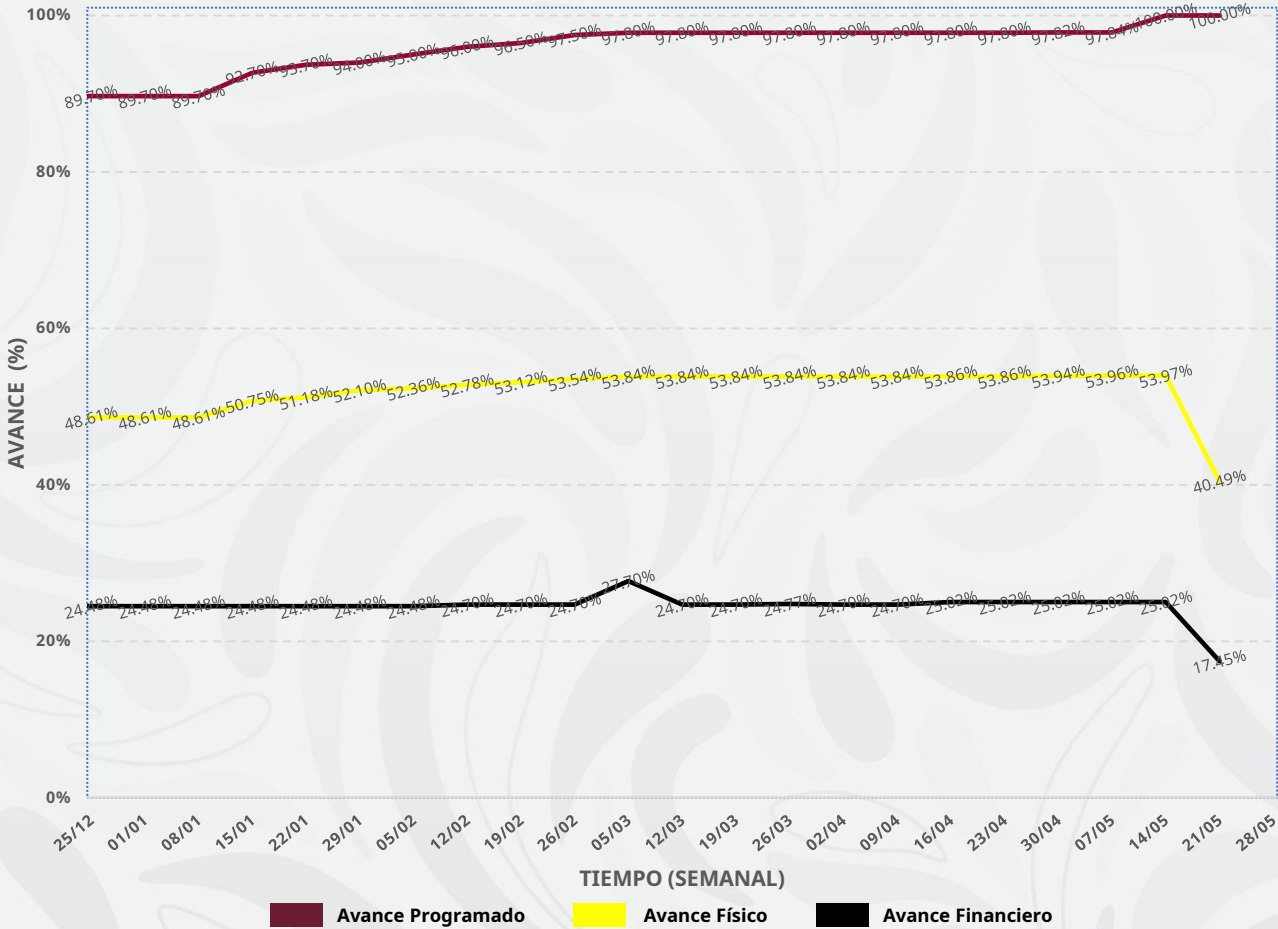

	Del 08 al 14 de mayo	Del 15 al 21 de mayo
Fuerza de Trabajo (personas)	2,360	2,567
Maquinaria	407	415
Frentes de trabajo	Tramos 01, 2A y 2B	Tramos 01, 2A y 2B
