

San Luis Potosí

La Pitahaya-Libramiento Oriente de S.L.P. y el Ramal Villa de Reyes



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance físico

- Programado: **10.29%**
- Real: **6.81%**

Avance financiero: **7.71%**



Inversión: 8,331.12 mdp.
Incluye I.V.A.



Inicio: julio 2024
Término: 14 de febrero 2028



Meta: 68.5 km. + 2.4 Km del Ramal
79 Estructuras; Puentes, PSV'S,
PSFCC, PIV'S.
1 Plaza de Cobro, 5 Entronques,
165 ODT'S.



2000 Empleos directos generados
600 Empleos indirectos generados



128 000 habitantes beneficiados

20 minutos de ahorro en tiempo



San Luis Potosí

La Pitahaya-Libramiento Oriente de S.L.P. y el Ramal Villa de Reyes



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Estructuras Proyectadas por Tramo

Tramo 1

Descripción		Descripción		Descripción	
1	Ent. La Pitahaya Km. 0+500	7	PSFFCC Km. 12+780	13	Ducto Km. 18+426 38.00%
2	PSV Km. 2+096.73 94.00%	8	PIV Km. 12+930	14	Puente Km.18+610 47.00%
3	Puente Km. 2+481 8.50%	9	PSV Km. 14+043	15	Dob Ca Km. 18+820 94.00%
4	Ducto Km. 2+680 52.00%	10	PIV Km. 14+810		
5	PIV Km. 9+289.75	11	PSFFCC Km. 16+250 6.80%		
6	Ducto Km. 10+853	12	PIV Km. 17+530 38.00%		

Tramo 2

Descripción		Descripción		Descripción	
16	PSG Km.121+870	22	Ducto Km. 129+005	28	Puente Km. 134+662
17	PSV Km. 123+453	23	PSV Km. 130+725	29	PSG Km. 135+950
18	Puente Km. 123+608	24	PSG Km. 131+530	30	PIV Km. 137+310
19	PSV Km. 126+360	25	PSV Km. 132+820	31	Puente Carranco Km. 137+820
20	PSV Km. 128+210	26	Ducto Km. 134+020		
21	Puente Km. 128+420	27	PSV Km. 134+604		

Estructuras Sin Actividad

11	PSFFCC Km. 16+250 6.80% (por proceso constructivo y cuestión de seguridad)
40	PSG Km. 41+981.48 3.00% (en espera del suministro de acero)
47	PSG Km. 45+380 91.50% (el terraplén ya esta casi por llegar a la estructura)
61	PIV Km. 53+150.26 46.60% (la fuerza de trabajo se movió a otro actividad)
63	PIV Km. 53+150.26 46.60% (la fuerza de trabajo se movió a otro actividad)
64	PSV Km. 54+424.37 84.20% (la fuerza de trabajo se movió a otro actividad)
68	PSV Km. 58+505 39.40% (la fuerza de trabajo se movió a otro actividad)
69	PSV Km. 59+030 2.01% (se esta revisando unas filtraciones)
70	PSV Km. 60+5.79 39.00% (pendiente de autorizar libranza de postes de CFE)

Tramo 3

Descripción		Descripción		Descripción	
32	PIV Km. 36+719.53	41	PSV Km. 42+386	50	PIV Km. 49+120
33	PIV Km. 37+739.99	42	PSG Km. 42+650 2.00%	51	PIV Km. 49+900
34	PSV Km. 38+242.30	43	Puente Km. 42+990 26.20%	52	E.c. Car 37 PSV Km. 16+540
35	Puente Altamira Km. 39+520 13.91%	44	PSV Km. 43+456.78	53	PSV Km. 17+040
36	PSG Km. 39+750	45	PSV Km. 43+577.34	54	PSV Km. 17+610
37	PIV Km. 40+349.53	46	PIV Km. 44+243.13 18.40%	55	PIV Km. 18+365
38	PIV Km. 41+119.44	47	PSG Km. 45+380 91.50%	56	Ec.IndPSVKm18+700 9.75%
39	Ducto Km. 41+532.47 6.61%	48	Ducto Km. 45+517		
40	PSG Km. 41+981.48 3.00%	49	PSG Km. 46+930		

Tramo 4

Descripción		Descripción		Descripción	
57	Ducto Km. 51+500 18.93%	66	PSV Km. 55+407 19.50%	75	Ducto Km. 65+791.31 49.20%
58	Ducto Km. 10+333 64.20%	67	PIV Km. 56+354.38	76	Ec Lib Ote Km. 66+000
59	PSV Km. 10+500	68	PSV Km. 58+505 39.40%	77	PSV Km. 66+441.21
60	Ducto 20+580 23.00%	69	PSV Km. 59+030 2.01%	78	PSV Km. 66+449.24 15.10%
61	Ec Carr. 57 Km.51+800 0.02%	70	PSV Km. 60+579.85 39.00%	79	PSV Km. 1+412
62	PSG Km. 52+190 37.20%	71	PSV Km. 61+561.78 70.4%		
63	PIV Km. 53+150.26 46.60%	72	PSV Km. 62+398.36 25.40%		
64	PSV Km. 54+424.37 84.20%	73	PSV Km. 63+517.92 48.10%		
65	PSV Km. 54+952.42 79.13%	74	PSV Km. 64+800 36.20%		


Simbología

	Por construir
	En proceso de construcción
	Concluido



Volúmenes de obra				
Tramo I km. 0+000 al Km. 19+400				
Tramo III Km. 36+000 al Km. 50+000				
Tramo IV km. 50+000 al Km. 66+000				
Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	Ejecutado
Terracerías				
Desmonte, cualquiera que sea su tipo y características en carreteras, sin trasplante,	388.22	274.62	113.60	4.74
Despalme de espesor variable en corte y terraplén, el material producto	733,873.06	338,288.96	395,584.10	2,354.26
Excavaciones en cortes y adicionales debajo de la subrasante, cualquiera que sea su	2,860,090.52	308,257.37	2,551,833.15	13,876.80
Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de	3,858,592.51	346,565.25	3,512,027.26	15,321.57
Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de	3,710,618.07	573,388.02	3,137,230.05	68,201.27
Formación y compactación de terraplenes utilizando materiales compactables	330,950.70	47,713.10	283,237.60	6,632.13
Formación y compactación de terraplenes utilizando materiales compactables	1,570,694.98	11,888.60	1,558,806.38	1,200.70
Obras de Drenaje				
Excavación para estructuras u obras de drenaje, cualquiera que sea su clasificación, con una	53,714.94	4,824.25	48,890.69	218.98
Plantilla de material Granular, P.U.O.T	5,780.69	358.31	5,422.38	50.47
Arrope y Relleno con material de calidad de subrasante, compactado al 95% de la	74,713.07	7,314.32	67,398.75	550.68
Alcantarilla de concreto reforzado de f'c = 280 kg/cm2, en dirección normal de 152 cm	7,394.04	645.55	6,748.49	33.60
Concreto hidráulico de f'c= 100 kg/cm2 en plantilla, por unidad de obra terminada.	1,399.10	372.69	1,026.41	4.62
Concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2, por unidad de obra terminada.	3,314.74	2,715.46	599.28	76.34
Concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 en losa, por unidad de obra terminada.	13,274.04	484.44	12,789.60	-
Acero para concreto hidráulico con límite elástico igual o mayor de fy = 4200 kg/cm2	356,544.18	122,282.11	234,262.07	4,403.26
Malla electrosoldada 6x6 10-10, P.U.O.T	2,330.47	947.01	1,383.46	-
Entronques				
Terracerías				
Despalme de espesor variable en corte y terraplén, el material producto del	61,394.70	44,945.57	16,449.13	182.37
Excavaciones en cortes y adicionales debajo de la subrasante, cualquiera que sea su	848,439.10	178,748.00	669,691.10	3,392.04
Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de	325,337.10	62,616.17	262,720.93	-
Formación y compactación de terraplenes utilizando materiales compactables	68,896.40	1,151.11	67,745.29	255.03

Avance: Programado, Físico y Financiero

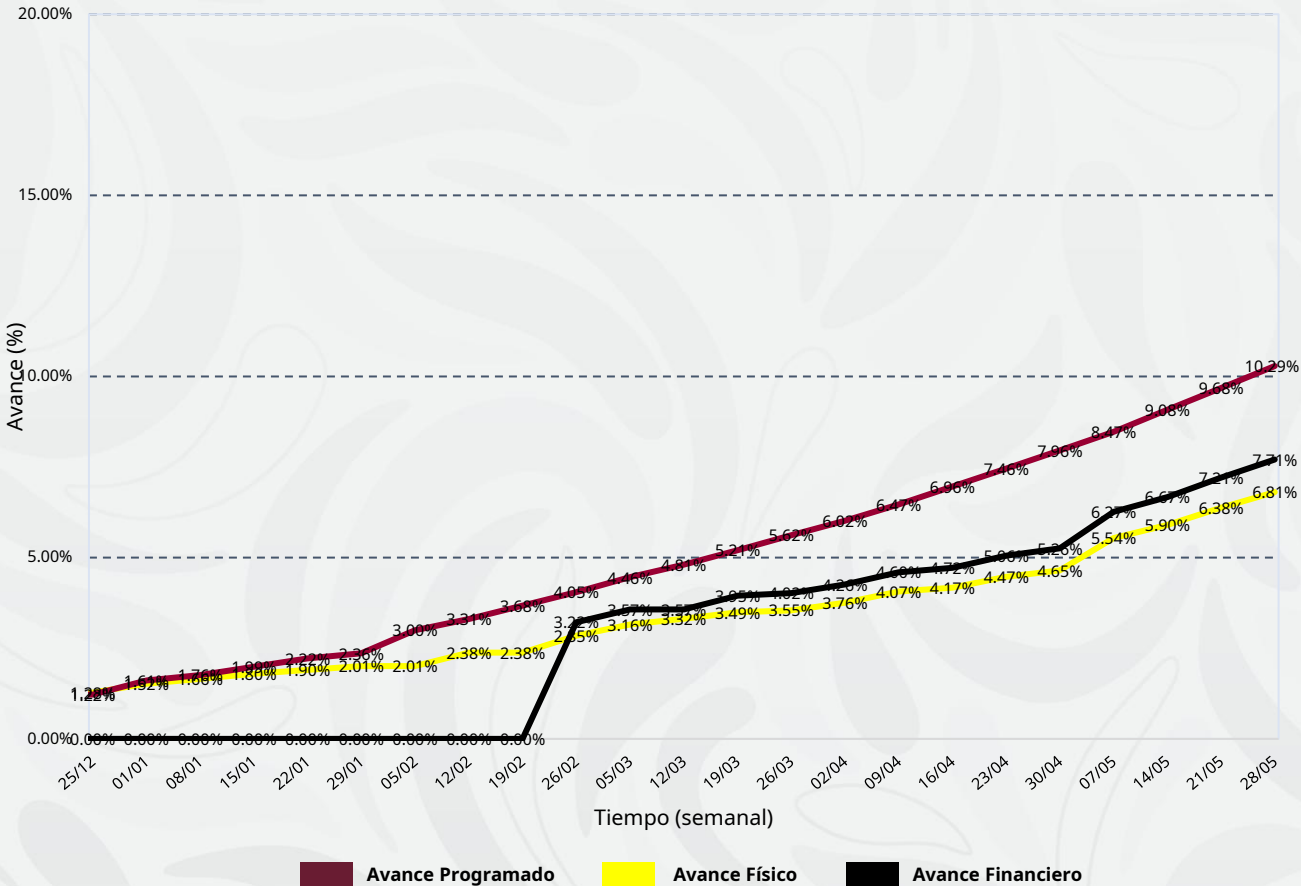

	Del 15 de mayo a 21 de mayo de 2026	Del 22 de mayo a 28 de mayo de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	801	833
Maquinaria	166	159
Frente de Trabajo	Tramo 1/Tramo 3/Tramo 4	Tramo 1/Tramo 3/Tramo 4
