





Descripción	
1	PIV con entronque "El Maguey" km 1+300 - Avance 2.8% . Problemas de DDV. (Modificación de proyecto).
2	Entronque a desnivel Lagos de Moreno Este km 11+800 (adecuación)- Avance 38.48% (se movió la fuerza de trabajo)
3	PIV con entronque "Fracc. Andalucía" km 12+120 Avance 2.84% . (se movió la fuerza de trabajo)
4	Puente km 12+450 "Río Lagos"- Avance 93.74% . (se movió la fuerza de trabajo)
5	PIV con entronque "Sepúlveda" km 13+620 Avance 14.98% .
6	PSV con entronque "DRÄXLMAIER" km 15+900 Avance 12.90%
7	PIV con entronque "Encarnación" km 18+200
8	PSFC con retornos km 19+860 Avance 2.73%
9	PIV con entronque Tipo Glorieta "Lagos de Moreno Oeste" km 23+920 Avance 33.57% .

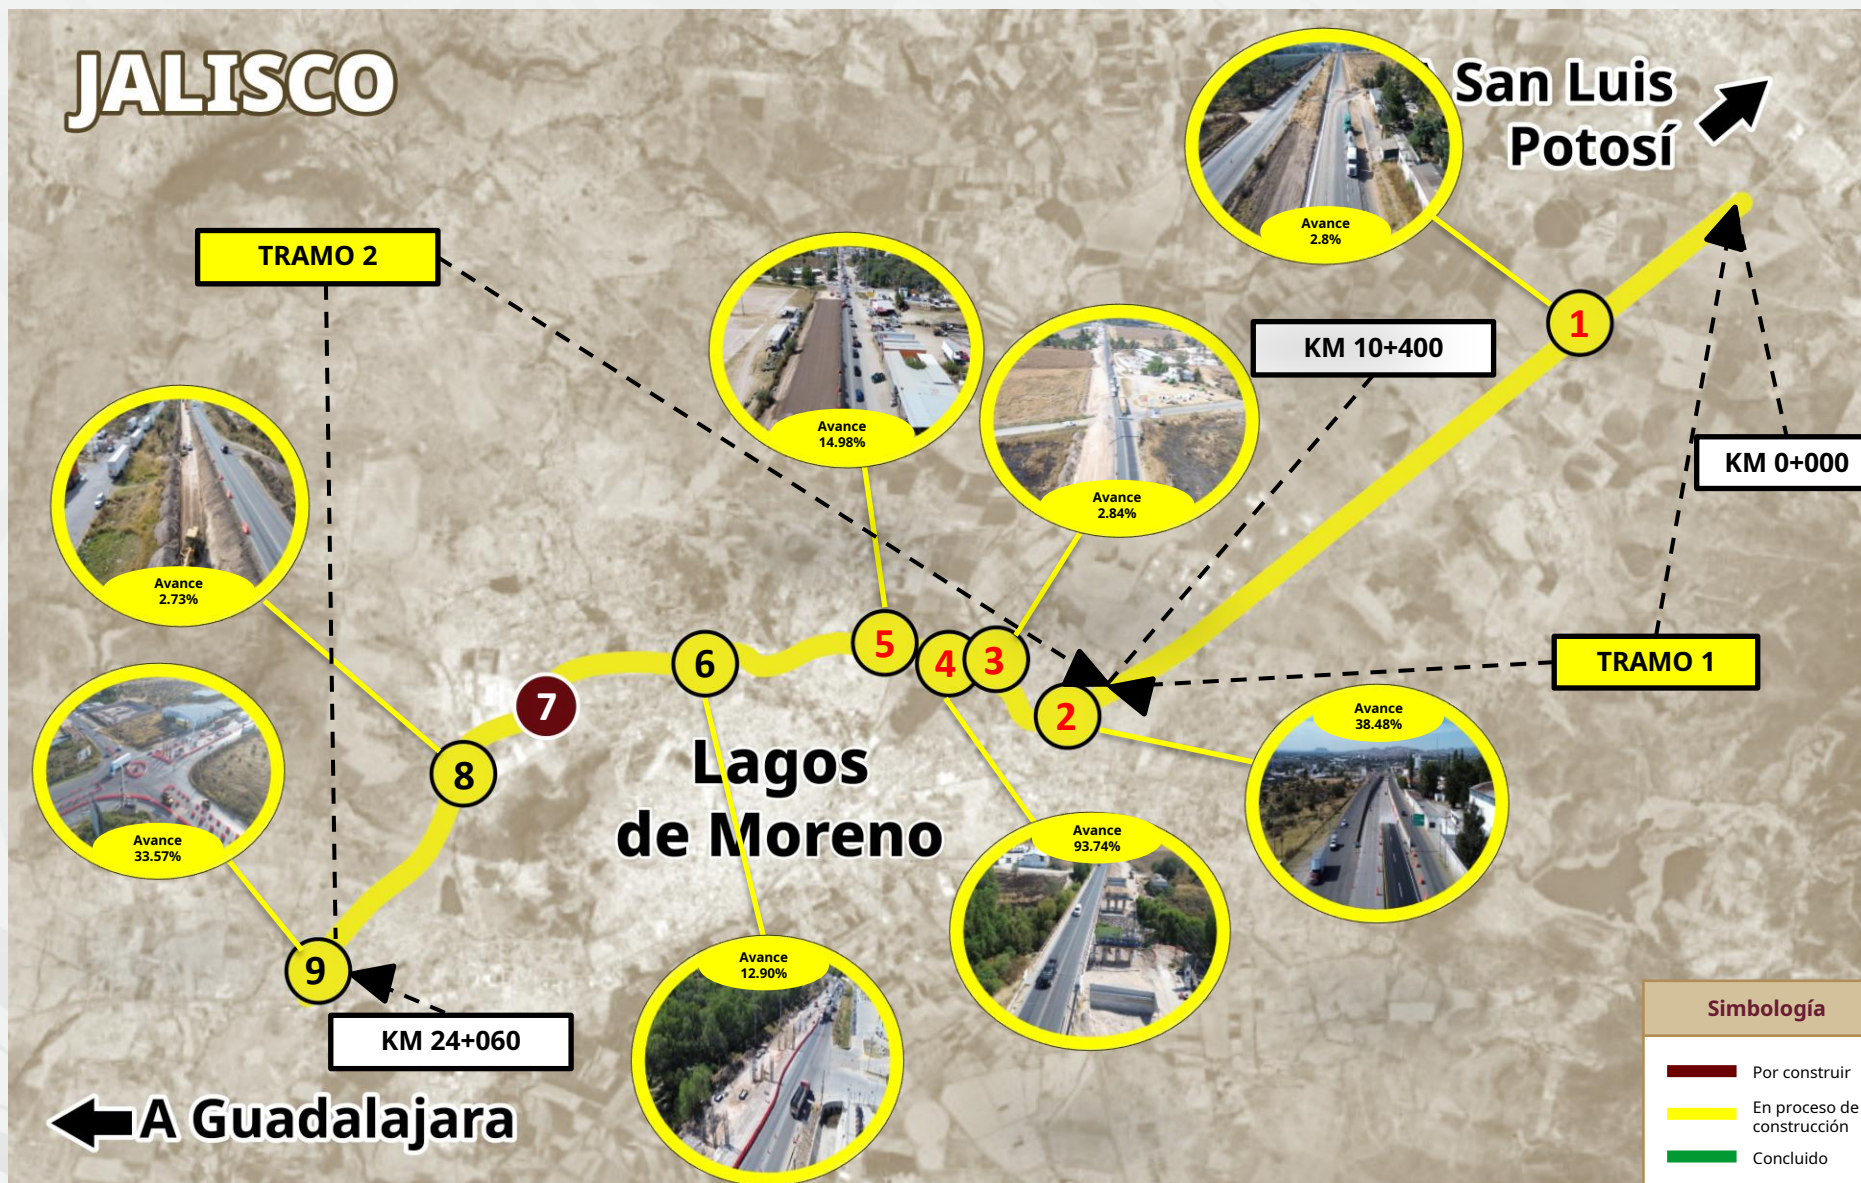

TRAMO 2 - AVANCE TRONCAL Y ENTRONQUES							
Concepto	Unidad	Total	Ejecutado	Faltante	22/05/26 al 28/05/26		Observaciones
					Programado	Ejecutado	
Terracerías Troncal	%	100%	58.39%	41.61%	0.021%	0.23%	En proceso
Pavimentos Troncal	%	100%	29.16%	70.84%	0.040%	6.76%	En proceso
Drenaje Troncal	%	100%	24.19%	75.81%	0.00%	7.60%	En proceso
Obras Inducidas	%	100%	40.71%	59.29%	0.050%	2.28%	En proceso
Entronque km 12+120	%	100%	2.84%	97.16%	0.00%	0.00%	En proceso
Entronque km 13+620	%	100%	14.98%	85.02%	0.00%	3.45%	En proceso
Entronque km 15+900	%	100%	12.90%	87.10%	0.00%	1.14%	En proceso
PSFC 19+860	%	100%	2.73%	97.27%	0.00%	0.75%	En proceso
Entronque 23+920	%	100%	33.57%	66.43%	0.13%	3.42%	En proceso

Avance: Programado, Físico y Financiero

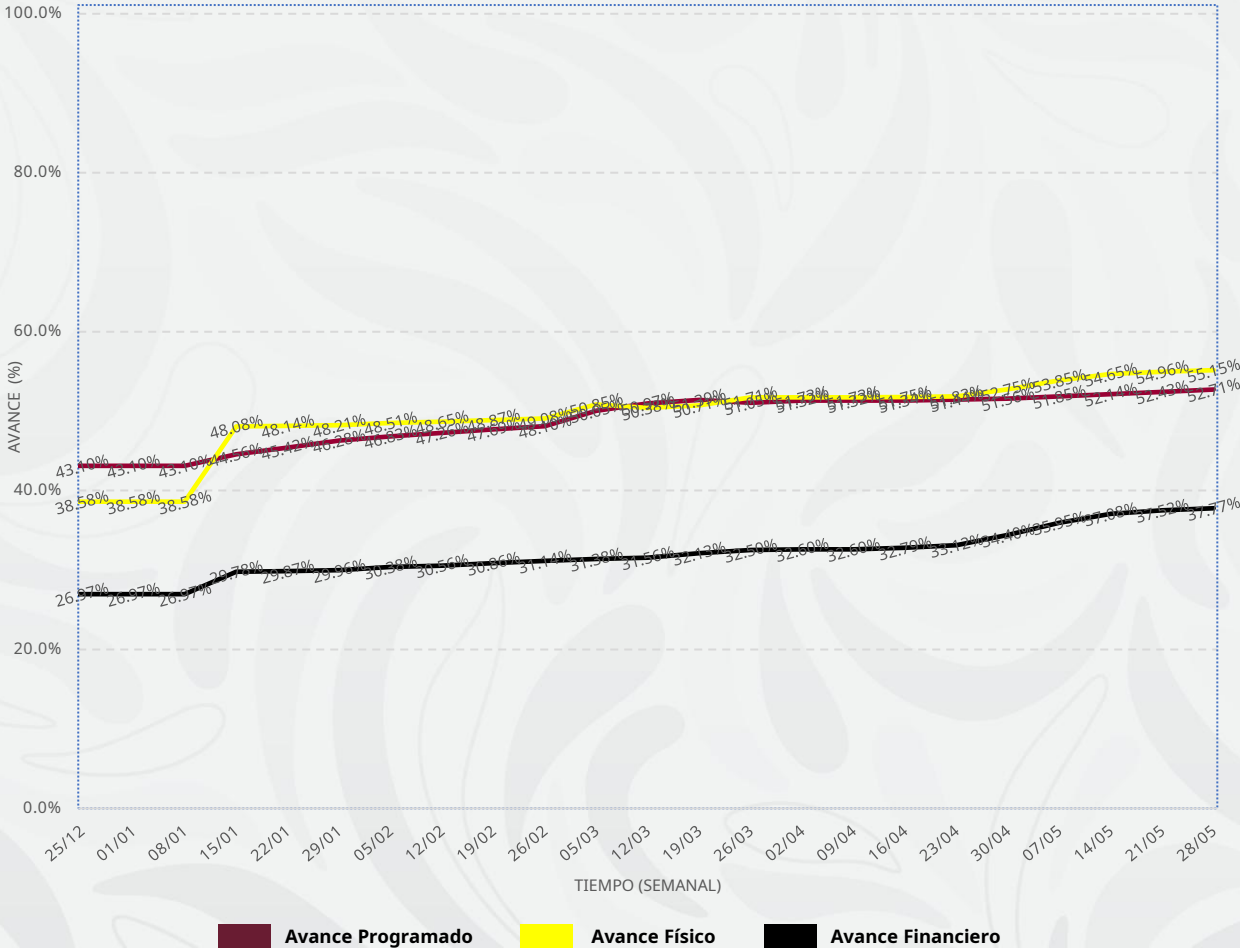

	15 al 21 de mayo 2026	22 al 28 de mayo 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	246	246
Maquinaria	69	69
