



Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha

Concesionaria: IDEAL
Constructora: MOTA-ENGIL, S.A. de C.V.

VERACRUZ

PSMA 3.9 Km
3+900 TRABAJOS
DE EXCAVACIÓN



PUENTE 7.3 KM
7+373 TRABAJOS
DE COLADO DEL
1ER TREPADO
PARA LAS
COLUMNAS 1 Y 2,
(DEL APOYO
INTERMEDIO
PILA NO. 2).



Simbología

- Por construir
- En proceso de construcción
- Concluido

Soyacuatla



Descripción	
1	Entronque Laguna Verde II Km 0+000
2	PSMA 1.5 Km 1+555.5
3	PSMA 2.7 Km 2+703.91
4	PIV 3.05 Km 3+041
5	Entronque Laguna Verde I Km 3+041
6	PSMA 3.9 Km 3+900 (5.00%) (Trabajos de excavación)
7	PSMA 6.0 Km 6+080
8	PIV 6.8 Km 6+806 (96.00%) (Se movió la fuerza de trabajo)
9	PIV 7.04 Km 7+040 (5.00%) (Se continua con la evaluación de la reubicación de la estructura).
10	PUENTE 7.3 Km 7+330 (24.00%) Trabajos de colado de columnas.
11	PUENTE 7.8 Km 7+815, (61.70%) (Se movió la fuerza de trabajo)
12	PLAZA DE COBRO Km 8+300, (16.00%) (El proyecto ejecutivo está en revisión en la DGDC.)
13	PUENTE 8.7 Km 8+665, (96.00%) (a nivel de losa colada)
14	PSMA 8.9 Km 8+960,
15	PUENTE 14 Km 14+000
16	PUENTE 14.7 Km 14+700
17	PSV Km 14+900
18	PSMA 15.3 Km 15+370
19	PSV 16.8 Km 16+800
20	ENTRONQUE LA MANCHA Km 19+841

Avance físico

- Programado: 85.57%
- Real: 33.56% Incluye Ent. Chapachapa
- Financiero: 17.06%
- Semanal: 1.23%



Inversión: 2,252.78 mdp



Inicio: Marzo de 2025
Término: Agosto de 2026



Meta: 19.84 km, 5 Puentes, 1 Plaza de Cobro, 3 Entronques, 2 PSVs, 3 PIVs, 6 PSMA, 59 ODTs y el Entronque Chapachapa



2,252.78 (1)=2,253 empleos directos generados/millón de inversión
2,252.78 (2)= 4,506 empleos indirectos generados/millón de inversión



128,000 habitantes beneficiados



45 minutos de ahorro en tiempo, Tramo 4

Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha

Concesionaria: IDEAL
Constructora: MOTA-ENGIL, S.A. de C.V.



Avance físico

- Real: 100.00%
- Programado: 100.00%
- Financiero: 75.01%
- Semanal: 0.00%

Descripción	
1	Entronque Chapachapa Km 739+733 (Km op. 92+512)
2	ODT 92+827.25
3	PSPyG 92+832.22
4	Ampliación de ODT 100+102,


Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha



Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	21/05/26 al 28/05/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Tramo 4 Laguna Verde - La Mancha						
Volúmenes de obra						
Despalme	229,302.80	103,582.87	125,719.93	7,165.00	6,877.81	El volumen programado corresponde a los 19. 8 km y solo se trabaja en 8.5 km.
Corte	1,414,039.20	232,617.65	1,181,421.55	27,193.00	9,178.95	El volumen programado corresponde a los 19. 8 km y solo se trabaja en 8.5 km.
Terraplén	1,155,915.50	224,079.68	931,835.82	20,641.00	4,757.40	El volumen programado corresponde a los 19. 8 km y solo se trabaja en 8.5 km.
Subyacente	162,462.20	70,227.50	92,234.70	27,077.03	3,999.99	El volumen programado corresponde a los 19. 8 km y solo se trabaja en 8.5 km.
Base Hidráulica	54,900.80	10,085.77	44,815.03	9,150.13	2,849.87	El volumen programado corresponde a los 19. 8 km y solo se trabaja en 8.5 km.
Estructuras Tramo 4 Laguna Verde - La Mancha						
Cargaderos	2	0	2	0	0	Puente 7.3 Km 7+373
Apoyos	2	0	2	0	0	Puente 7.3 Km 7+373
Pilas	12	12	0	0	0	Puente 7.3 Km 7+373
Columnas	6	0	6	0	0	Puente 7.3 Km 7+373 Trabajos de colado del 1er trepado para las columnas 1 y 2, (del apoyo intermedio pila no. 2).

Avance: Programado, Físico y Financiero

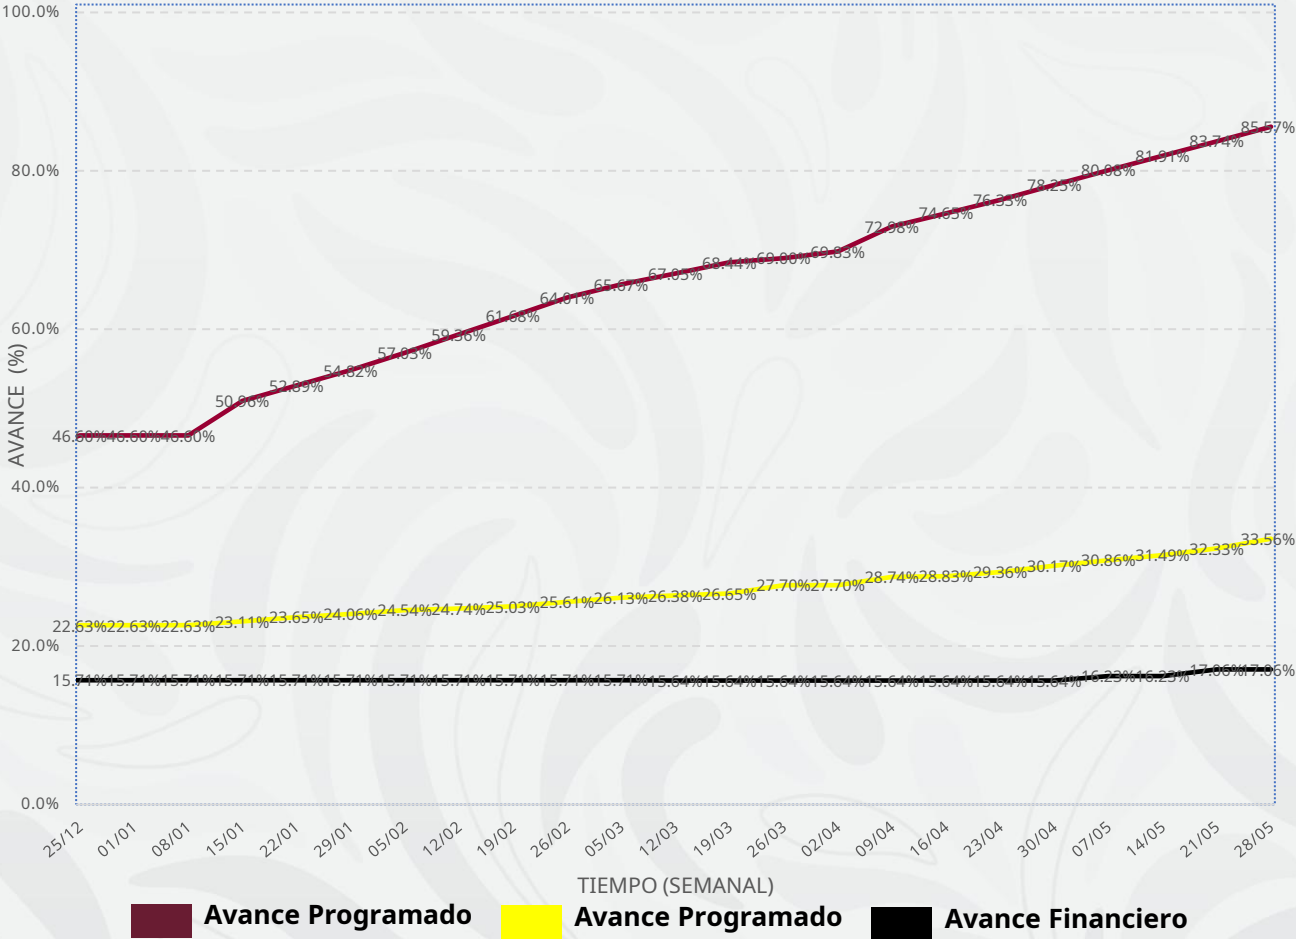

	08 de mayo al 14 de mayo	15 de mayo al 21 de mayo	22 de mayo al 28 de mayo
Fuerza de Trabajo (personas)	200	200	210
Maquinaria	37	39	39
