

Michoacán

Uruapan-Nueva Italia




Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance físico

- Programado: 24.85 %
- Real: 24.17 %
- Semanal: 0.49 %
- Financiero: 19.10%

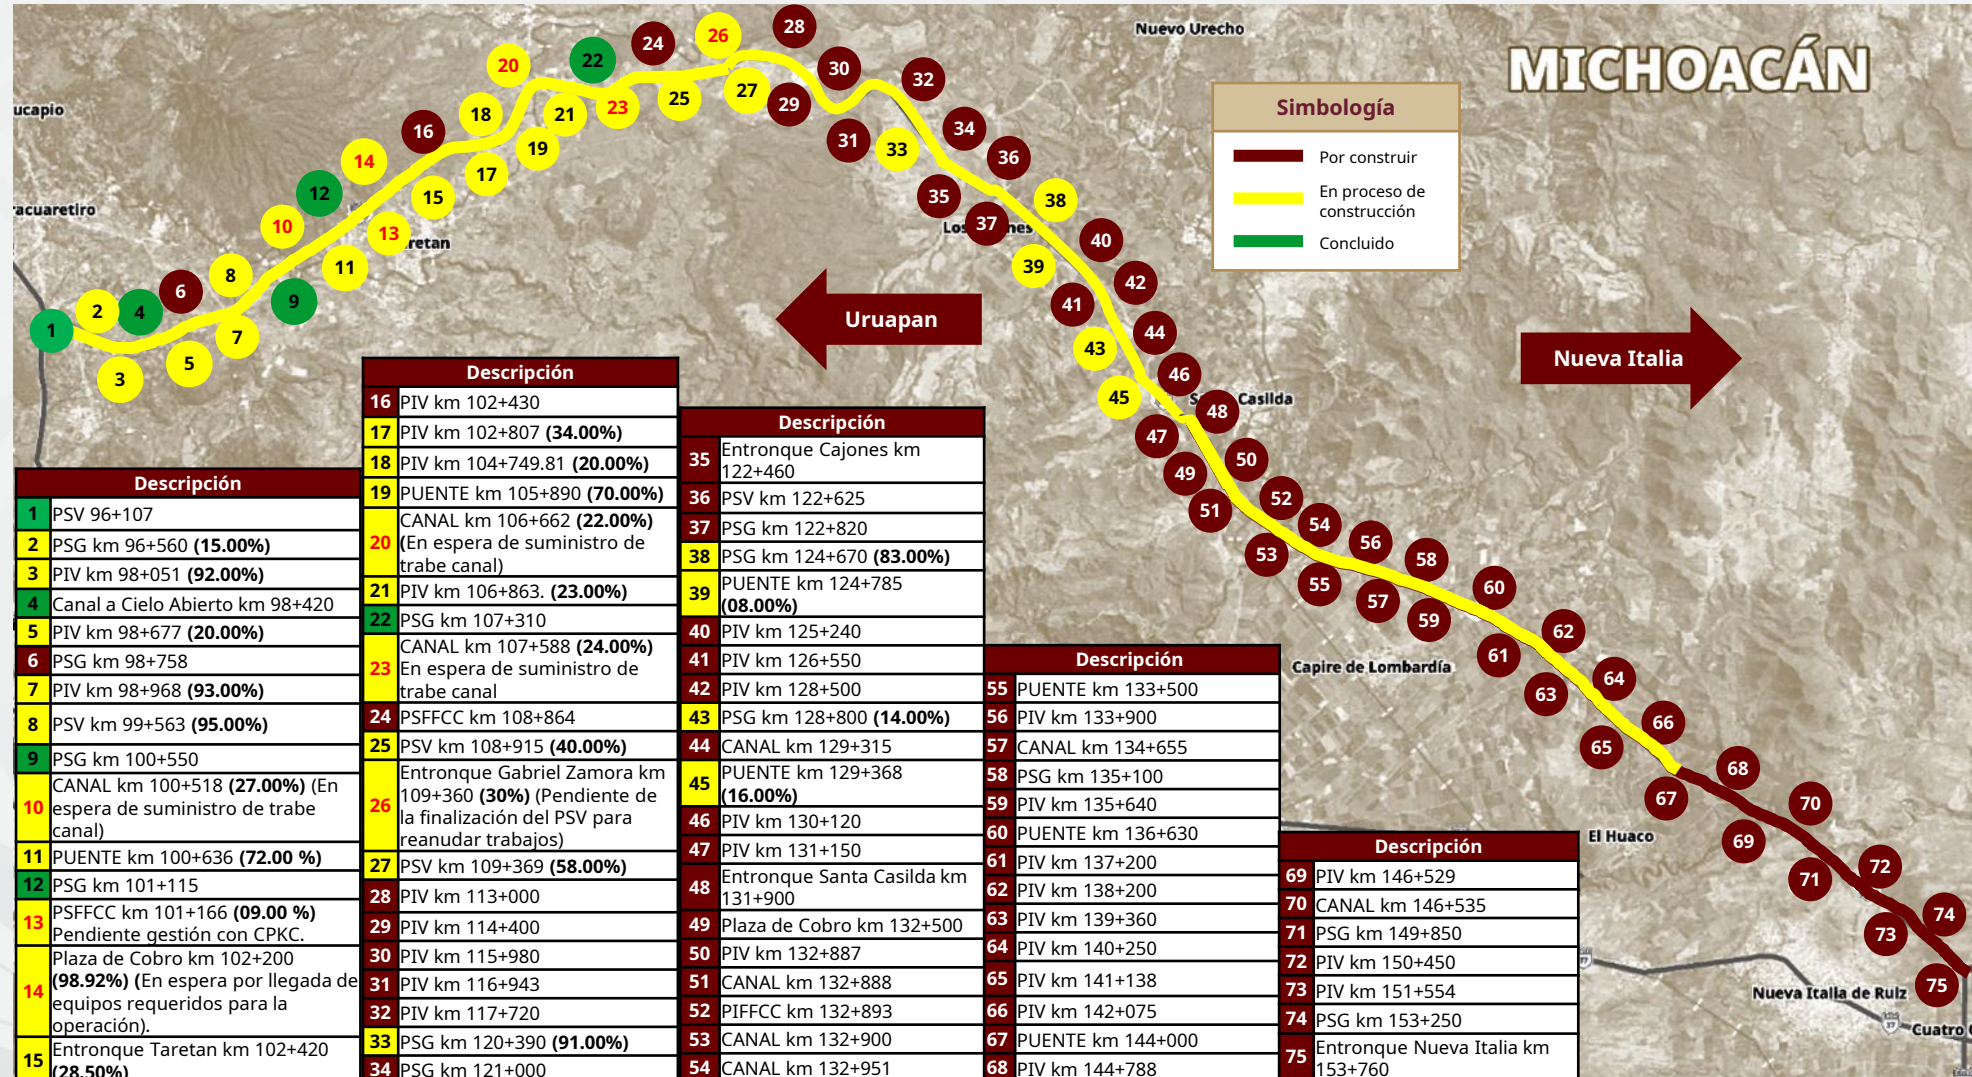


- Inversión: 7,049.9 mdp**
- Inicio:** noviembre de 2023
Término: agosto de 2027
- Meta: 67.09 km**
 - 65.00 km (troncal)
 - 2.09 km (estructuras)
 - 2 Plazas de Cobro, 7 puentes, 5 Entronques, 60 cruces (5 PSV's, 30 PIV's, 13 PSG's, 1 PIFFCC, 2 PSFFCC, 9 trabes canales), 1 canal a cielo abierto (cien fuegos) y múltiples obras de drenaje.
- 21,147 empleos generados**
7,049 empleos directos
14,098 empleos indirectos
- 1,800,000 habitantes beneficiados**
- 25 minutos de ahorro en tiempo**
- Concesionaria : PINFRA.**

Michoacán

Uruapan-Nueva Italia



Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	21/05/2026 al 28/05/2026		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Carpeta Asfáltica	65 km	10.70 km	54.30 km	.200 km	.200 km	
Base Asfáltica	65 km	12.60 km	52.40 km	.200 km	.200 km	
Base Hidráulica	65 km	14.20 km	50.80 km	.300 km	.300 km	
Subbase	65 km	16.10 km	48.90 km	.300 km	.300 km	
Subyacente	65 km	19.40 km	45.60 km	.400 km	.400 km	
PIV Km 98+677 Demolición	1	0	1	1	1	Demolición de losa en antigua estructura.
PSV Km 99+563 Accesos	2	0	1	1	1	Incorporación de humedad en subcapa para conformación de subrasante en accesos
PIV Km 102+804 Superestructura	9	0	9	6	6	Armado de acero y habilitado de cimbra para diafragmas interiores
PIV Km 104+749 Superestructura	1	0	1	1	1	Colado de concreto hidráulico para cabezal en eje 2
Puente Km 105+890 Superestructura	1	0	1	1	1	Colado de concreto hidráulico para losa claro 2-3.
PSV Km 108+915 Subestructura	8	0	8	8	8	Montaje de trabes de concreto

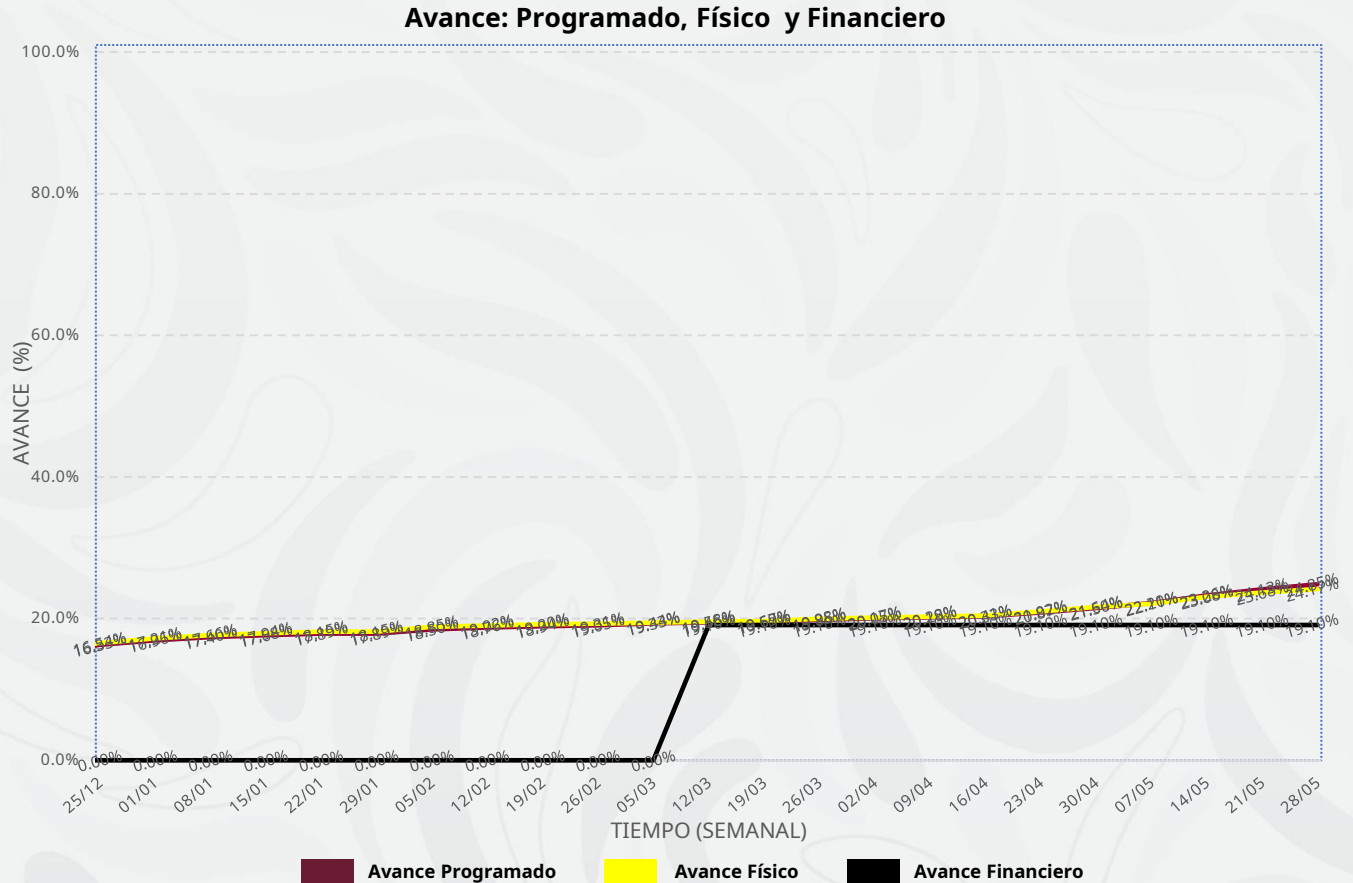

	Del 14 de mayo al 21 de mayo de 2026.	Del 21 de mayo al 28 de mayo de 2026.
Fuerza de Trabajo (personas)	805	805
Maquinaria	255	255
Frente de Trabajo	Troncal del km 95+000 al km 140+000, PIV km 98+051, PIV km 98+968, PSG km 100+550, PSG km 101+115, Entronque Taretan km 102+140, Puente km 105+890, PSG km 107+310, Entronque Gabriel Zamora km 109+360, PSV km 109+369, PSG km 120+390	Troncal del km 95+000 al km 140+000, PIV km 98+051, PIV km 98+968, PSG km 100+550, PSG km 101+115, Entronque Taretan km 102+140, Puente km 105+890, PSG km 107+310, Entronque Gabriel Zamora km 109+360, PSV km 109+369, PSG km 120+390, PSG km 124+670
