


Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

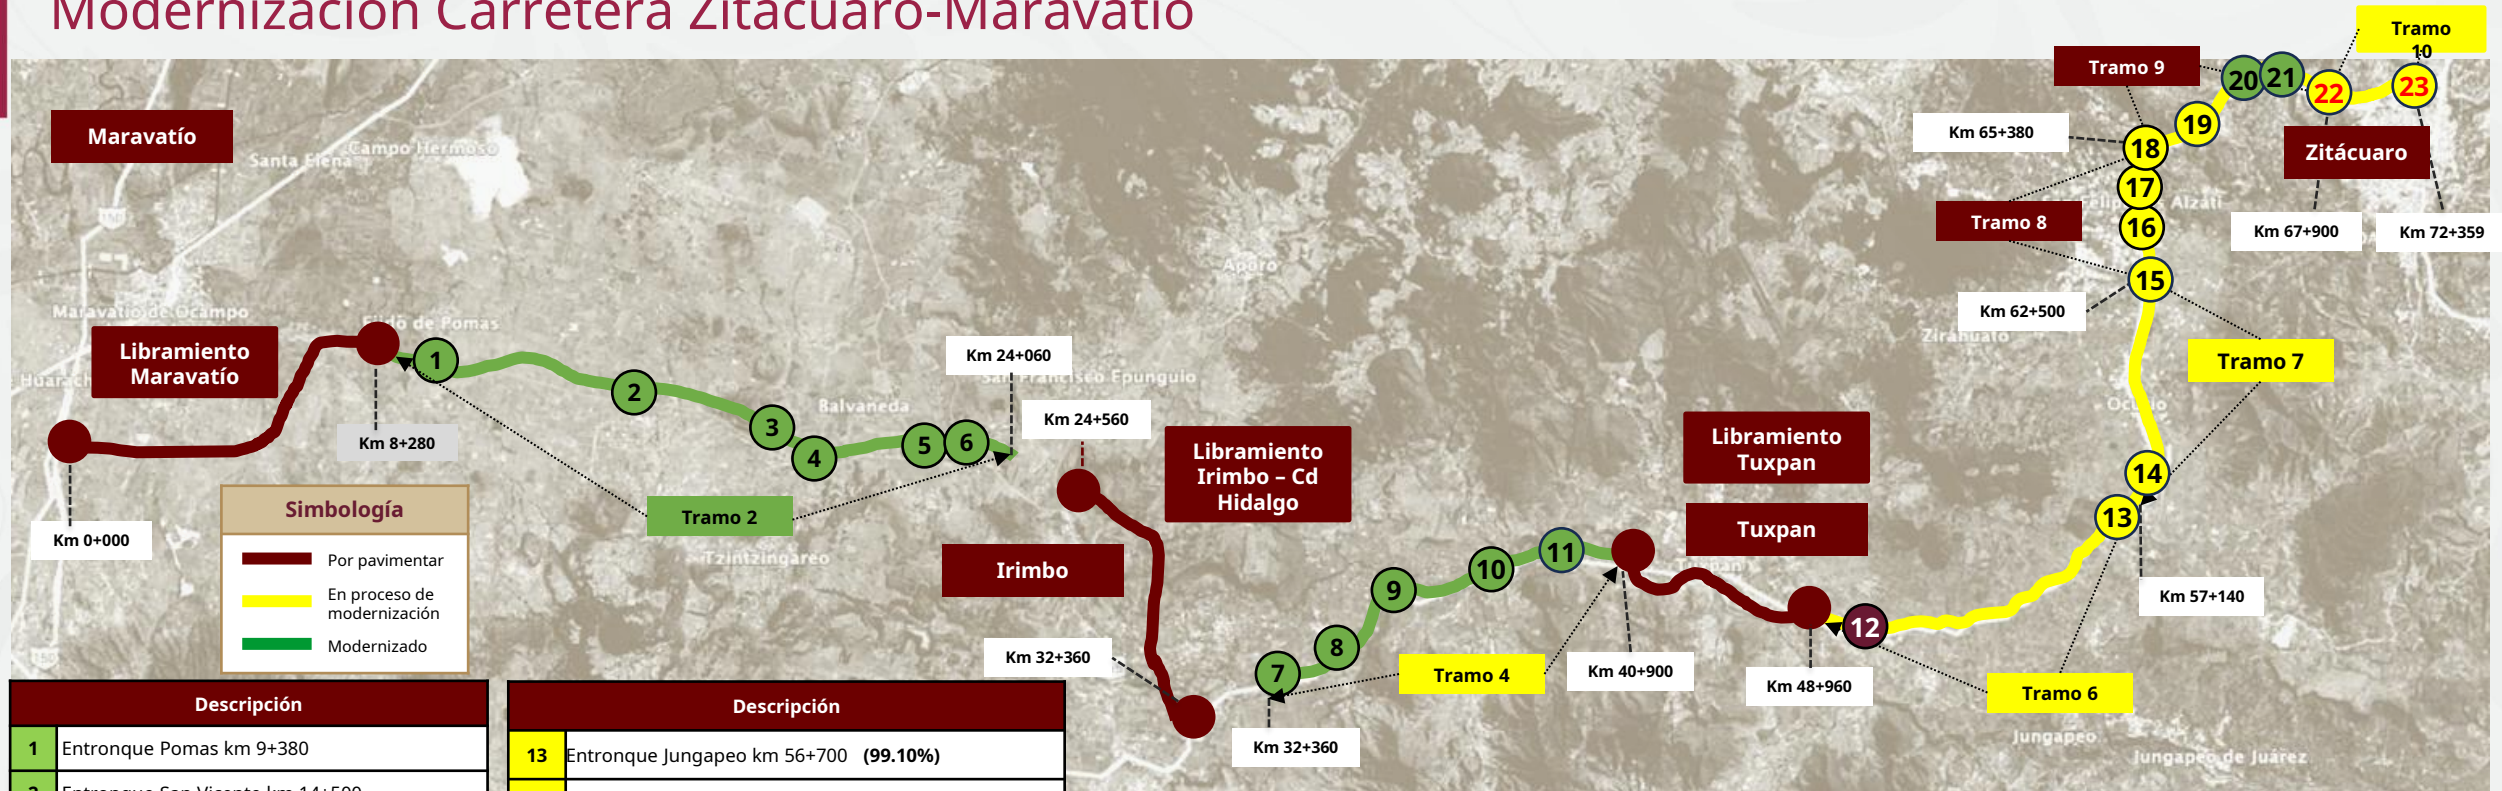

Descripción	
1	Entronque Pomas km 9+380
2	Entronque San Vicente km 14+500
3	PIP km 18+370
4	Entronque Zinzingareo km 18+700
5	Entronque Senguio km 21+280
6	PIP km 22+280
7	Entronque Santa Rosa km 32+420
8	Entronque Ziranda-Jaripeo km 33+500
9	Puente Turundeo Km 36+460
10	Entronque Turundeo I km 37+550
11	Entronque Turundeo II km 38+780
12	Puente Obispo Km 50+400 (0.00%),

Descripción	
13	Entronque Jungapeo km 56+700 (99.10%)
14	Entronque Piedras de Lumbre km 57+700 (75.59%)
15	Entronque Zirahuato km 62+500 (71.18%)
16	Entronque San Felipe I km 64+400 (60.58%)
17	Entronque San Felipe II Km 64+640 (60.58%)
18	Entronque Macutzio km 65+620 (46.96%)
19	Entronque Valle Verde km 67+220 (97.90%)
20	Entronque Curungueo I Km 68+240
21	Entronque Curungueo II Km 68+780
22	Puente San Juan Viejo Km 69+860 (98.75%), (Sin Actividad)
23	PSV Zitácuaro Km 72+160 (97.28%), (Sin Actividad)

Avance físico

- Programado: 65.07% (Reprogramación T8)
- Real: 66.75%
- Semanal: 0.39%
- Financiero: 20.44%

Nota 1:

Los avances se calculan en relación a la Inversión total del Ramal

Nota 2:

Las Estructuras en proceso remarcadas en color rojo, no presentan avance en el periodo semanal, o no han iniciado.



Inversión: \$4,575.3 mdp (total Ramal)
\$3,048.81 mdp (modernización)
\$1,526.49 mdp (Libramientos)



Meta: 71.3 Km



Inicio: septiembre 2020
Reinicio: 27 de enero de 2024
Término: 31 de diciembre de 2026



4,800 empleos generados



126,000 habitantes beneficiados



Ahorro en tiempo: 25 min

Concesionaria: Red de carreteras de occidente

Michoacán


Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío



TERRACERIAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 22 may al 28 may 26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Cortes (m3)	705,558.00	789,714.94	-84,156.94	0.00	1,947.86	
Terraplén (m3)	445,687.00	481,544.21	-35,857.21	0.00	8,963.52	
Subyacente (m3)	256,097.00	283,947.66	-27,850.66	0.00	2,347.43	
Subrasante (m3)	170,688.00	183,174.49	-12,486.49	0.00	1,288.58	

PAVIMENTOS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 22 may al 28 may 26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Base Hidráulica (m3)	125,659.04	131,685.39	-6,026.35	445.57	912.59	
Bacheo (m3)	1,800.00	1,842.25	-42.25	4.62	0.00	SIN ACTIVIDAD DURANTE ESTE PERIODO
Fresado (m3)	10,676.00	10,948.30	-272.30	47.08	25.50	SE TRABAJA EN TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 6, 7 Y 9
Rayado Carpeta (Ha)	30.24	30.24	0.00	0.32	0.17	SE TRABAJA EN TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 6, 7 Y 9
Base Asfáltica (m3)	120,414.05	126,675.38	-6,261.33	1,048.30	616.46	SE TRABAJA EN TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 6, 7 Y 9
Carpeta Asfáltica (m3)	45,247.80	36,334.53	8,913.27	179.72	264.19	SE TRABAJA EN TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 6, 7 Y 9

ESTRUCTURAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 22 may al 28 may 26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
PSV SAN FELIPE	1.00	0.5396	0.4604	0.0525	0.0045	CONFORMACIÓN DE TERRACERÍAS
PSV SAN JUAN VIEJO	1.00	0.9875	0.0125	0.0000	0.0000	SIN ACTIVIDAD
PSV ZITÁCUARO	1.00	0.9728	0.0272	0.0316	0.0000	SIN ACTIVIDAD
DEFENSA METÁLICA	35,327.00 ml	33,265.81 ml	2,061.19 ml	0.00 ml	127.81 ml	SE INSTALA EN TRAMOS AISLADOS DISPONIBLES
BALIZAMIENTO	157,137.60 ml	93,116.26 ml	64,021.34 ml	0.00 ml	594.90 ml	CONTINÚA LA COLOCACIÓN EN TRAMO 6.
CUNETA	12,028.95 ml	11,002.33 ml	1,026.62 ml	0.00 ml	26.40 ml	CONTINÚA LA CONSTRUCCIÓN EN TRAMO 6
BOTONES	12,041.00 pza	9,715.00 pza	2,326.00 pza	0.00 pza	64.00 pza	CONTINÚA LA COLOCACIÓN EN TRAMO 6.
VERTICAL BAJO	1,011.00 pza	751.00 pza	260.00 pza	0.00 pza	9.00 pza	CONTINÚA LA COLOCACIÓN EN TRAMO 6.

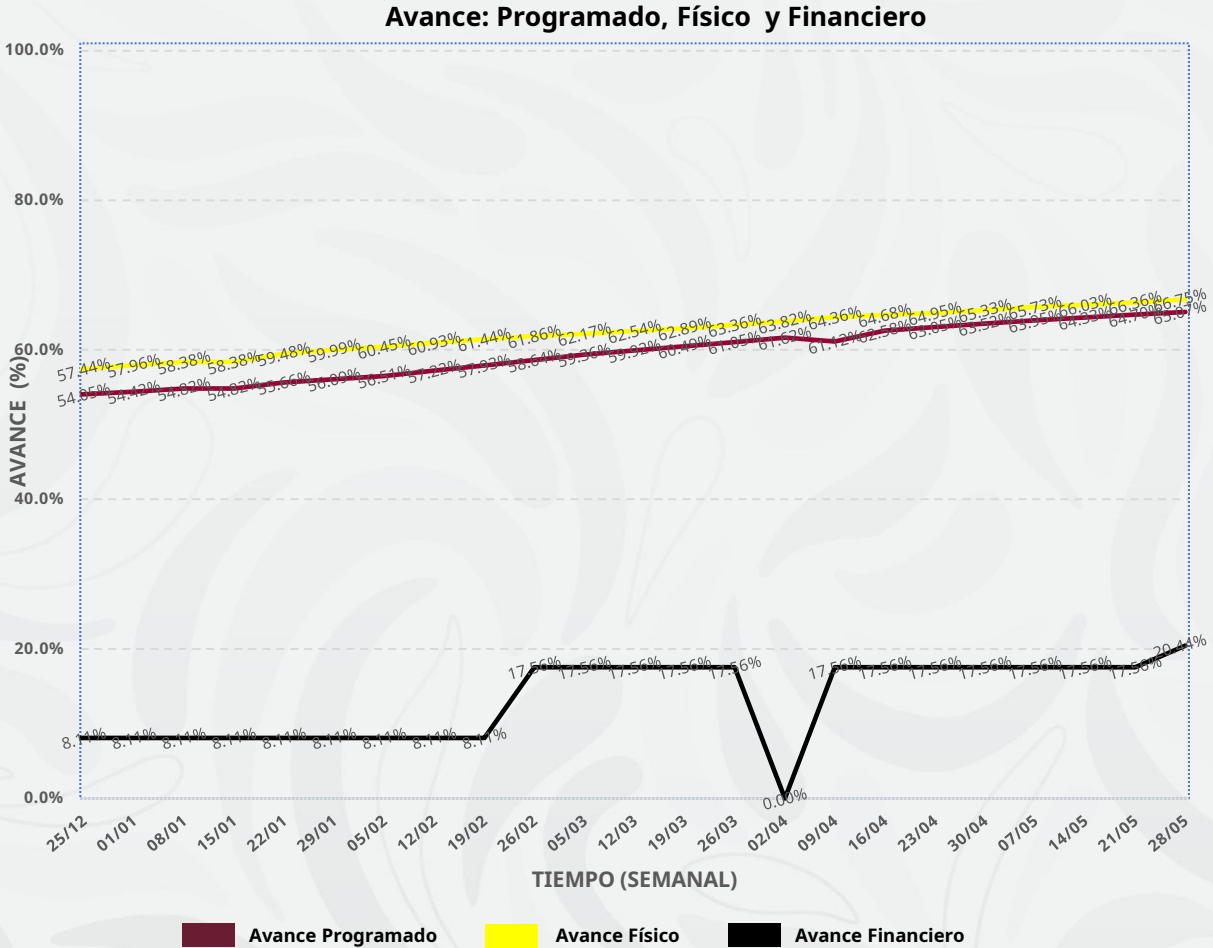

	Del 15 al 21 de mayo 26	Del 22 al 28 de mayo 26
Fuerza de Trabajo (personas)	288	293
Maquinaria	190	191
tramos activos	IV, VI, VII, VIII, IX, X	IV, VI, VII, VIII, IX, X
Frentes de trabajo (totales)	22	22
