

Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha



Descripción	
1	Entronque Laguna Verde II Km 0+000
2	PSMA 1.5 Km 1+555.5
3	PSMA 2.7 Km 2+703.91
4	PIV 3.05 Km 3+041
5	Entronque Laguna Verde I Km 3+041
6	PSMA 3.9 Km 3+900
7	PSMA 6.0 Km 6+080 (97.00%) (estructuralmente concluida, pendiente trabajos de aproche).
8	PIV 6.8 Km 6+806 (96.00%) (se movió la fuerza de trabajo).
9	PIV 7.04 Km 7+040 (5.00%) (Se continua con la evaluación de la reubicación de la estructura).
10	PUENTE 7.3 Km 7+330
11	PUENTE 7.8 Km 7+815, (56.60%) (Pendiente montaje de traveses en claro no. 01; se realiza el montaje de prelosas en claros no. 04 y 05 y cimbrado de diafragma en apoyo 4).
12	PLAZA DE COBRO Km 8+300, (16.00%) (El proyecto ejecutivo está en revisión en la DGDC).
13	PUENTE 8.7 Km 8+665, (70.00%) (Trabajos de armado de acero de refuerzo para colado de losa).
14	PSMA 8.9 Km 8+960
15	PUENTE 14 Km 14+000
16	PUENTE 14.7 Km 14+700
17	PSV Km 14+900
18	PSMA 15.3 Km 15+370
19	PSV 16.8 Km 16+800
20	ENTRONQUE LA MANCHA Km 19+841

Simbología

Por construir

En proceso de construcción

Concluido

Avance físico

- Programado: 69.83%
- Real: 27.70% Incluye Ent. Chapachapa
- Financiero: 15.64%
- Semanal: 1.05%

Inversión: 2,252.78 mdp

Inicio: Marzo de 2025
Término: Agosto de 2026

Meta: 19.84 km, 5 Puentes, 1 Plaza de Cobro, 3 Entronques, 2 PSVs, 3 PIVs, 6 PSMAs, 59 ODTs y el Entronque Chapachapa

2,252.78 (1)=2,253 empleos directos generados/millón de inversión
2,252.78 (2)= 4,506 empleos indirectos generados/millón de inversión

128,000 habitantes beneficiados

45 minutos de ahorro en tiempo, Tramo 4

Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha

Concesionaria: IDEAL
Constructora: MOTA-ENGIL, S.A. de C.V.



Simbología	
	Por construir
	En proceso de construcción
	Concluido

Descripción	
1	Entronque Chapachapa Km 739+733 (Km op. 92+512)
2	ODT 92+827.25
3	PSPyG 92+832.22
4	Ampliación de ODT 100+102,

Avance físico


- Real: 100.00%
- Programado: 100.00%
- Financiero: 75.01%
- Semanal: 0.00%

Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	27/02/26 al 05/03/2026		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Tramo 4 Laguna Verde - La Mancha						
Volúmenes de obra						
Desmonte	117.13	40.37	76.76	4.88	5.58	El volumen programado corresponde a los 19.8 km y solo se trabaja en 7.4 km .
Corte	1,414,039.20	170,022.70	1,244,016.50	27,193.00	3,312.62	El volumen programado corresponde a los 19.8 km y solo se trabaja en 7.4 km .
Terraplén	1,155,915.50	189,728.43	966,187.07	20,641.00	10,052.28	El volumen programado corresponde a los 19.8 km y solo se trabaja en 7.4 km .
Subyacente	162,462.20	58,054.72	104,407.48	27,077.03	2,101.02	El volumen programado corresponde a los 19.8 km y solo se trabaja en 7.4 km .
Subrasante	124,961.00	13,247.95	111,713.05	17,851.57	680.42	El volumen programado corresponde a los 19.8 km y solo se trabaja en 7.4 km .
Pedraplén	97,038.03	48,190.51	48,847.52	4,043.25	3,007.99	El volumen programado corresponde a los 19.8 km y solo se trabaja en 7.4 km .
Estructuras Laguna Verde - La Mancha						
Zapata	4	2	2	0	0	PIV 6.8 Km 6+806 Estribo 01 en espera de reajuste de zapata.
Losa superior	1	1	0	1	1	PIV 6.8 Km 6+806 a nivel de losa colada.

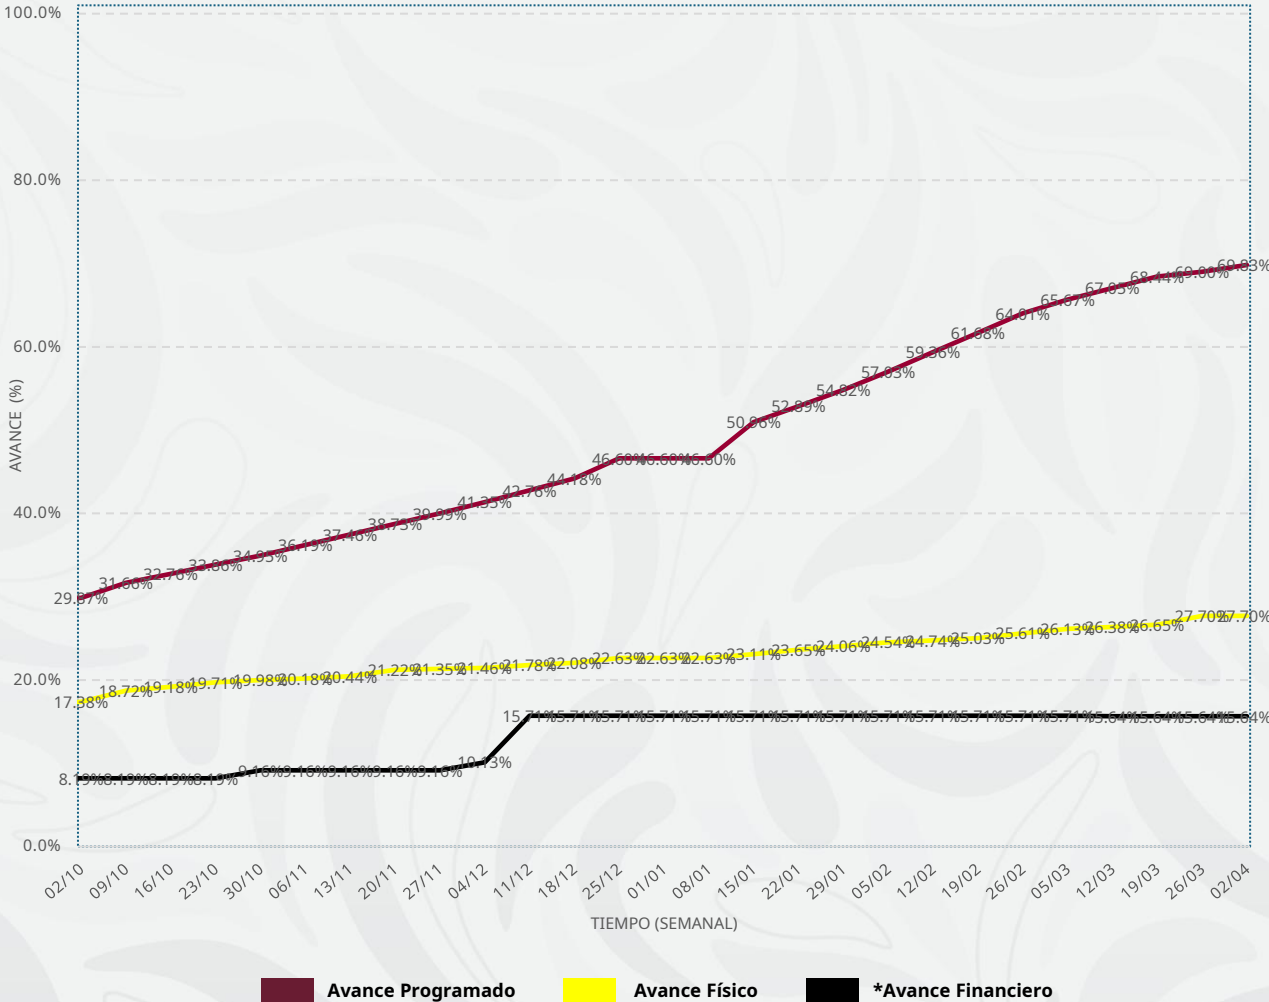

	13 de marzo al 19 de marzo	20 de marzo al 26 de marzo	27 de marzo al 02 de abril
Fuerza de Trabajo (personas)	146	146	100
Maquinaria	18	18	18
