



Avance físico Global: • Programado: 100% • Semanal: 0.00%
• Real: 99.14%

Avance físico Tramo 2: • Real: 97.42%

Avance financiero

- Real pagado: 88.56%
- Con deuda: 97.42%
- Nota: De este porcentaje se tiene una deuda de 2,635.1 mdp incluye IVA, por trabajos ejecutados.



Descripción	
1	PIV km 87+900. 40% *
2	PIV km 91+530.
3	PIPR km 92+436.
4	PIV km 92+438.
5	PIV km 92+680. 0% *
6	Entronque Llano Crucero km 92+690. 82% *
7	Muro de pilas km 92+700. 32% *

Descripción	
8	Entronque Llano Laguna km 98+200.
9	Entronque Cerro Pascale km 100+500.
10	PIV km 106+570.
11	PIV km 108+570.
12	PIV km 109+247.
13	PIV km 110+460.
14	Entronque Danigare km 111+600.


Descripción	
15	PIV km 112+270.
16	PIV km 114+766.
17	Entronque Agua Blanca Km 122+600.
18	Entronque Quiaviczuzas Km 137+900.
19	Túnel El Tornillo km 139+400 (Colapsado). En elaboración proyecto del puente.
20	PIPG Km 146+840. 95% *
21	PIPG km159+400. 95% *

- Inversión:** 29,749.2 mdp incluye I.V.A sin incluir reclamos
- Término:** Inaugurada y puesta en operación 24 de enero de 2025 (pendiente obras complementarias)

- Meta:** 169.23 km; el cual son 159.29 km de Troncal, 6.54 km de puentes, 1.78 km de viaductos y 1.62 km de túneles.
- 65 puentes, 14 viaductos, 10 túneles, 20 entronques, 2 casetas y 17 pasos de servidumbre.**
- En proceso:** Trabajos en la troncal, 1 entronque y 8 pasos de servidumbre
- Nota:** De los pasos de servidumbre 9 están terminados, 2 con un 95%, 1 al 40% y 5 sin iniciar
- El Túnel Tornillo se encuentra colapsado y en proceso proyecto del puente**
- 10 Empleos directos generados**
- 30 Empleos indirectos generados**
- +1 millón 400 mil habitantes beneficiados**
- 2 hrs. de ahorro en tiempo**
- Concesionaria:** Autovía Mitla Tehuantepec, S.A. de C.V. (IDEAL)

* No hay avances debido a la falta de asignación de recursos

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Mitla - Tehuantepec

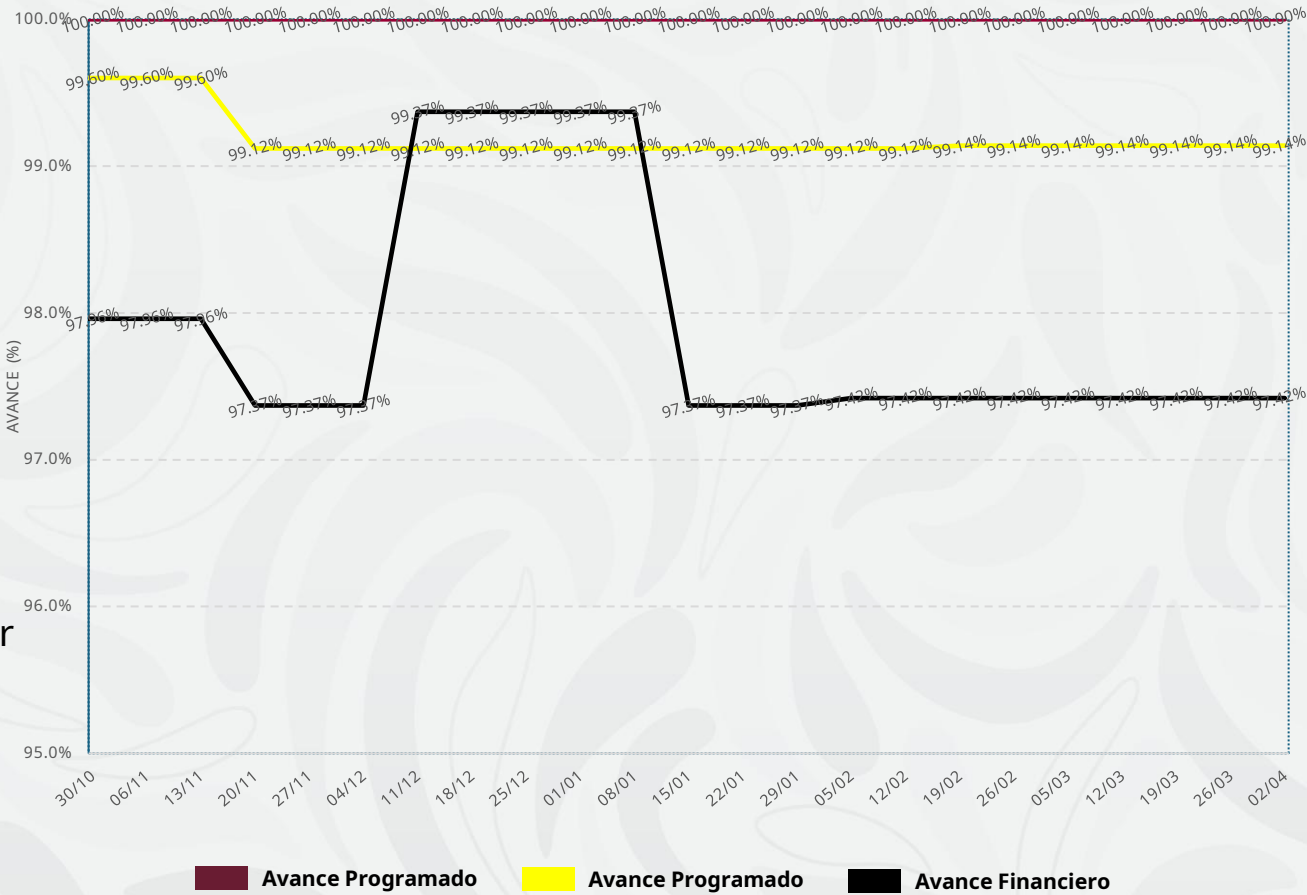

❖ Nota: A partir de esta fecha, ya no existirán avances debido a la considerable deuda que se tiene con las empresas contratadas por la concesionaria a la fecha y la falta de recursos presupuestales.

Maquinaria:

- Excavadora (1) inactivo

	20 de marzo al 26 de marzo de 2026	27 de marzo al 02 de abril de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	10	10
Maquinaria	0	0
Frente de Trabajo	No Aplica	No Aplica
