


# Nayarit

## Tramo Tepic-Compostela

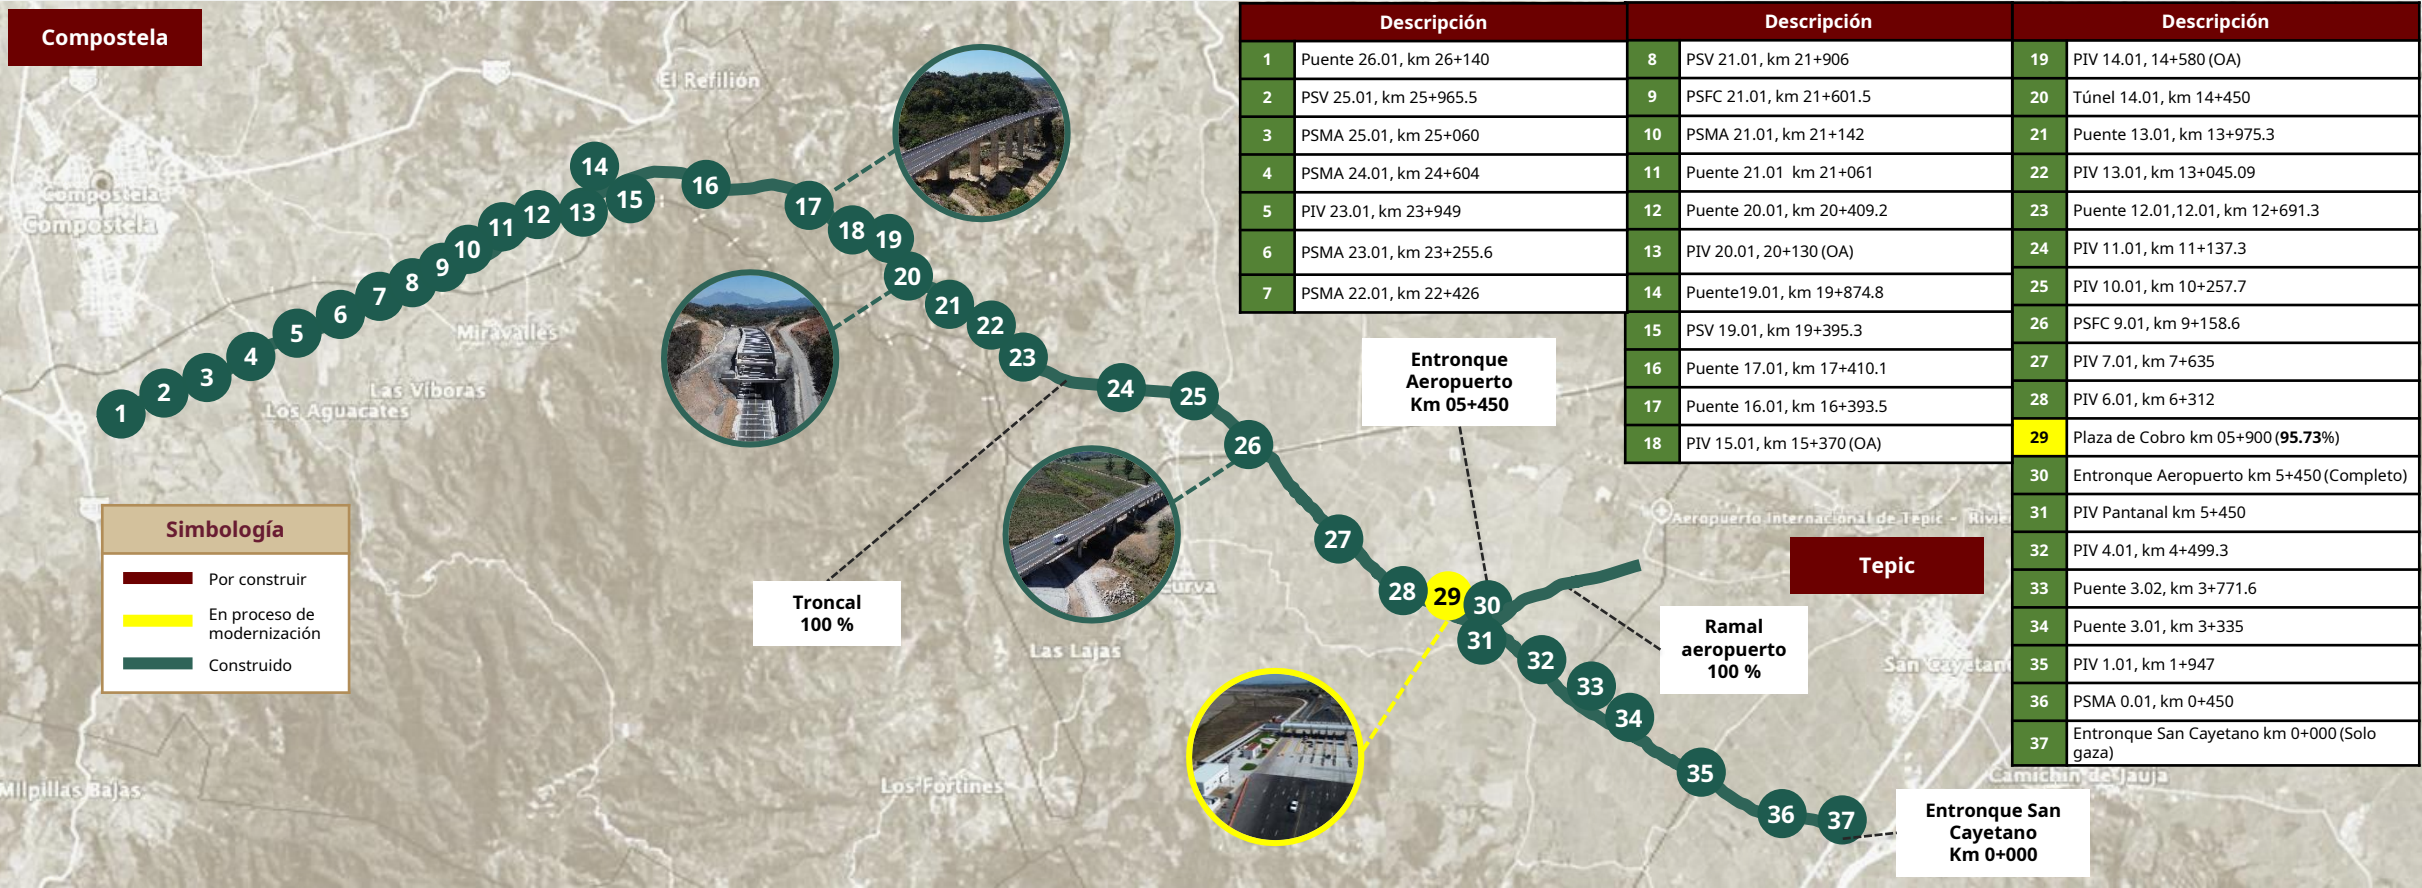

Concesionaria: FONADIN

### Avance físico

- Programado: 100 %
- Real: 99.9989 %
- Financiero: 96.70 %
- Semanal: 0.0003 %



**Inversión:** 2,473.43 mdp (solo troncal y estructuras, no considera Ramal Aeropuerto\*)



**Meta:** 30.17 km. (26 km en troncal y 4.17 en estructuras)  
1 Túnel Falso, 1 Plaza de cobro, 10 Puentes, 2 PSFC, 1 Entronque (solo gaza) y 1 Entronque completo (Aeropuerto) y 21 Cruces (no considera Ramal Aeropuerto\*) y múltiples obras de drenaje.

\* Una vez que se cuente con el monto del Ramal Aeropuerto se actualizará la Inversión y Meta.



**Inicio:** Marzo 2023  
**Término:** Septiembre 2025



**2,473** empleos directos generados P/MDI  
**4,946** empleos indirectos generados P/MDI



**490 mil** habitantes beneficiados




**35 minutos** de ahorro en tiempo

# Nayarit

## Tramo Tepic-Compostela

### Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Tepic- Compostela

| Elemento                              | Meta         | Ejecutado acumulable | Faltante  | 27/03/26 al 02/04/2026 |           | Observaciones        |
|---------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|
|                                       |              |                      |           | Programado             | Ejecutado |                      |
| Terraplén (m3)                        | 2,095,966.26 | 2,095,954.62         | 11.64     |                        |           |                      |
| Subyacente (m³)                       | 290,689.00   | 281,764.49           | 8,924.51  |                        |           |                      |
| Puente 16.01 km 16+393.50             |              |                      |           |                        |           |                      |
| Columnas                              | 8            | 8                    | 0         |                        |           | Trabajos concluidos. |
| Cortes (m³) Estabilización de taludes | 2,443,497.56 | 2,423,372.63         | 20,124.93 |                        |           |                      |
| Obras de drenaje                      | 77           | 77                   | 0         |                        |           | Trabajos concluidos. |
| P.S.F.C. 9.01 km 09+158.50            |              |                      |           |                        |           |                      |
| Losa (claro)                          | 7            | 7                    | 0         |                        |           | Trabajos concluidos. |
| P.S.F.C. 21.01 km 21+601.50           |              |                      |           |                        |           |                      |
| Junta de dilatación (pza)             | 2            | 2                    | 0         |                        |           |                      |

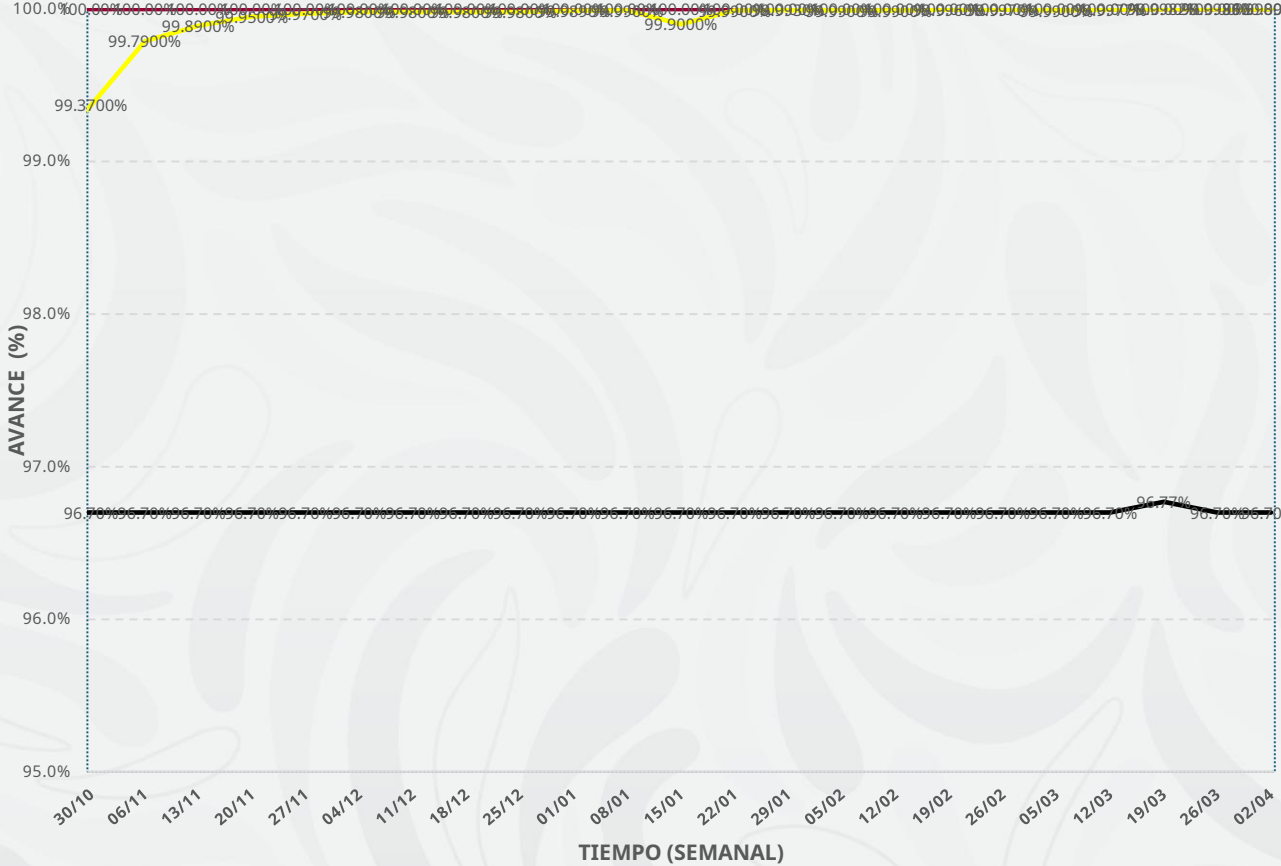

|                              | 20 de marzo al 26 de marzo                 | 27 de marzo al 02 de abril                 |
|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Fuerza de Trabajo (personas) | 85                                         | 85                                         |
| Maquinaria                   | 10                                         | 10                                         |
| Frente de Trabajo            | Ramal Aeropuerto, Plaza de Cobro km 05+900 | Ramal Aeropuerto, Plaza de Cobro km 05+900 |
