

San Luis Potosí

La Pitahaya-Libramiento Oriente de S.L.P. y el Ramal Villa de Reyes

Avance físico • Programado: **9.68%**
• Real: **6.38%**

Avance financiero: **7.21%**

Inversión: 8,331.12 mdp.
Incluye I.V.A.


Inicio: julio 2024
Término: 14 de febrero 2028

Meta: 68.5 km. + 2.4 Km del Ramal
79 Estructuras; Puentes, PSV'S,
PSFCC, PIV'S.
1 Plaza de Cobro, 5 Entronques,
165 ODT'S.

2000 Empleos directos generados
600 Empleos indirectos generados

128 000 habitantes beneficiados

20 minutos de ahorro en tiempo

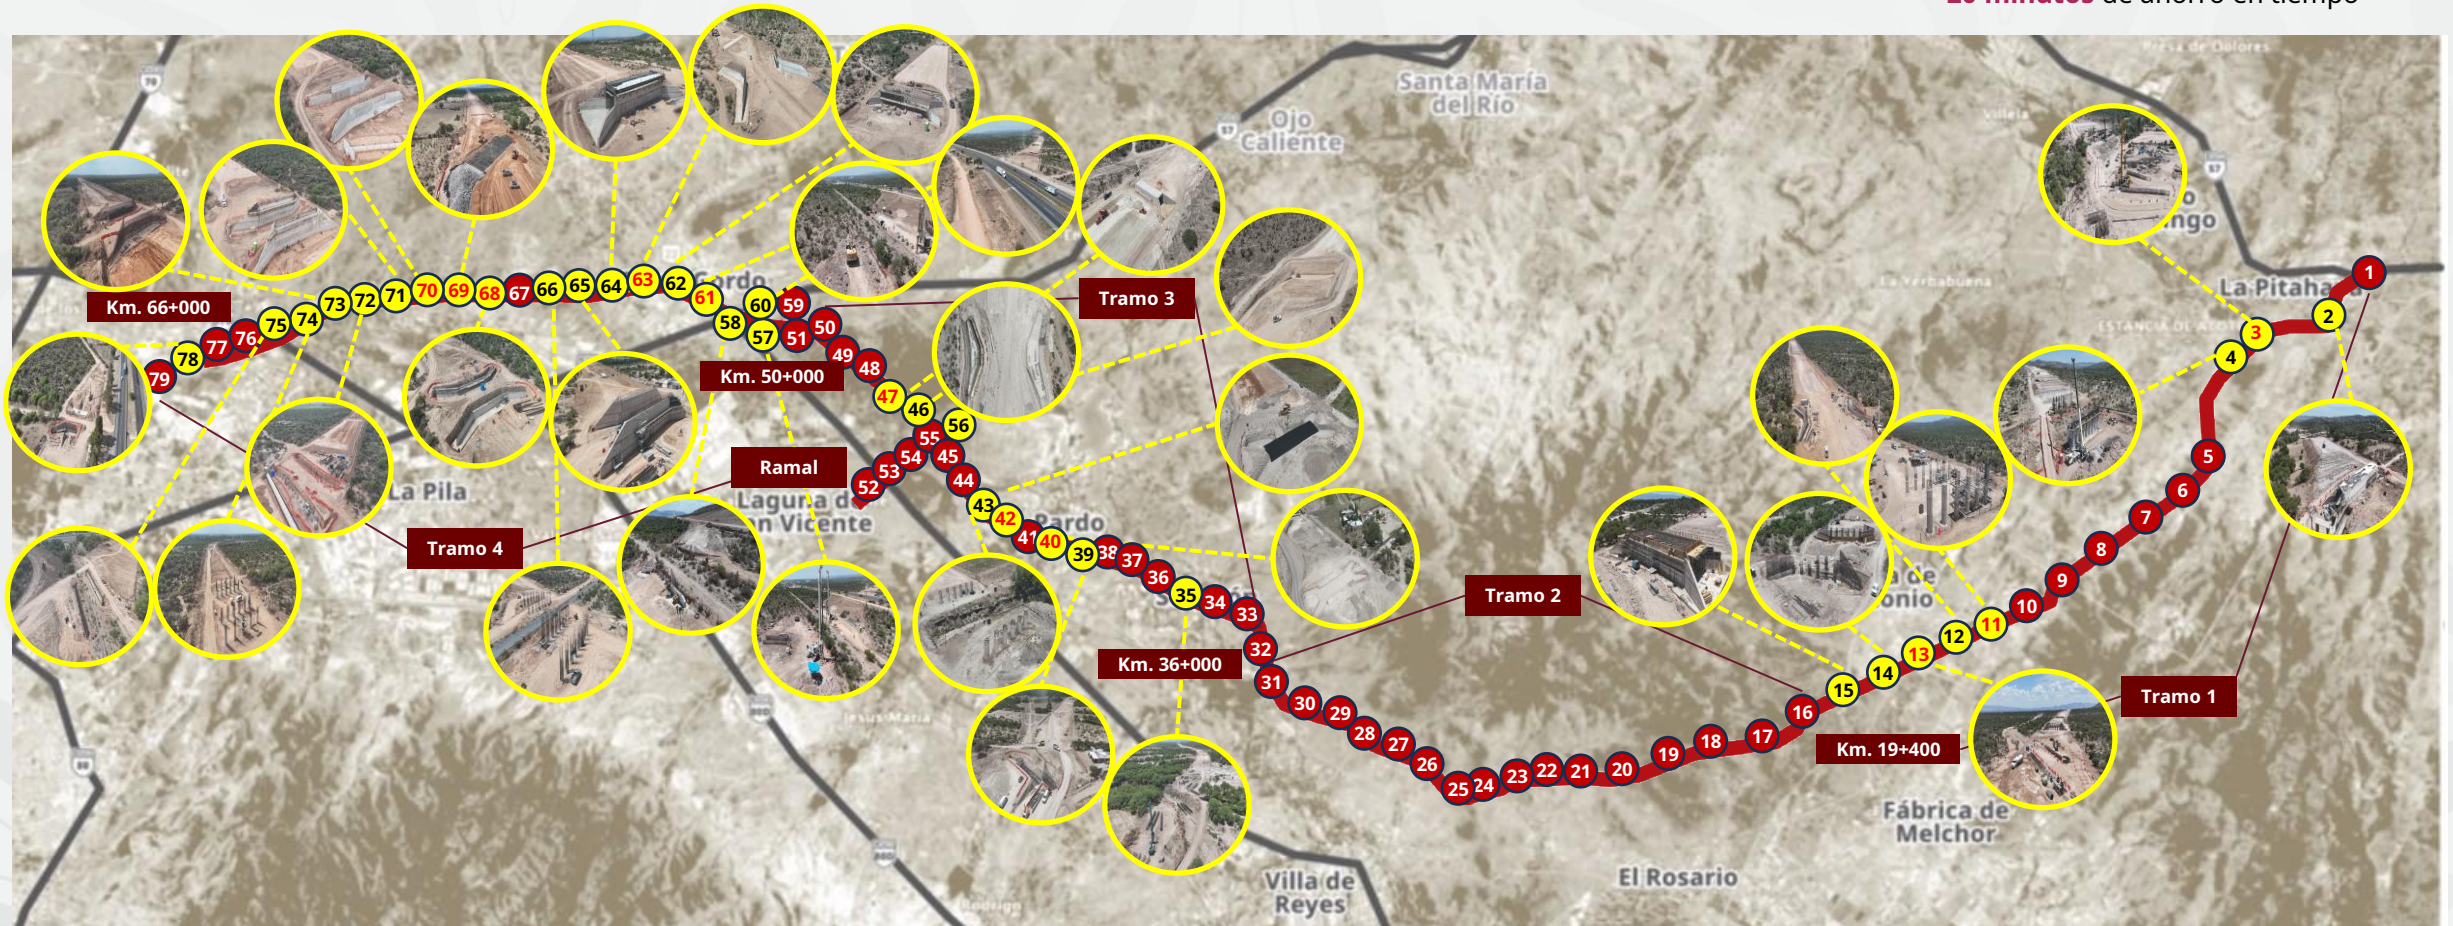

Estructuras Proyectadas por Tramo

Tramo 1

Descripción	Descripción	Descripción
1 Ent. La Pitahaya Km. 0+500	7 PSFFCC Km. 12+780	13 Ducto Km. 18+426 36.00%
2 PSV Km. 2+096.73 85.00%	8 PIV Km. 12+930	14 Puente Km.18+610 46.00%
3 Puente Km. 2+481 5.00%	9 PSV Km. 14+043	15 Dob Ca Km. 18+820 83.00%
4 Ducto Km. 2+680 47.00%	10 PIV Km. 14+810	
5 PIV Km. 9+289.75	11 PSFFCC Km. 16+250 6.80%	
6 Ducto Km. 10+853	12 PIV Km. 17+530 36.00%	

Tramo 2

Descripción	Descripción	Descripción
16 PSG Km.121+870	22 Ducto Km. 129+005	28 Puente Km. 134+662
17 PSV Km. 123+453	23 PSV Km. 130+725	29 PSG Km. 135+950
18 Puente Km. 123+608	24 PSG Km. 131+530	30 PIV Km. 137+310
19 PSV Km. 126+360	25 PSV Km. 132+820	31 Puente Carranco Km. 137+820
20 PSV Km. 128+210	26 Ducto Km. 134+020	
21 Puente Km. 128+420	27 PSV Km. 134+604	

Estructuras Sin Actividad

3 Puente Km. 2+481 5.00% (se movió la fuerza de trabajo)	61 Ec Carr. 57 Km.51+800 0.01% (la fuerza de trabajo se movió a otro actividad)
11 PSFFCC Km. 16+250 6.80% (se movió la fuerza de trabajo)	63 PIV Km. 53+150.26 46.60% (la fuerza de trabajo se movió a otro actividad)
13 Ducto Km. 18+426 36.00% (se movió la fuerza de trabajo)	64 PSV Km. 54+424.37 84.20% (se movió la fuerza de trabajo)
40 PSG Km. 41+981.48 3.00% (en espera del suministro de acero)	68 PSV Km. 58+505 39.40% (se movió la fuerza de trabajo)
42 PSG Km. 42+650 1.00% (la fuerza de trabajo se movió a otro actividad)	69 PSV Km. 59+030 2.01% (se esta revisando unas filtraciones)
47 PSG Km. 45+380 91.50% (se movió la fuerza de trabajo)	70 PSV Km. 60+5.79 39.00% (pendiente de autorizar libranza de postes de CFE)

Tramo 3

Descripción	Descripción	Descripción
32 PIV Km. 36+719.53	41 PSV Km. 42+386	50 PIV Km. 49+120
33 PIV Km. 37+739.99	42 PSG Km. 42+650 1.00%	51 PIV Km. 49+900
34 PSV Km. 38+242.30	43 Puente Km. 42+990 19.65%	52 E.c. Car 37 PSV Km. 16+540
35 Puente Altamira Km. 39+520 9.40%	44 PSV Km. 43+456.78	53 PSV Km. 17+040
36 PSG Km. 39+750	45 PSV Km. 43+577.34	54 PSV Km. 17+610
37 PIV Km. 40+349.53	46 PIV Km. 44+243.13 14.80%	55 PIV Km. 18+365
38 PIV Km. 41+119.44	47 PSG Km. 45+380 91.50%	56 Ec.IndPSVKm18+700 5.20%
39 Ducto Km. 41+532.47 5.40%	48 Ducto Km. 45+517	
40 PSG Km. 41+981.48 3.00%	49 PSG Km. 46+930	


Tramo 4

Descripción	Descripción	Descripción
57 Ducto Km. 51+500 17.36%	66 PSV Km. 55+407 19.40%	75 Ducto Km. 65+791.31 45.29%
58 Ducto Km. 10+333 62.50%	67 PIV Km. 56+354.38	76 Ec Lib Ote Km. 66+000
59 PSV Km. 10+500	68 PSV Km. 58+505 39.40%	77 PSV Km. 66+441.21
60 Ducto 20+580 22.80%	69 PSV Km. 59+030 2.01%	78 PSV Km. 66+449.24 14.28%
61 Ec Carr. 57 Km.51+800 0.02%	70 PSV Km. 60+579.85 39.00%	79 PSV Km. 1+412
62 PSG Km. 52+190 36.20%	71 PSV Km. 61+561.78 68.31%	
63 PIV Km. 53+150.26 46.60%	72 PSV Km. 62+398.36 23.90%	
64 PSV Km. 54+424.37 84.20%	73 PSV Km. 63+517.92 46.70%	
65 PSV Km. 54+952.42 77.72%	74 PSV Km. 64+800 34.90%	

Simbología

	Por construir
	En proceso de construcción
	Concluido

Volúmenes de obra				
Tramo I km. 0+000 al Km. 19+400 Tramo III Km. 36+000 al Km. 50+000 Tramo IV km. 50+000 al Km. 66+000				
Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	Ejecutado
Terracerías				
Desmonte, cualquiera que sea su tipo y características en carreteras, sin trasplante,	388.22	269.88	118.34	3.32
Despalme de espesor variable en corte y terraplén, el material producto	733,873.06	335,934.70	397,938.36	716.05
Excavaciones en cortes y adicionales debajo de la subrasante, cualquiera que sea su	2,860,090.52	294,380.57	2,565,709.95	2,241.62
Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de	3,858,592.51	331,243.68	3,527,348.83	
Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de	3,710,618.07	505,186.75	3,205,431.32	44,461.41
Formación y compactación de terraplenes utilizando materiales compactables	330,950.70	41,080.97	289,869.73	6,943.72
Formación y compactación de terraplenes utilizando materiales compactables	1,570,694.98	10,687.90	1,560,007.08	
Obras de Drenaje				
Excavación para estructuras u obras de drenaje, cualquiera que sea su clasificación, con una	53,714.94	4,605.27	49,109.67	126.62
Plantilla de material Granular, P.U.O.T	5,780.69	307.84	5,472.85	13.48
Arrope y Relleno con material de calidad de subrasante, compactado al 95% de la	74,713.07	6,763.64	67,949.43	106.60
Alcantarilla de concreto reforzado de f'c = 280 kg/cm2, en dirección normal de 152 cm	7,394.04	611.95	6,782.09	
Concreto hidráulico de f'c= 100 kg/cm2 en plantilla, por unidad de obra terminada.	1,399.10	368.07	1,031.03	20.02
Concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2, por unidad de obra terminada.	3,314.74	2,639.12	675.62	89.67
Concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 en losa, por unidad de obra terminada.	13,274.04	484.44	12,789.60	41.01
Acero para concreto hidráulico con límite elástico igual o mayor de fy = 4200 kg/cm2	356,544.18	117,878.85	238,665.33	449.72
Malla electrosoldada 6x6 10-10, P.U.O.T	2,330.47	947.01	1,383.46	203.29
Entronques				
Terracerías				
Despalme de espesor variable en corte y terraplén, el material producto del	61,394.70	z44,763.20	16,631.50	
Excavaciones en cortes y adicionales debajo de la subrasante, cualquiera que sea su	848,439.10	175,355.96	673,083.14	
Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de	325,337.10	62,616.17	262,720.93	1,199.14
Formación y compactación de terraplenes utilizando materiales compactables	68,896.40	896.08	68,000.32	448.04

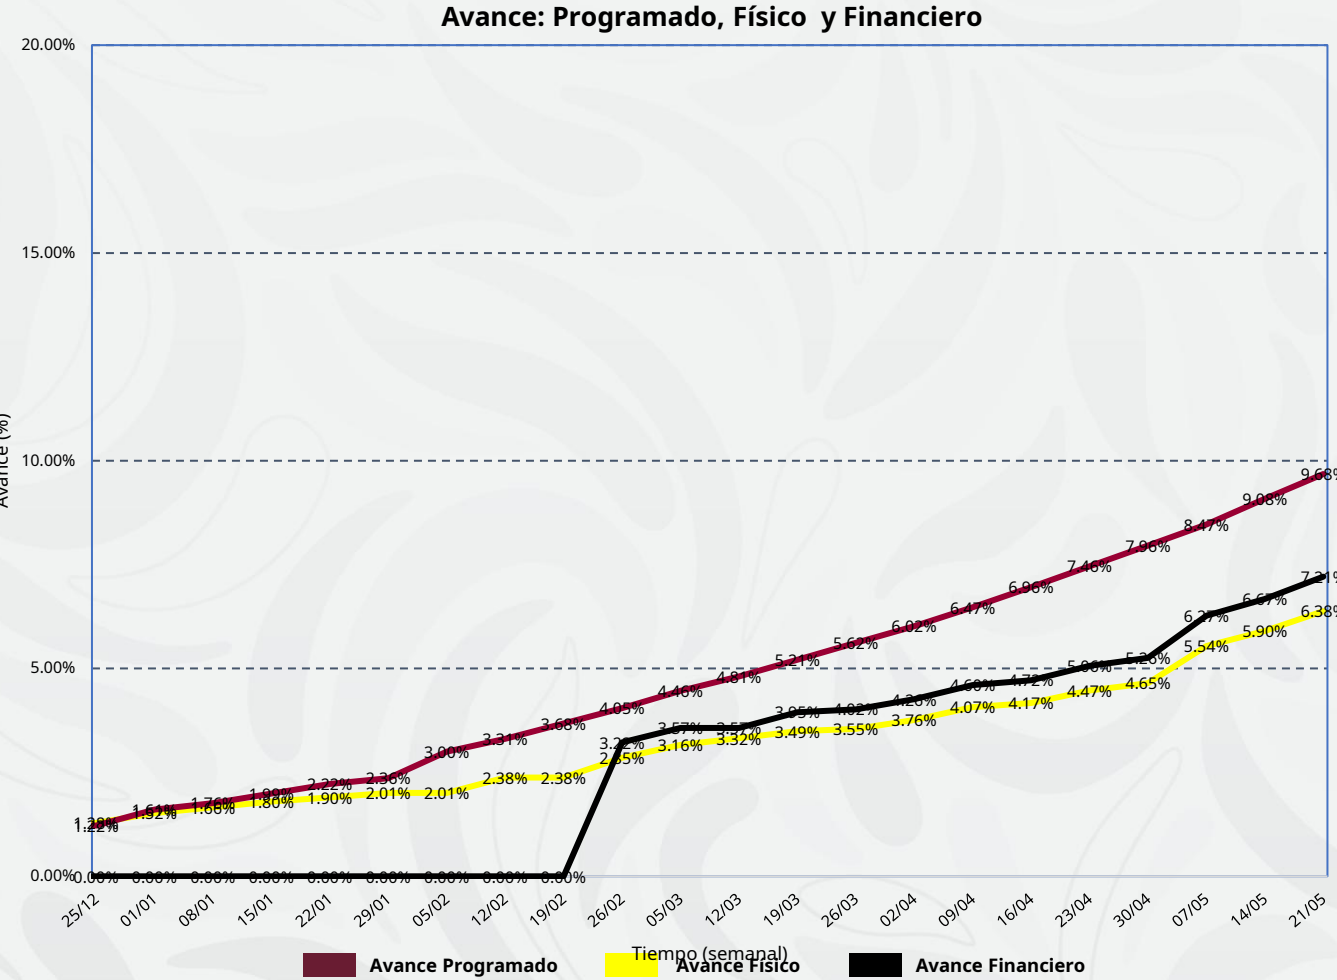

	Del 08 de mayo a 14 de mayo de 2026	Del 15 de mayo a 21 de mayo de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	709	801
Maquinaria	179	166
Frente de Trabajo	Tramo 1/Tramo 3/Tramo 4	Tramo 1/Tramo 3/Tramo 4
