


Jalisco

Ampliación Libramiento Lagos de Moreno

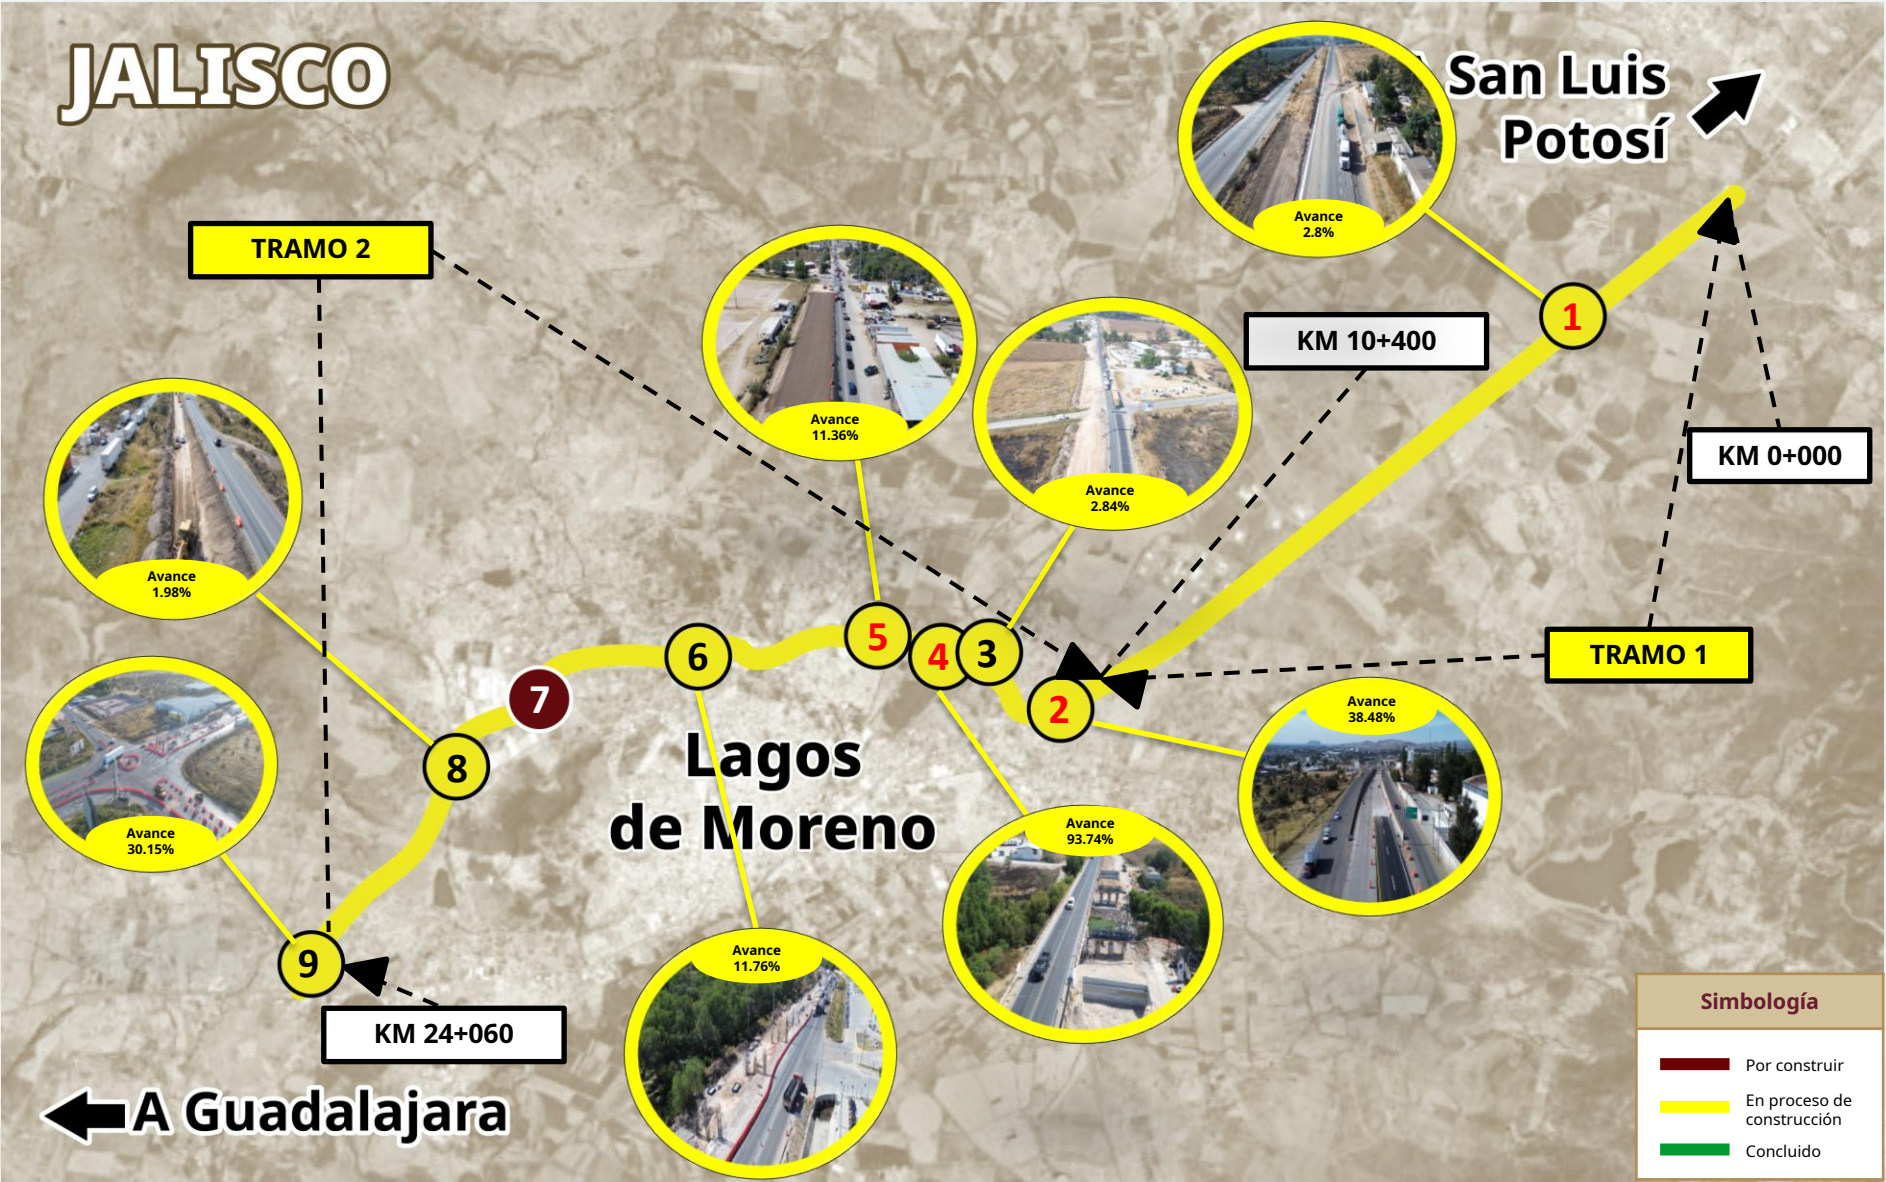


Descripción	
1	PIV con entronque "El Maguey" km 1+300 - Avance 2.8% . Problemas de DDV. (Modificación de proyecto).
2	Entronque a desnivel Lagos de Moreno Este km 11+800 (adecuación)- Avance 38.48% (se movió la fuerza de trabajo)
3	PIV con entronque "Fracc. Andalucía" km 12+120 Avance 2.84% .
4	Puente km 12+450 "Río Lagos"- Avance 93.74% . (se movió la fuerza de trabajo)
5	PIV con entronque "Sepúlveda" km 13+620 Avance 11.36% . (se movió la fuerza de trabajo)
6	PSV con entronque "DRÄXLMAIER" km 15+900 Avance 11.76%
7	PIV con entronque "Encarnación" km 18+200
8	PSFC con retornos km 19+860 Avance 1.98%
9	PIV con entronque Tipo Glorieta "Lagos de Moreno Oeste" km 23+920 Avance 30.15% .

Jalisco

Ampliación Libramiento Lagos de Moreno

TRAMO 2 - AVANCE TRONCAL Y ENTRONQUES							
Concepto	Unidad	Total	Ejecutado	Faltante	15/05/26 al 21/05/26		Observaciones
					Programado	Ejecutado	
Terracerías Troncal	%	100%	58.16%	41.84%	0.021%	0.14%	En proceso
Pavimentos Troncal	%	100%	22.4%	77.60%	0.040%	0.20%	En proceso
Obras Inducidas	%	100%	38.43%	61.57%	0.050%	1.35%	En proceso
Entronque 23+920	%	100%	30.15%	69.85%	0.13%	2.12%	En proceso
Entronque km 15+900	%	100%	11.76%	88.24%	0.00%	1.287%	En proceso

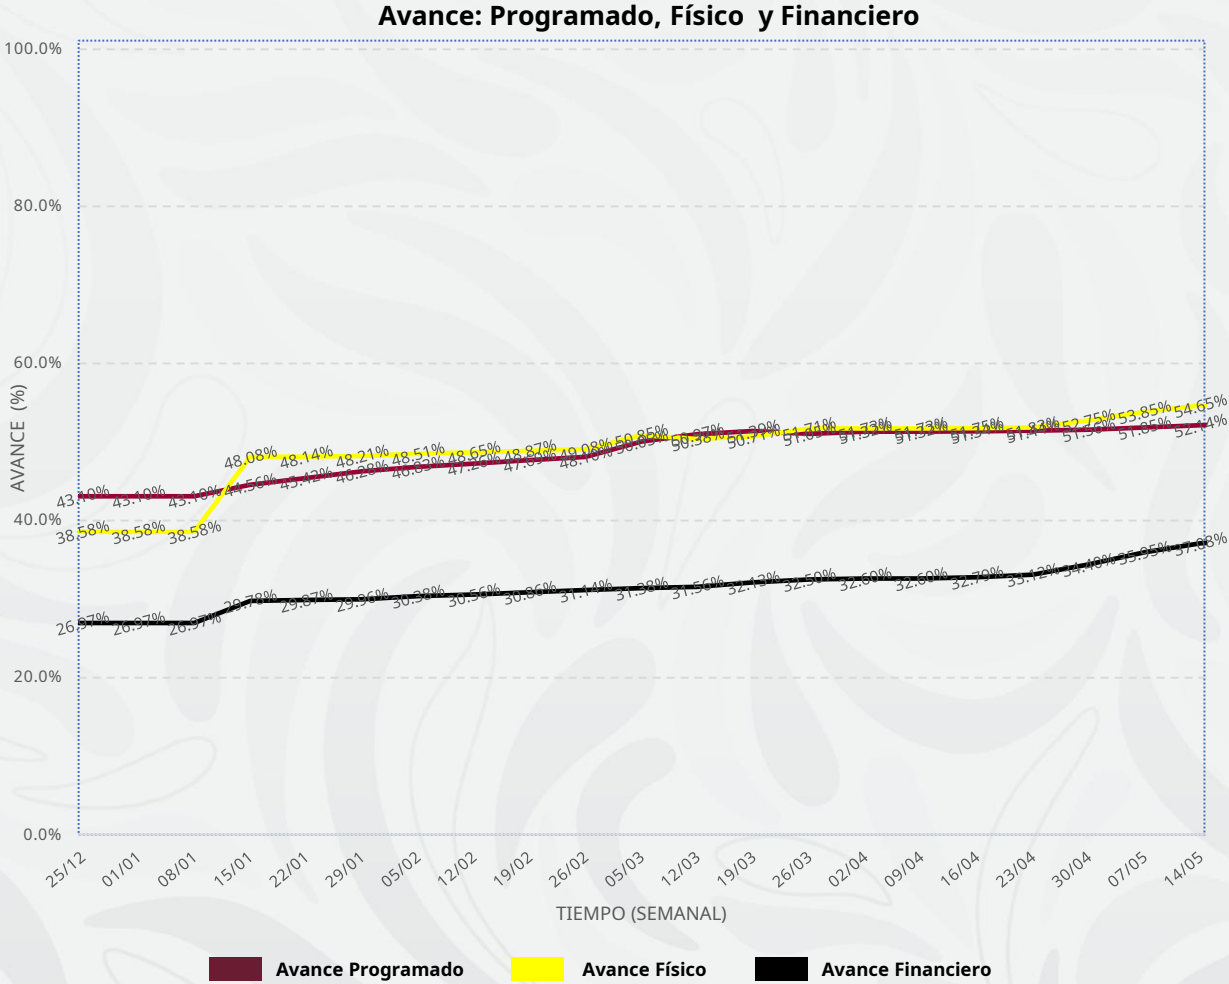

	08 al 14 de mayo 2026	15 al 21 de mayo 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	246	246
Maquinaria	69	69
