

Oaxaca

Mitla-Entronque Tehuantepec II


Avance físico Global:

- Programado: 100%
- Real: 99.15%
- Semanal: 0.00%

Avance físico Tramo 2: • Real: 97.44%

Avance financiero

- Real pagado: 88.56%
- Con deuda: 97.44%
- Nota: De este porcentaje se tiene una deuda de 2,635.1 mdp incluye IVA, por trabajos ejecutados.

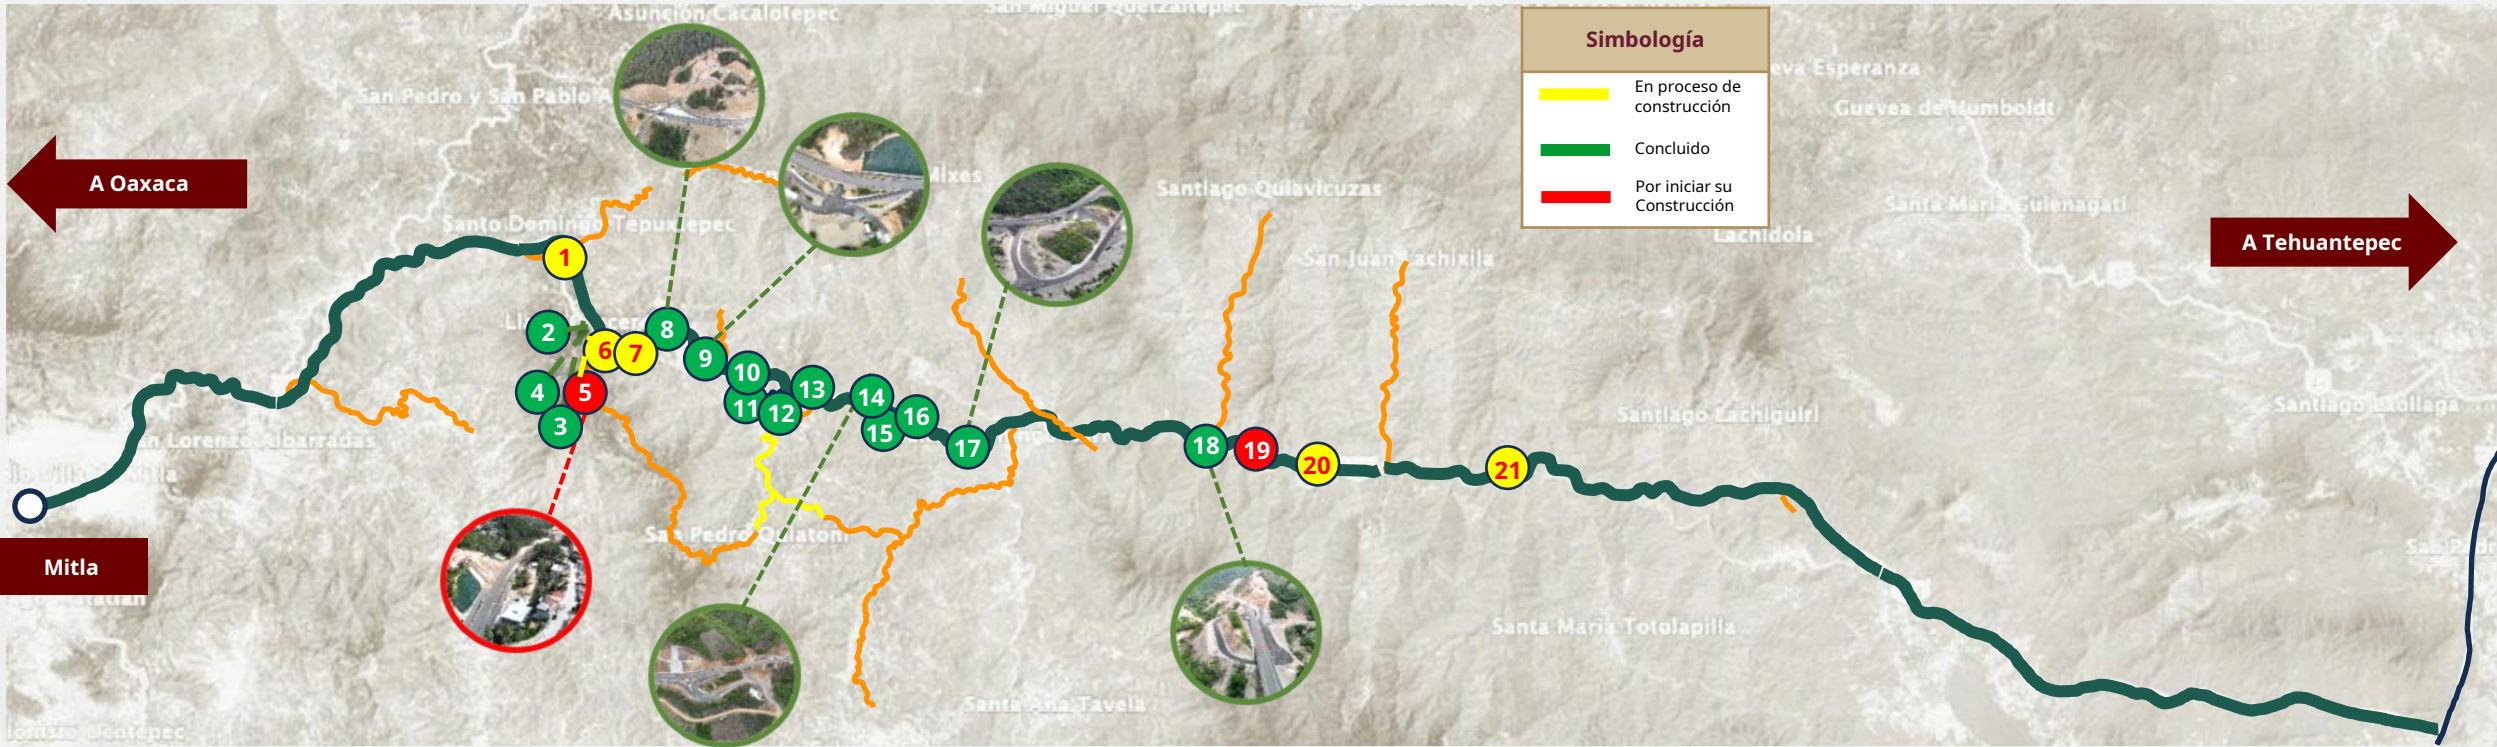

Descripción	
1	PIV km 87+900. 40% *
2	PIV km 91+530.
3	PIPR km 92+436.
4	PIV km 92+438.
5	PIV km 92+680. 0% *
6	Entronque Llano Crucero km 92+690. 82% *
7	Muro de pilas km 92+700. 32% *

Descripción	
8	Entronque Llano Laguna km 98+200.
9	Entronque Cerro Pascale km 100+500.
10	PIV km 106+570.
11	PIV km 108+570.
12	PIV km 109+247.
13	PIV km 110+460.
14	Entronque Danigare km 111+600.

Descripción	
15	PIV km 112+270.
16	PIV km 114+766.
17	Entronque Agua Blanca Km 122+600.
18	Entronque Quiaviczuz Km 137+900.
19	Túnel El Tornillo km 139+400 (Colapsado). En elaboración proyecto del puente.
20	PIPG Km 146+840. 95% *
21	PIPG km159+400. 95% *

-  **Inversión:** 29,749.2 mdp incluye I.V.A sin incluir reclamos
-  **Término:** Inaugurada y puesta en operación 24 de enero de 2025 (pendiente obras complementarias)

-  **Meta:**169.23 km; el cual son 159.29 km de Troncal, 6.54 km de puentes, 1.78 km de viaductos y 1.62 km de túneles.
65 puentes, 14 viaductos, 10 túneles, 20 entronques, 2 casetas y 17 pasos de servidumbre.
En proceso: Trabajos en la troncal, 1 entronque y 8 pasos de servidumbre
-  **Nota:** De los pasos de servidumbre 9 están terminados, 2 con un 95%, 1 al 40% y 5 sin iniciar
-  **El Túnel Tornillo se encuentra colapsado y en proceso proyecto del puente**

-  **10 Empleos directos generados**
30 Empleos indirectos generados
-  **+1 millón 400 mil habitantes beneficiados**
-  **2 hrs. de ahorro en tiempo**
- Concesionaria:** Autovía Mitla Tehuantepec, S.A. de C.V. (IDEAL)

* No hay avances debido a la falta de asignación de recursos

Oaxaca


Mitla-Entronque Tehuantepec II

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	15/05/26 al 21/05/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Muro de pilas km 92+700						
Perforación de pilastrones	38	17	21	0	0	• Trabajos suspendidos por falta de asignación de recursos.
Armado y colado de pilastrones	38	17	21	0	0	

❖ Nota: A partir de esta fecha, ya no existirán avances debido a la considerable deuda que se tiene con las empresas contratadas por la concesionaria a la fecha y la falta de recursos presupuestales.

Maquinaria:

- Excavadora (1) inactivo

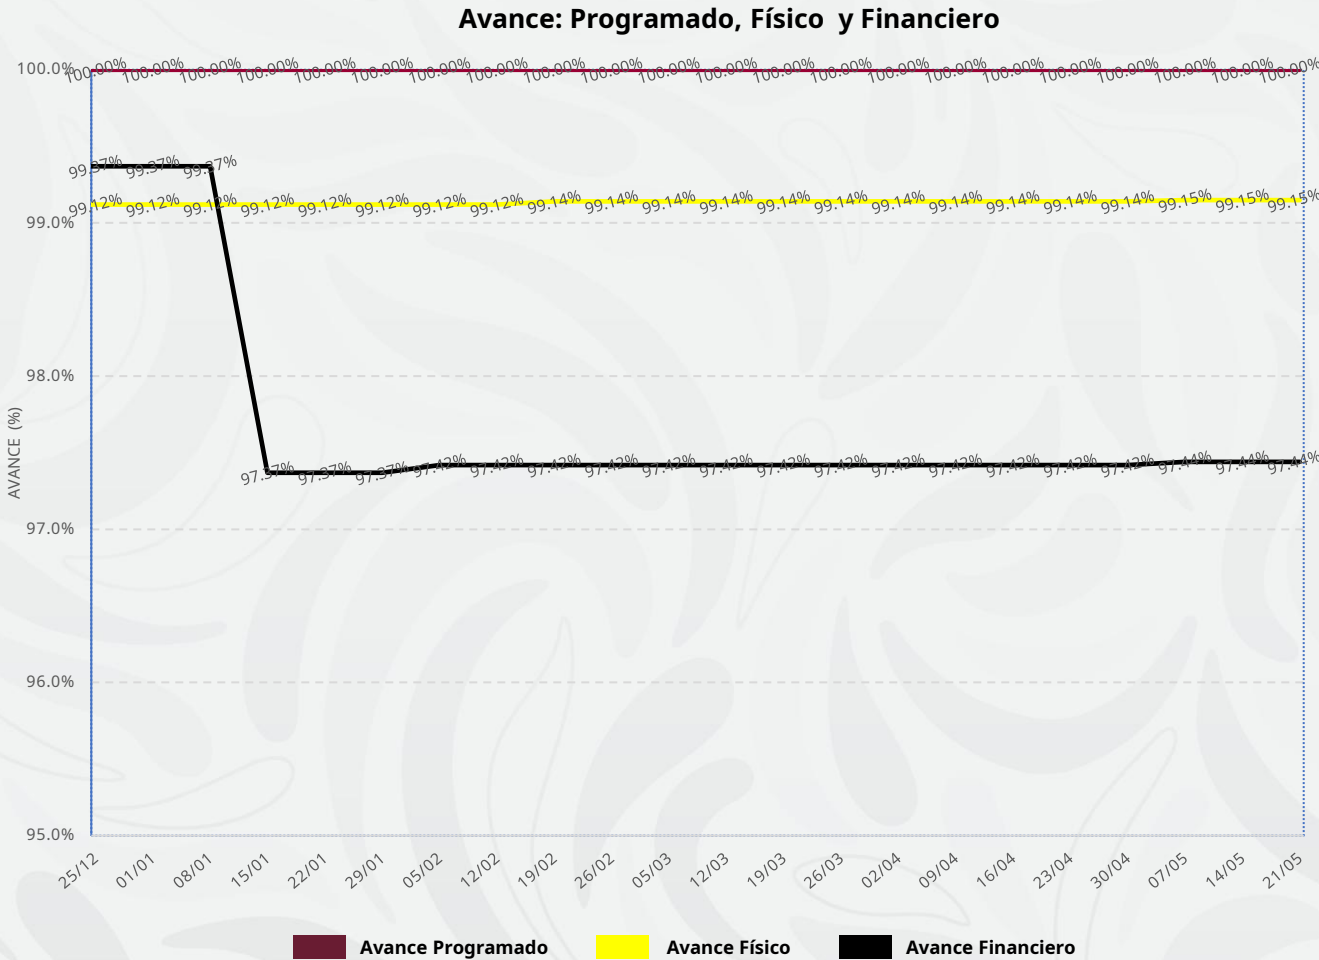

	08 de mayo al 14 de mayo de 2026	15 de mayo al 21 de mayo de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	50	50
Maquinaria	0	0
Frente de Trabajo	No Aplica	No Aplica

Autopista Mitla – Entronque Tehuantepec II

Puente El Tornillo, km 139+400

Estado de Oaxaca

Monto Estimado de la Obra

- **1,250 mdp** – incluye IVA. Ora y supervisión – (Cifra de inversión que tendrá cambios derivados del proceso licitatorio).

Características Geométricas

- Longitud a intervenir: **1,270 m.**
- Longitud del puente: **670.09 m.**
- 17 ejes de apoyo: claros de 40 m a 50 m.
- Ancho total: **13.06 m.**
- Ancho de corona: **12.00 m.**
- Altura de pilas: de **10.82 m a 47.33 m** en el eje 15.
- Pendiente longitudinal: **-0.5%.**

Avances

- **Estudios preliminares** (levantamiento detallado de la zona) y **Estudios para proyecto ejecutivo** (Geofísico, geológico, laboratorio, hidráulico e hidrológico): Concluidos al 100%.
- **Proyecto ejecutivo:** Concluido al 100%.

Trabajos por Ejecutar

- La Concesionaria ha recibido propuestas técnicas y económicas, se encuentran en evaluación conjunta SICT – Concesionaria.
- Derecho de Vía: **En proceso de avalúo.**
- Inicio de Obra: **11 de mayo 2026** (estimado)

