

# Michoacán

## Uruapan-Nueva Italia


Avance físico

• Programado: 24.13 %

• Real: 23.68 %

• Semanal: 0.60 %

• Financiero: 19.10%

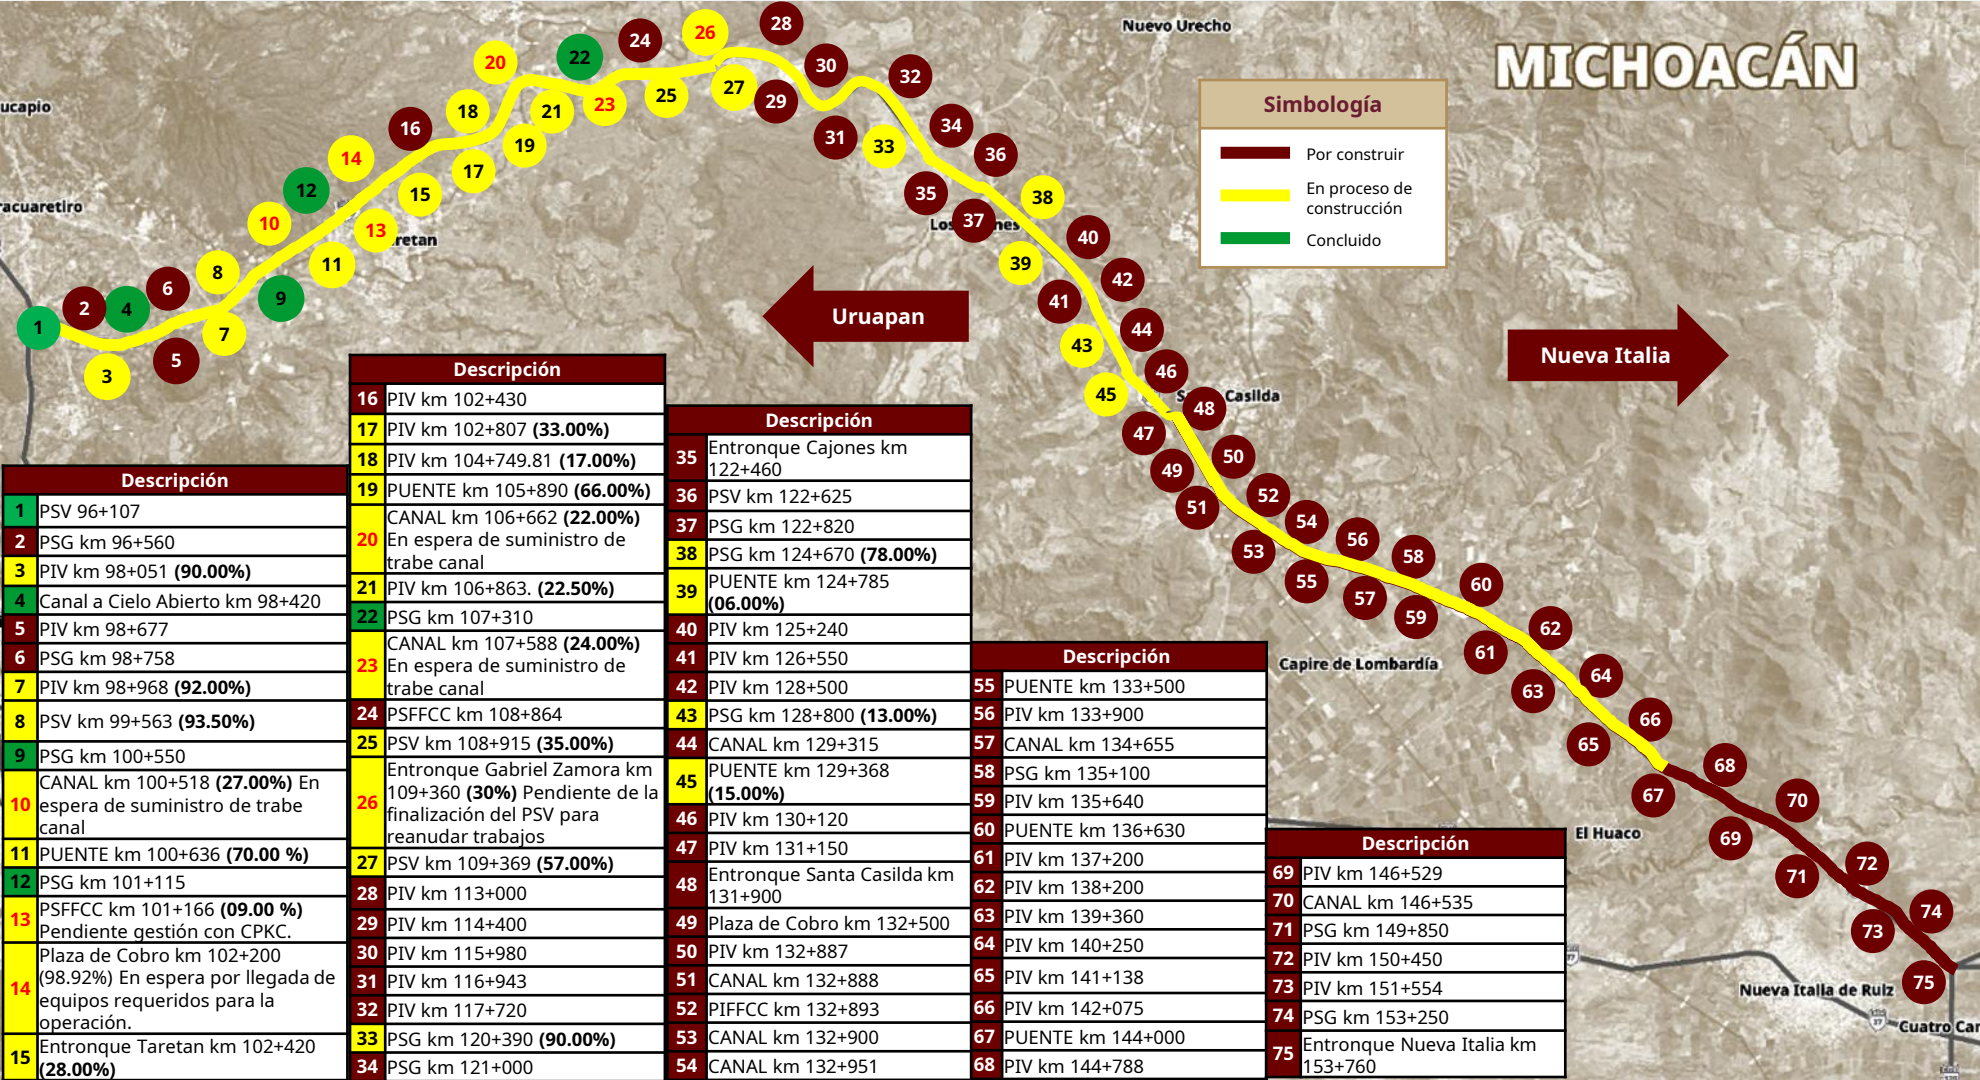


-  **Inversión: 7,049.9 mdp**
-  **Inicio:** noviembre de 2023  
**Término:** agosto de 2027
-  **Meta: 67.09 km**  
65.00 km (troncal)  
2.09 km (estructuras)  
2 Plazas de Cobro, 7 puentes, 5 Entronques, 60 cruces (5 PSV's, 30 PIV's, 13 PSG's, 1 PIFFCC, 2 PSFFCC, 9 trabes canales), 1 canal a cielo abierto (cien fuegos) y múltiples obras de drenaje.
-  **21,147** empleos generados  
**7,049** empleos directos  
**14,098** empleos indirectos
-  **1,800,000** habitantes beneficiados
-  **25 minutos** de ahorro en tiempo
- Concesionaria : PINFRA.**

# Michoacán

## Uruapan-Nueva Italia

| Elemento                          | Meta  | Ejecutado acumulable | Faltante | 14/05/2026 al 21/05/2026 |           | Observaciones                                                                                      |
|-----------------------------------|-------|----------------------|----------|--------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |       |                      |          | Programado               | Ejecutado |                                                                                                    |
| Carpeta Asfáltica                 | 65 km | 10.50 km             | 54.50 km | .200 km                  | .200 km   |                                                                                                    |
| Base Asfáltica                    | 65 km | 12.40 km             | 52.60 km | .200 km                  | .200 km   |                                                                                                    |
| Base Hidráulica                   | 65 km | 13.90 km             | 51.10 km | .300 km                  | .300 km   |                                                                                                    |
| Subbase                           | 65 km | 15.80 km             | 49.20 km | .300 km                  | .300 km   |                                                                                                    |
| Subyacente                        | 65 km | 19.00 km             | 46.00 km | .400 km                  | .400 km   |                                                                                                    |
| PIV Km 98+051 Parapetos           | 2     | 0                    | 2        | 2                        | 2         | Aplicación de pintura en parapetos metálicos                                                       |
| PIV Km 98+968 Accesos             | 2     | 0                    | 2        | 1                        | 1         | Colado de concreto ciclópeo para dentellón en acceso C1.                                           |
| Puente Km 100+636 Accesos         | 2     | 0                    | 2        | 1                        | 1         | Suministro y colocación de material de banco para conformación de muro mecánicamente estabilizado. |
| PIV Km 102+804 Superestructura    | 6     | 3                    | 3        | 3                        | 3         | Maniobra de montaje para trabes de concreto                                                        |
| Puente Km 105+890 Superestructura | 1     | 0                    | 1        | 1                        | 1         | Armado de acero de refuerzo para losa claro 2-3.                                                   |
| PIV Km 106+863 Subestructura      | 1     | 0                    | 1        | 1                        | 1         | Colado de concreto hidráulico para cabezal en apoyo #2                                             |

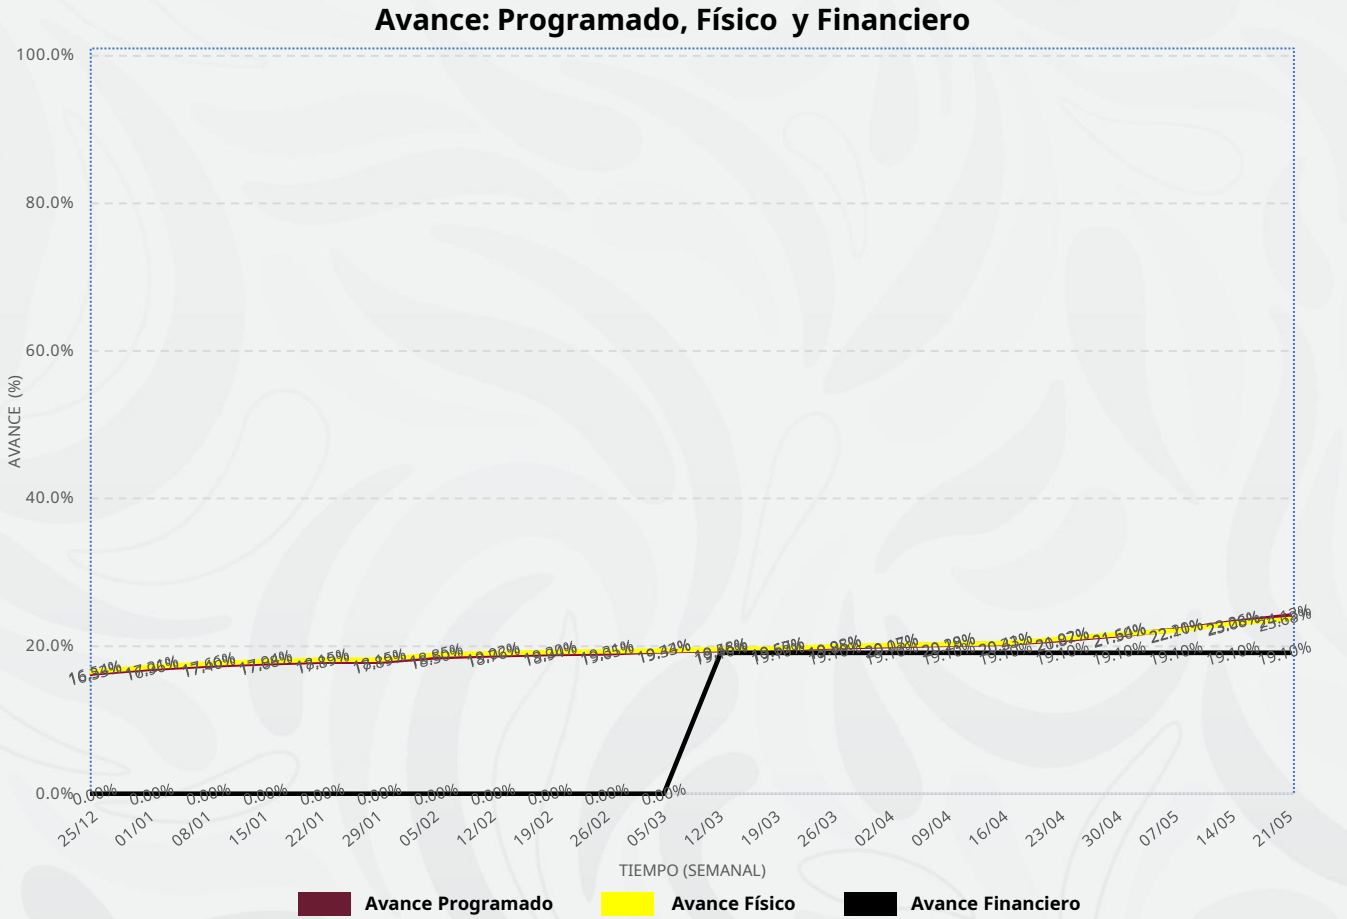

|                              | Del 07 de mayo al 14 de mayo de 2026.                                                                                                                                                                                                   | Del 14 de mayo al 21 de mayo de 2026.                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fuerza de Trabajo (personas) | 805                                                                                                                                                                                                                                     | 805                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maquinaria                   | 255                                                                                                                                                                                                                                     | 255                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frente de Trabajo            | Troncal del km 95+000 al km 140+000, PIV km 98+051, PIV km 98+968, PSG km 100+550, PSG km 101+115, Entronque Taretan km 102+140, Puente km 105+890, PSG km 107+310, Entronque Gabriel Zamora km 109+360, PSV km 109+369, PSG km 120+390 | Troncal del km 95+000 al km 140+000, PIV km 98+051, PIV km 98+968, PSG km 100+550, PSG km 101+115, Entronque Taretan km 102+140, Puente km 105+890, PSG km 107+310, Entronque Gabriel Zamora km 109+360, PSV km 109+369, PSG km 120+390, PSG km 124+670 |
