


Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

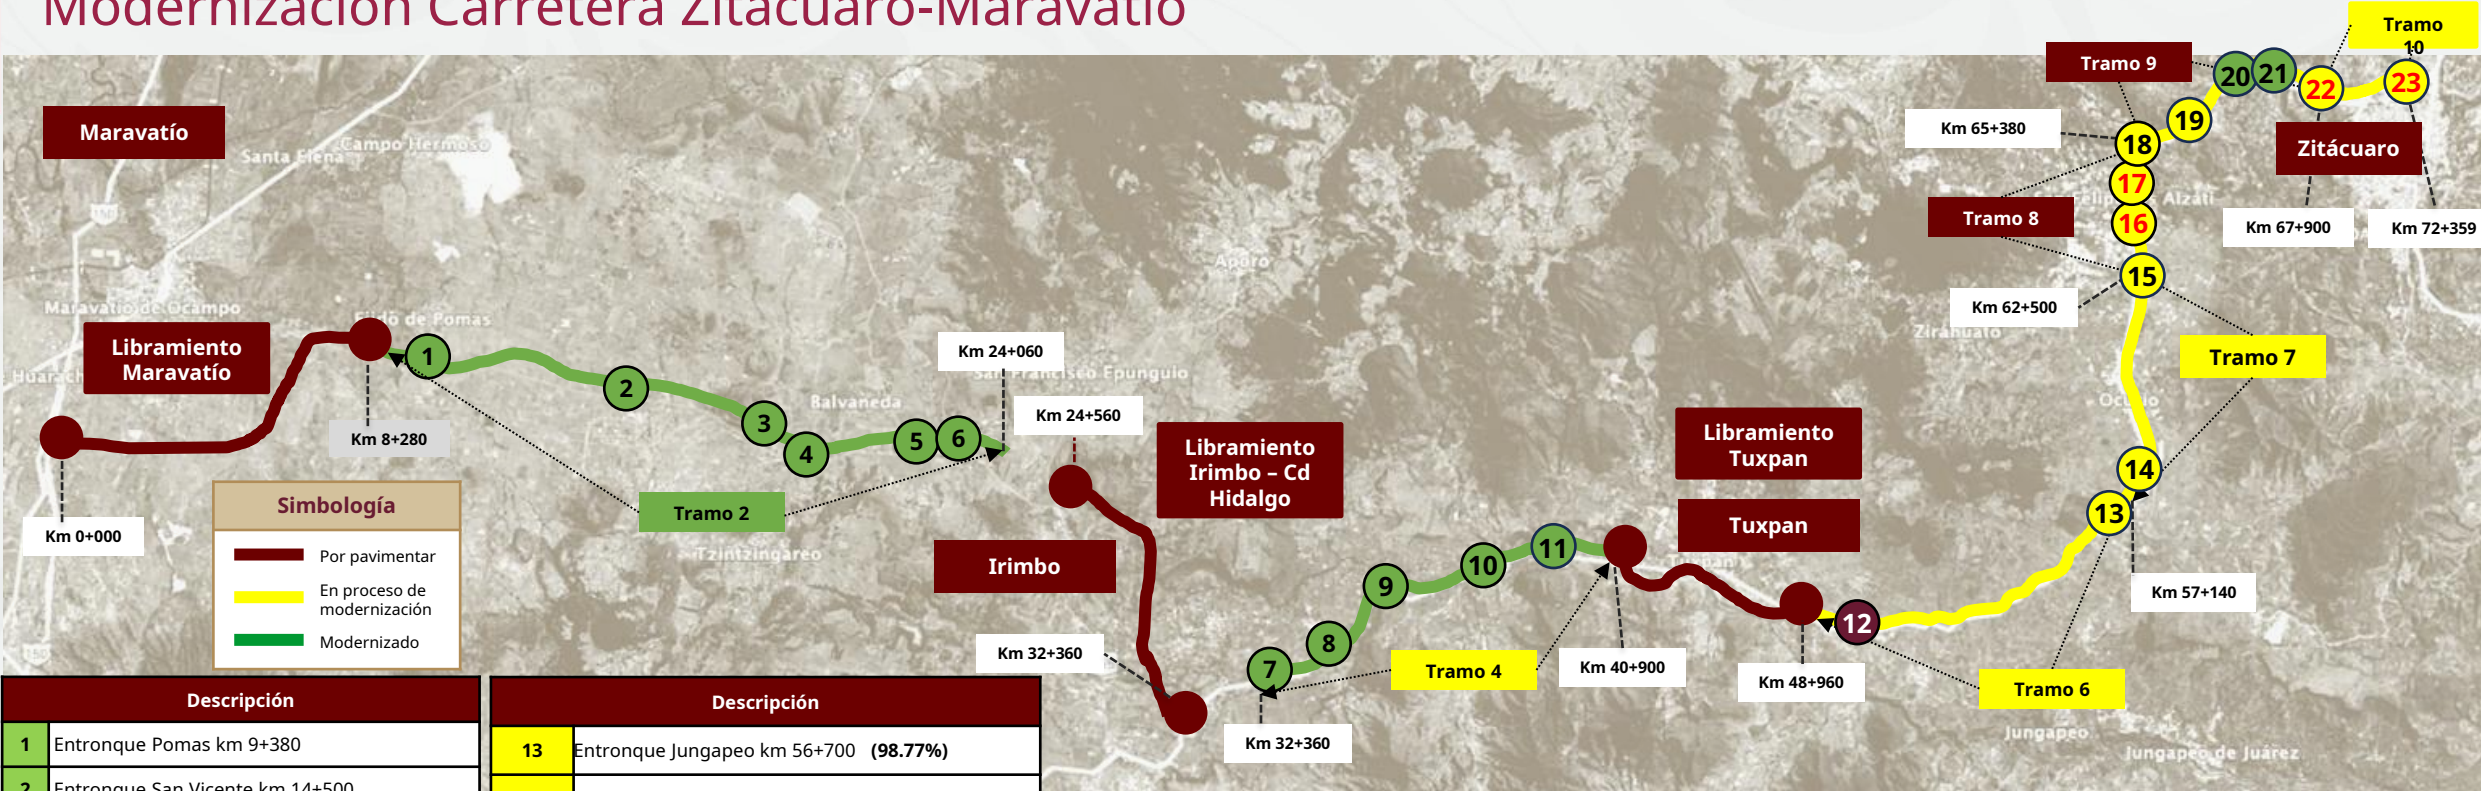

Descripción		Descripción	
1	Entronque Pomas km 9+380	13	Entronque Jungapeo km 56+700 (98.77%)
2	Entronque San Vicente km 14+500	14	Entronque Piedras de Lumbre km 57+700 (74.67%)
3	PIP km 18+370	15	Entronque Zirahuato km 62+500 (69.64%)
4	Entronque Zinzingareo km 18+700	16	Entronque San Felipe I km 64+400 (54.87%), Sin actividad.
5	Entronque Senguio km 21+280	17	Entronque San Felipe II Km 64+640 (54.87%), Sin actividad.
6	PIP km 22+280	18	Entronque Macutzio km 65+620 (46.62%)
7	Entronque Santa Rosa km 32+420	19	Entronque Valle Verde km 67+220 (97.61%)
8	Entronque Ziranda-Jaripeo km 33+500	20	Entronque Curungueo I Km 68+240
9	Puente Turundeo Km 36+460	21	Entronque Curungueo II Km 68+780
10	Entronque Turundeo I km 37+550	22	Puente San Juan Viejo Km 69+860 (98.75%),
11	Entronque Turundeo II km 38+780	23	PSV Zitácuaro Km 72+160 (97.28%)
12	Puente Obispo Km 50+400 (0.00%),		

Avance físico

- Programado: 64.70% (Reprogramación T8)
- Real: 66.36%
- Semanal: 0.33%
- Financiero: 17.56%

Nota 1:
Los avances se calculan en relación a la Inversión total del Ramal

Nota 2:
Las Estructuras en proceso remarcadas en color rojo, no presentan avance en el periodo semanal, o no han iniciado.

**Inversión:** \$4,575.3 mdp (total Ramal)
\$3,048.81 mdp (modernización)
\$1,526.49 mdp (Libramientos)

**Meta:** 71.3 Km

**Inicio:** septiembre 2020
Reinicio: 27 de enero de 2024
Término: 31 de diciembre de 2026

**4,800 empleos generados**

**126,000 habitantes beneficiados**

**Ahorro en tiempo: 25 min**

Concesionaria: Red de carreteras de occidente


Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

TERRACERIAS						Observaciones
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 15 may al 21 may 26 Programado	21 may 26 Ejecutado	
Cortes (m3)	705,558.00	787,767.08	-82,209.08	0.00	2,005.04	
Terraplén (m3)	445,687.00	472,580.69	-26,893.69	0.00	3,957.36	
Subyacente (m3)	256,097.00	281,600.23	-25,503.23	0.00	2,051.73	
Subrasante (m3)	170,688.00	181,885.91	-11,197.91	0.00	1,148.61	

PAVIMENTOS						Observaciones
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 15 may al 21 may 26 Programado	21 may 26 Ejecutado	
Base Hidráulica (m3)	125,659.04	130,772.80	-5,113.76	445.57	817.41	
Bacheo (m3)	1,800.00	1,842.25	-42.25	4.62	0.00	SIN ACTIVIDAD DURANTE ESTE PERIODO
Fresado (m3)	10,676.00	10,922.80	-246.80	47.08	19.72	SE TRABAJA EN TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 6, 7 Y 9
Rayado Carpeta (Ha)	30.24	30.07	0.17	0.32	0.05	SE TRABAJA EN TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 6, 7 Y 9
Base Asfáltica (m3)	120,414.05	126,058.92	-5,644.87	1,048.30	706.45	SE TRABAJA EN TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 6, 7 Y 9
Carpeta Asfáltica (m3)	45,247.80	36,070.34	9,177.46	179.72	234.38	SE TRABAJA EN TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 6, 7 Y 9

ESTRUCTURAS						Observaciones
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 15 may al 21 may 26 Programado	21 may 26 Ejecutado	
PSV SAN FELIPE	1.00	0.5351	0.4649	0.0525	0.0028	CONFORMACIÓN DE TERRACERÍAS
PSV SAN JUAN MEJO	1.00	0.9875	0.0125	0.0000	0.0000	SIN ACTIVIDAD
PSV ZITÁCUARO	1.00	0.9728	0.0272	0.0316	0.0002	BALIZAMIENTO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
DEFENSA METÁLICA	35,327.00 ml	33,138.00 ml	2,189.00 ml	0.00 ml	391.24 ml	SE INSTALA EN TRAMOS AISLADOS DISPONIBLES
BALIZAMIENTO	157,137.60 ml	92,521.36 ml	64,616.24 ml	0.00 ml	594.90 ml	CONTINÚA LA COLOCACION EN TRAMO 6.
CUNETAS	12,028.95 ml	10,975.93 ml	1,053.02 ml	0.00 ml	23.40 ml	CONTINÚA LA CONSTRUCCIÓN EN TRAMO 6
BOTONES	12,041.00 pza	9,651.00 pza	2,390.00 pza	0.00 pza	64.00 pza	INICIA LA COLOCACION EN TRAMO 6.
VERTICAL BAJO	1,011.00 pza	742.00 pza	269.00 pza	0.00 pza	9.00 pza	INICIA LA COLOCACION EN TRAMO 6.

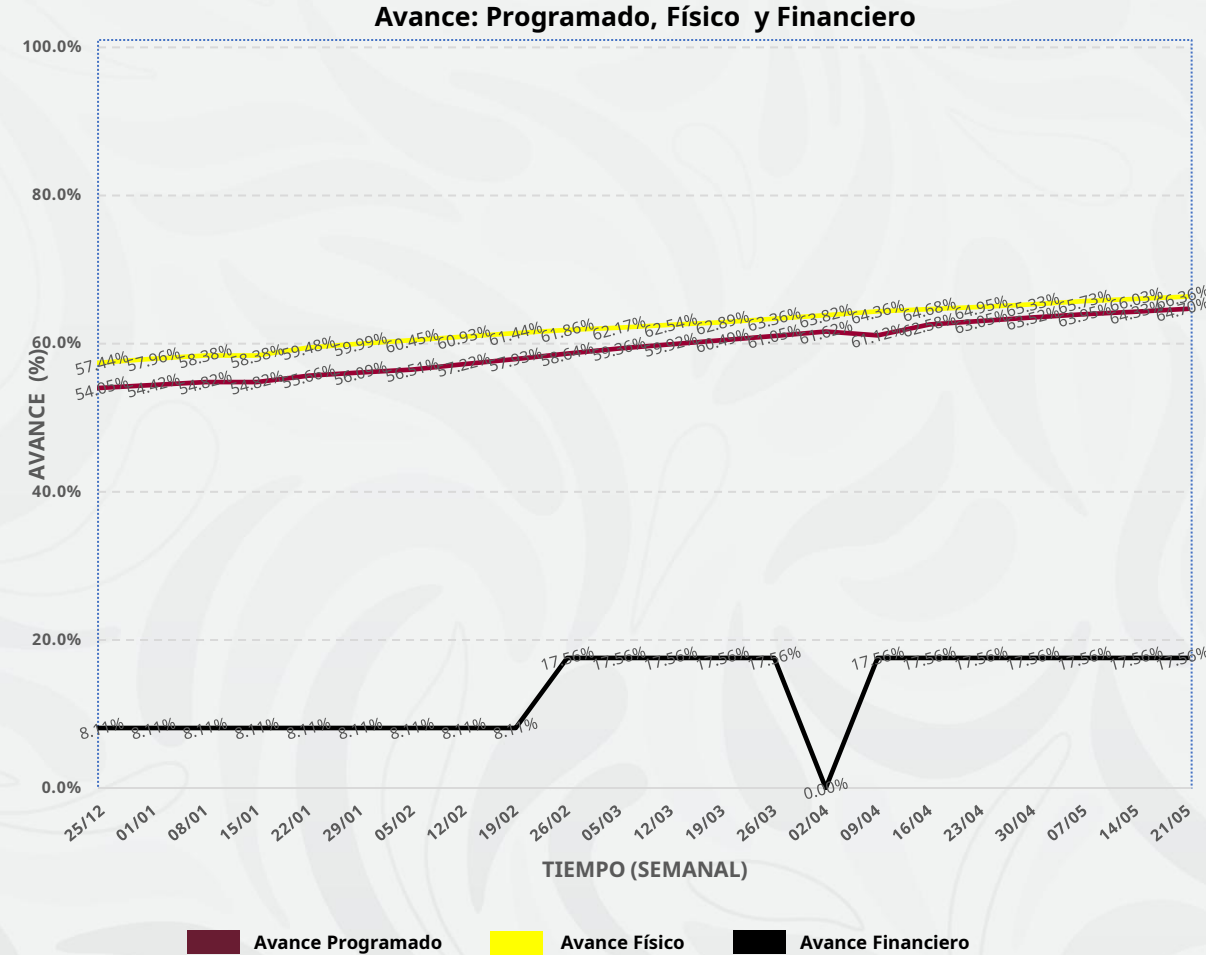

	Del 08 al 14 de mayo 26	Del 15 al 21 de mayo 26
Fuerza de Trabajo (personas)	290	288
Maquinaria	187	190
tramos activos	IV, VI, VII, VIII, IX, X	IV, VI, VII, VIII, IX, X
Frentes de trabajo (totales)	24	22
