



# Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

## Laguna Verde-La Mancha

Concesionaria: IDEAL  
Constructora: MOTA-ENGIL, S.A. de C.V.

### VERACRUZ

**PSMA 6.0 4.00X4.50 KM 6+082.**  
trabajos de conformación de  
aproche concluidos.



**PUENTE 7.3 KM 7+373** En  
proceso de perforación pila  
01 del cargadero 01




**PUENTE 7.8 KM 7+815**  
**CLARO No. 01** Trabajos de  
desvío de línea de media  
tensión a cargo de CFE.



#### Simbología

- Por construir
- En proceso de construcción
- Concluido

Soyacuautila

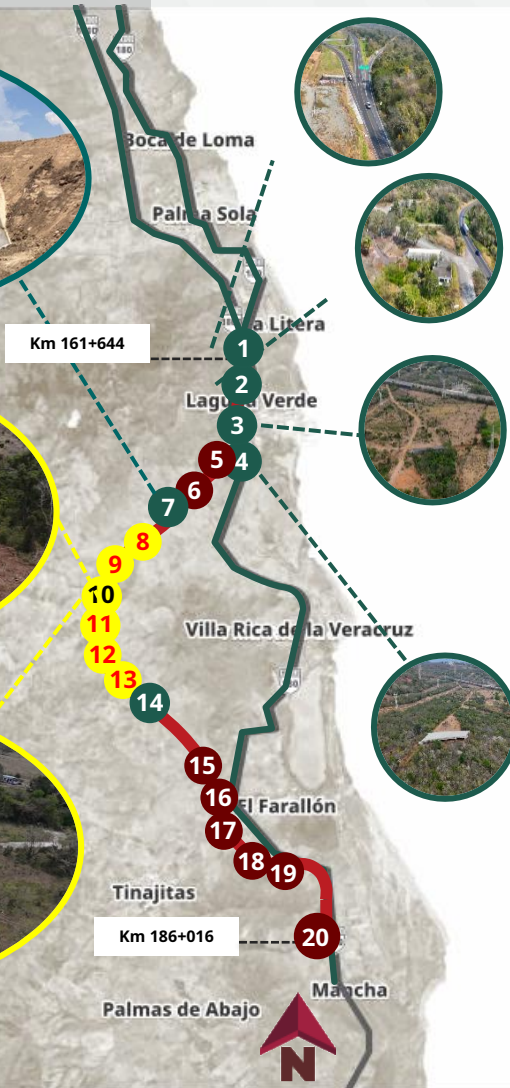

| Descripción |                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | Entronque Laguna Verde II Km 0+000                                                                                              |
| 2           | PSMA 1.5 Km 1+555.5                                                                                                             |
| 3           | PSMA 2.7 Km 2+703.91                                                                                                            |
| 4           | PIV 3.05 Km 3+041                                                                                                               |
| 5           | Entronque Laguna Verde I Km 3+041                                                                                               |
| 6           | PSMA 3.9 Km 3+900                                                                                                               |
| 7           | PSMA 6.0 Km 6+080                                                                                                               |
| 8           | PIV 6.8 Km 6+806 <b>(96.00%)</b> (se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo para obra de drenaje en rampa de acceso.) |
| 9           | PIV 7.04 Km 7+040 <b>(5.00%)</b> Se continua con la evaluación de la reubicación de la estructura.                              |
| 10          | PUENTE 7.3 Km 7+330 <b>(3.33%)</b> En proceso de perforación pila 01 del cargadero 01                                           |
| 11          | PUENTE 7.8 Km 7+815, <b>(61.70%)</b> (Se realiza el desvío de línea de media tensión en claro no. 01).                          |
| 12          | PLAZA DE COBRO Km 8+300, <b>(16.00%)</b> (El proyecto ejecutivo está en revisión en la DGDC).                                   |
| 13          | PUENTE 8.7 Km 8+665, <b>(96.00%)</b> a nivel de losa colada                                                                     |
| 14          | PSMA 8.9 Km 8+960,                                                                                                              |
| 15          | PUENTE 14 Km 14+000                                                                                                             |
| 16          | PUENTE 14.7 Km 14+700                                                                                                           |
| 17          | PSV Km 14+900                                                                                                                   |
| 18          | PSMA 15.3 Km 15+370                                                                                                             |
| 19          | PSV 16.8 Km 16+800                                                                                                              |
| 20          | ENTRONQUE LA MANCHA Km 19+841                                                                                                   |

### Avance físico

- Programado: 76.33%
- Real: 29.35% Incluye Ent. Chapachapa
- Financiero: 15.64%
- Semanal: 0.52%



**Inversión: 2,252.78 mdp**



**Inicio:** Marzo de 2025  
**Término:** Agosto de 2026



**Meta:** 19.84 km, 5 Puentes,  
1 Plaza de Cobro, 3 Entronques,  
2 PSVs, 3 PIVs, 6 PSMA, 59 ODTs  
y el Entronque Chapachapa



**2,252.78 (1)=2,253** empleos directos  
generados/millón de inversión  
**2,252.78 (2)= 4,506** empleos  
indirectos generados/millón de  
inversión



**128,000** habitantes beneficiados



**45 minutos** de ahorro en tiempo,  
Tramo 4

# Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

## Laguna Verde-La Mancha



Concesionaria: IDEAL  
Constructora: MOTA-ENGIL, S.A. de C.V.



### Avance físico

- Real: 100.00%
- Programado: 100.00%
- Financiero: 75.01%
- Semanal: 0.00%

| Descripción |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 1           | Entronque Chapachapa Km 739+733 (Km op. 92+512) |
| 2           | ODT 92+827.25                                   |
| 3           | PSPyG 92+832.22                                 |
| 4           | Ampliación de ODT 100+102,                      |




# Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

## Laguna Verde-La Mancha



| Elemento                                     | Intervención | Ejecutado acumulado | Faltante     | 16/04/26 al 23/04/26 |           | Observaciones                                                                               |
|----------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |              |                     |              | Programado           | Ejecutado |                                                                                             |
| Tramo 4 Laguna Verde - La Mancha             |              |                     |              |                      |           |                                                                                             |
| Volúmenes de obra                            |              |                     |              |                      |           |                                                                                             |
| Corte                                        | 1,414,039.20 | 178,797.34          | 1,235,241.86 | 27,193.00            | 6,095.39  | El volumen programado corresponde a los <b>19.8 km</b> y solo se trabaja en <b>7.6 km</b> . |
| Terraplén                                    | 1,155,915.50 | 203,986.90          | 951,928.60   | 20,641.00            | 8,240.26  | El volumen programado corresponde a los <b>19.8 km</b> y solo se trabaja en <b>7.6 km</b> . |
| Pedraplén                                    | 97,038.03    | 53,725.47           | 43,312.56    | 4,043.25             | 1,411.73  | El volumen programado corresponde a los <b>19.8 km</b> y solo se trabaja en <b>7.6 km</b> . |
| Subyacente                                   | 162,462.20   | 64,624.79           | 97,837.41    | 27,077.03            | 2,547.51  | El volumen programado corresponde a los <b>19.8 km</b> y solo se trabaja en <b>7.6 km</b> . |
| Subrasante                                   | 124,961.00   | 17,283.51           | 107,677.49   | 17,851.57            | 1,550.98  | El volumen programado corresponde a los <b>19.8 km</b> y solo se trabaja en <b>7.6 km</b> . |
| Estructuras Tramo 4 Laguna Verde - La Mancha |              |                     |              |                      |           |                                                                                             |
| Cargaderos                                   | 2            | 0                   | 2            | 0                    | 0         | <b>Puente 7.3 Km 7+373</b> En proceso de perforación pila 01 del cargadero 01               |
| Apoyos                                       | 2            | 0                   | 2            | 0                    | 0         | <b>Puente 7.3 Km 7+373</b>                                                                  |
| Pilas                                        | 12           | 0                   | 12           | 0                    | 0         | <b>Puente 7.3 Km 7+373</b> En proceso de perforación pila 01 del cargadero 01               |

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

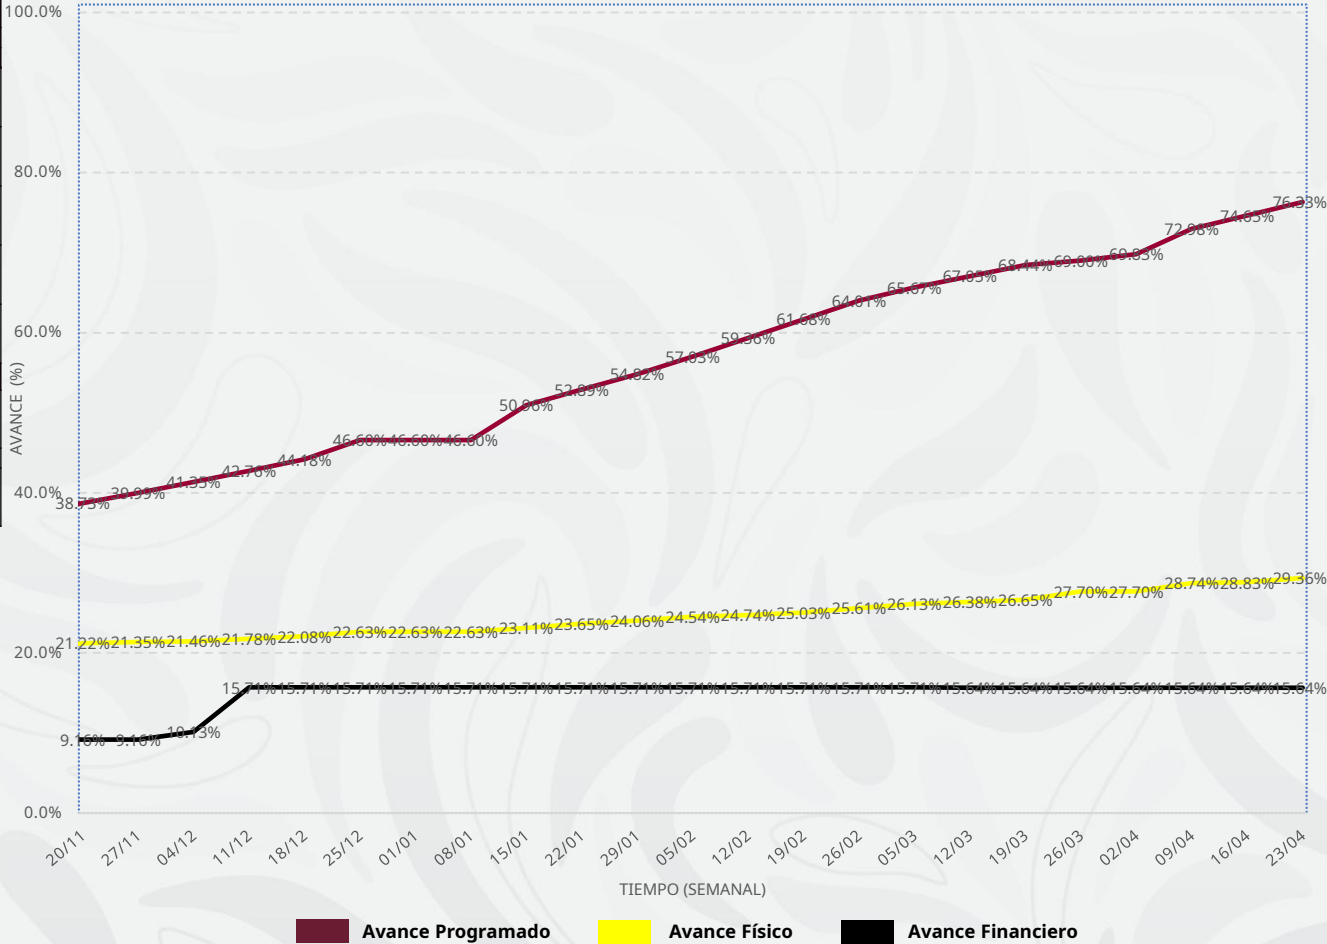

|                              | 03 de abril al 09 de abril | 10 de abril al 16 de abril | 17 de abril al 23 de abril |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Fuerza de Trabajo (personas) | 113                        | 118                        | 158                        |
| Maquinaria                   | 21                         | 28                         | 27                         |
