


Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

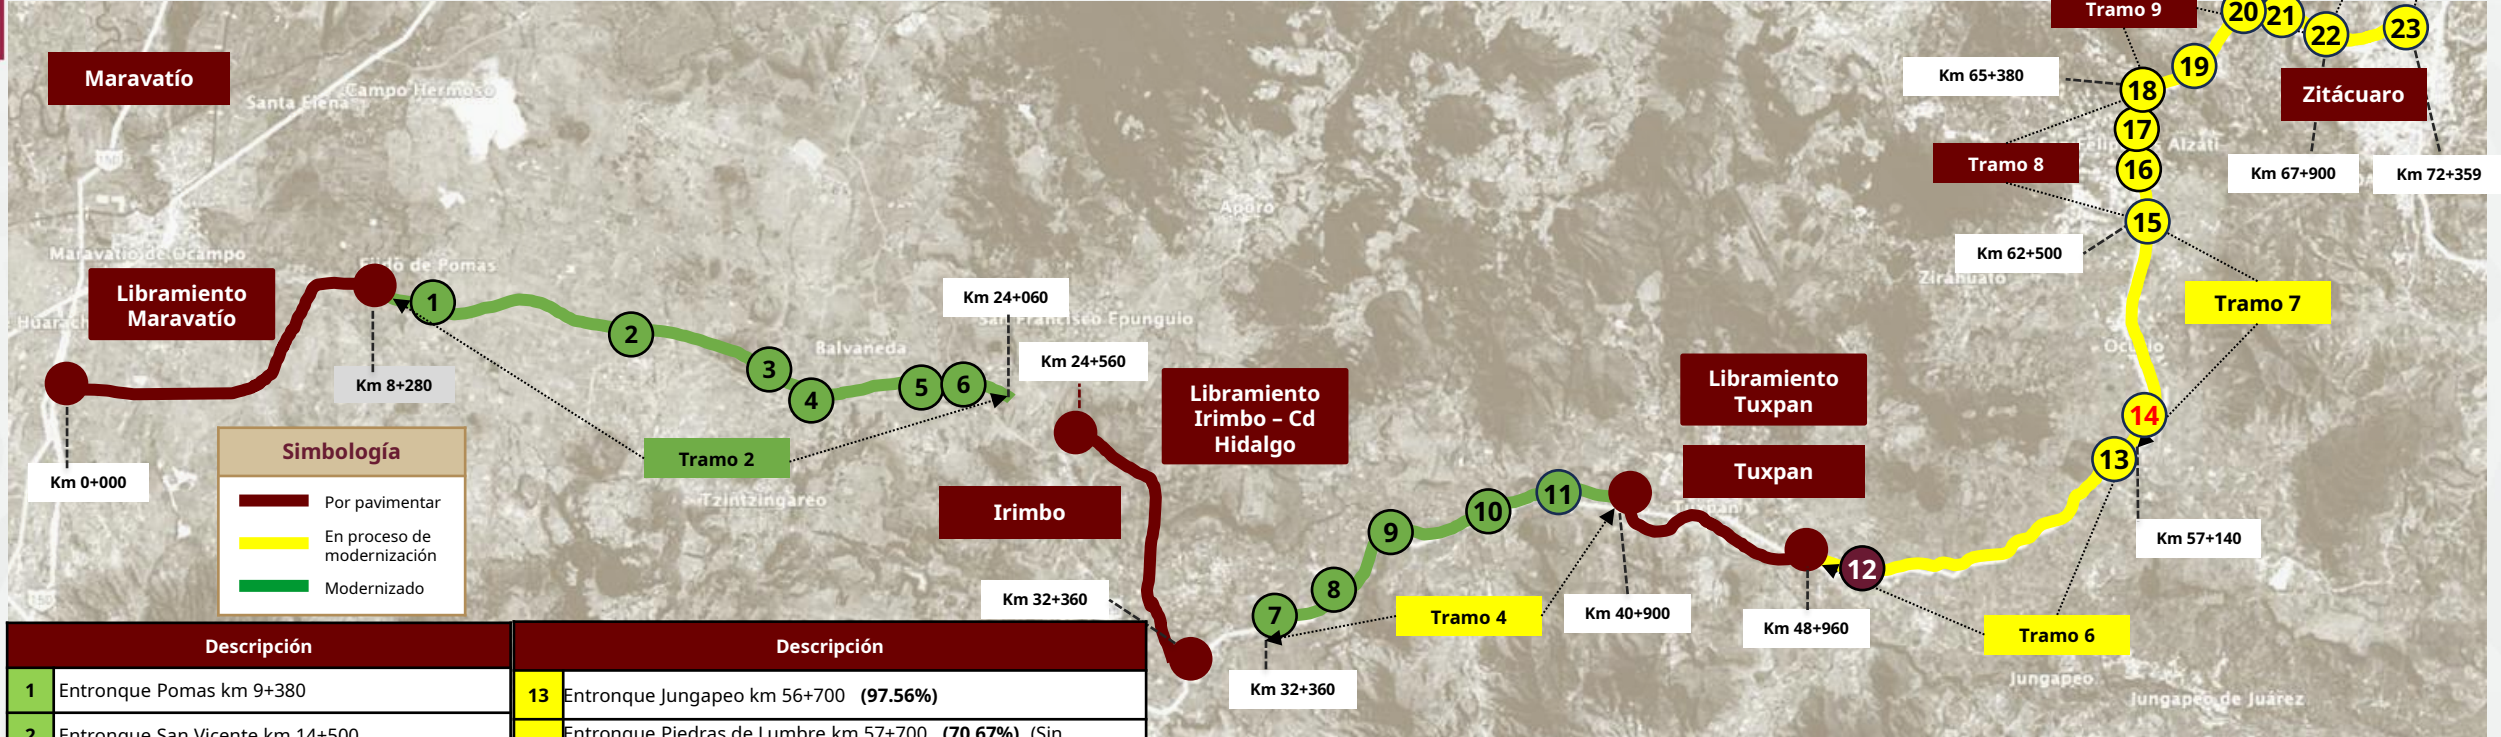

Descripción		Descripción	
1	Entronque Pomas km 9+380	13	Entronque Jungapeo km 56+700 (97.56%)
2	Entronque San Vicente km 14+500	14	Entronque Piedras de Lumbre km 57+700 (70.67%) , (Sin actividad, pendiente tendido de bas asfáltica).
3	PIP km 18+370	15	Entronque Zirahuato km 62+500 (64.99%)
4	Entronque Zinzingareo km 18+700	16	Entronque San Felipe I km 64+400 (43.01%)
5	Entronque Senguio km 21+280	17	Entronque San Felipe II Km 64+640 (43.01%)
6	PIP km 22+280	18	Entronque Macutzio km 65+620 (36.69%)
7	Entronque Santa Rosa km 32+420	19	Entronque Valle Verde km 67+220 (89.45%)
8	Entronque Ziranda-Jaripeo km 33+500	20	Entronque Curungueo I Km 68+240 (94.19%) , (Falta completar tendido de carpeta asfáltica).
9	Puente Turundeo Km 36+460	21	Entronque Curungueo II Km 68+780 (94.19%) , (Falta completar tendido de carpeta asfáltica).
10	Entronque Turundeo I km 37+550	22	Puente San Juan Viejo Km 69+860 (98.54%)
11	Entronque Turundeo II km 38+780	23	PSV Zitácuaro Km 72+160 (96.66%)
12	Puente Obispo Km 50+400 (0.00%) , Sin Iniciar		

Avance físico

- Programado: 63.05% (Reprogramación T8)
- Real: 64.95%
- Semanal: 0.27%
- Financiero: 17.56%

Nota 1

Los avances se calculan en relación a la Inversión total del Ramal

Nota 2

Las Estructuras en proceso remarcadas en color rojo, no presentan avance en el periodo semanal, o no han iniciado.



Inversión: \$4,575.3 mdp (total Ramal)
\$3,048.81 mdp (modernización)
\$1,526.49 mdp (Libramientos)



Meta: 71.3 Km



Inicio: septiembre 2020
Reinicio: 27 de enero de 2024
Término: 31 de diciembre de 2026



4,800 empleos generados



126,000 habitantes beneficiados



Ahorro en tiempo: 25 min


Concesionaria: Red de carreteras de occidente

Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío



TERRACERIAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 17 abr al 23 abr 26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Cortes (m3)	705,558.00	778,473.93	-72,915.93	0.00	2,005.63	
Terraplén (m3)	445,687.00	455,608.76	-9,921.76	0.00	2,427.96	
Subyacente (m3)	256,097.00	272,931.66	-16,834.66	0.00	1,177.86	
Subrasante (m3)	170,688.00	176,907.16	-6,219.16	589.38	782.36	
PAVIMENTOS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 17 abr al 23 abr 26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Base Hidráulica (m3)	125,659.04	126,938.73	-1,279.69	1,402.62	831.40	
Bacheo (m3)	1,800.00	1,841.25	-41.25	13.85	3.00	SE TRABAJA EN TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 6, 7 Y 9
Fresado (m3)	10,676.00	10,868.57	-192.57	47.08	9.86	SE TRABAJA EN TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 6, 7 Y 9
Rayado Carpeta (Ha)	30.24	30.01	0.23	0.32	0.05	SE TRABAJA EN TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 6, 7 Y 9
Base Asfáltica (m3)	120,414.05	123,486.84	-3,072.79	1,201.93	524.71	SE TRABAJA EN TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 6, 7 Y 9
Carpeta Asfáltica (m3)	45,247.80	34,787.77	10,460.03	0.00	212.46	
ESTRUCTURAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 17 abr al 23 abr 26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
PSV SAN FELIPE	1.00	0.5258	0.4742	0.0273	0.0017	CONFORMACIÓN DE TERRACERÍAS
PSV SAN JUAN VIEJO	1.00	0.9854	0.0146	0.0290	0.0028	APROCHE DE CABEZALES
PSV ZITÁCUARO	1.00	0.9666	0.0334	0.0472	0.0033	TENDIDO DE CARPETA ASFÁLTICA
DEFENSA METÁLICA	35,327.00 ml	31,867.87 ml	3,459.13 ml	0.00 ml	152.95 ml	SE INSTALA EN TRAMOS AISLADOS DISPONIBLES
BALIZAMIENTO	157,137.60 ml	84,604.26 ml	72,533.34 ml	0.00 ml	982.76 ml	CONTINÚA LA COLOCACION EN TRAMO 6.
CUNETAS	12,028.95 ml	10,807.63 ml	1,221.32 ml	0.00 ml	33.50 ml	CONTINÚA LA CONSTRUCCIÓN EN TRAMO 6
BOTONES	12,041.00 pza	9,445.00 pza	2,596.00 pza	0.00 pza	31.00 pza	INICIA LA COLOCACION EN TRAMO 6.
VERTICAL BAJO	1,011.00 pza	704.00 pza	307.00 pza	0.00 pza	12.00 pza	INICIA LA COLOCACIÓN EN TRAMO 6.

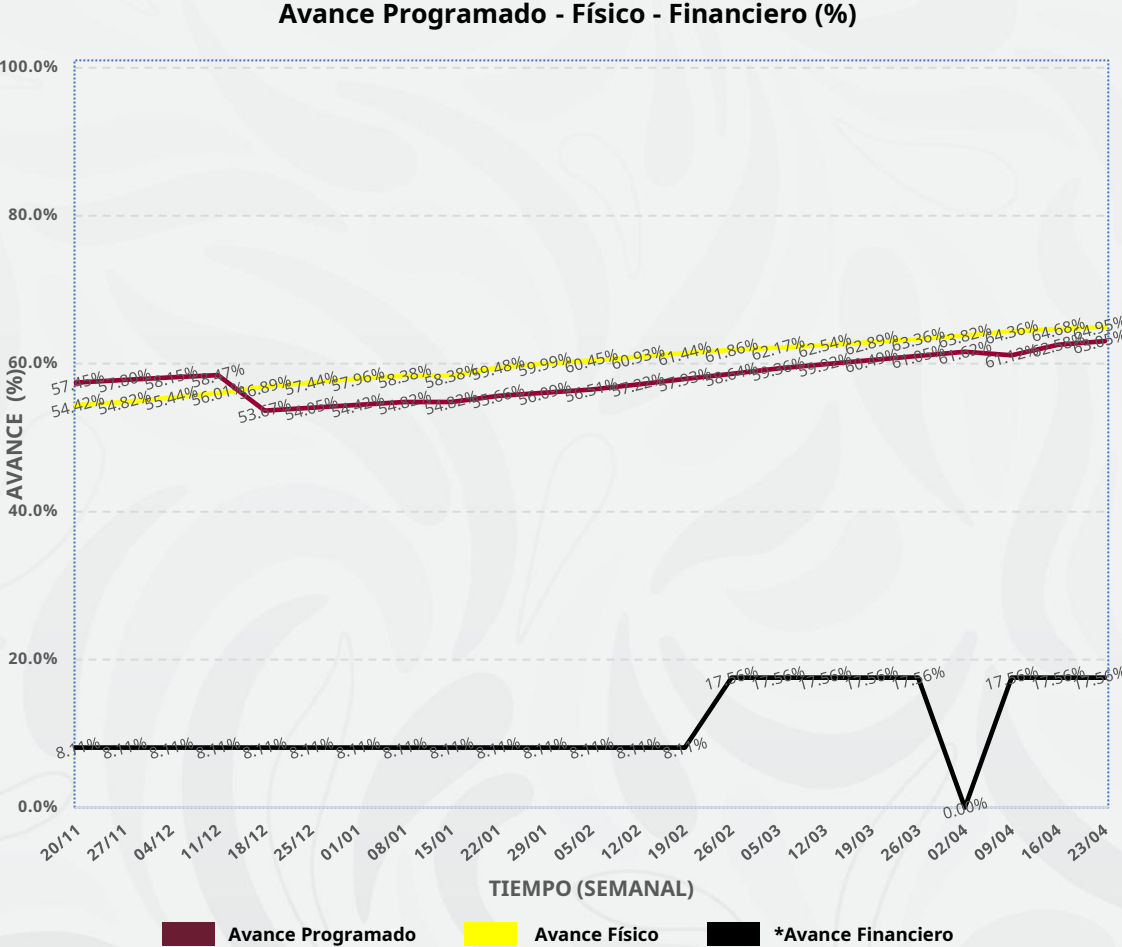

	Del 09 de abril al 16 de abril de 2026	Del 17 de abril al 23 de abril de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	289	292
Maquinaria	192	198
tramos activos	IV, VI, VII, VIII, IX, X	IV, VI, VII, VIII, IX, X
Frentes de trabajo (totales)	28	25
