


Jalisco

Ampliación Libramiento Lagos de Moreno

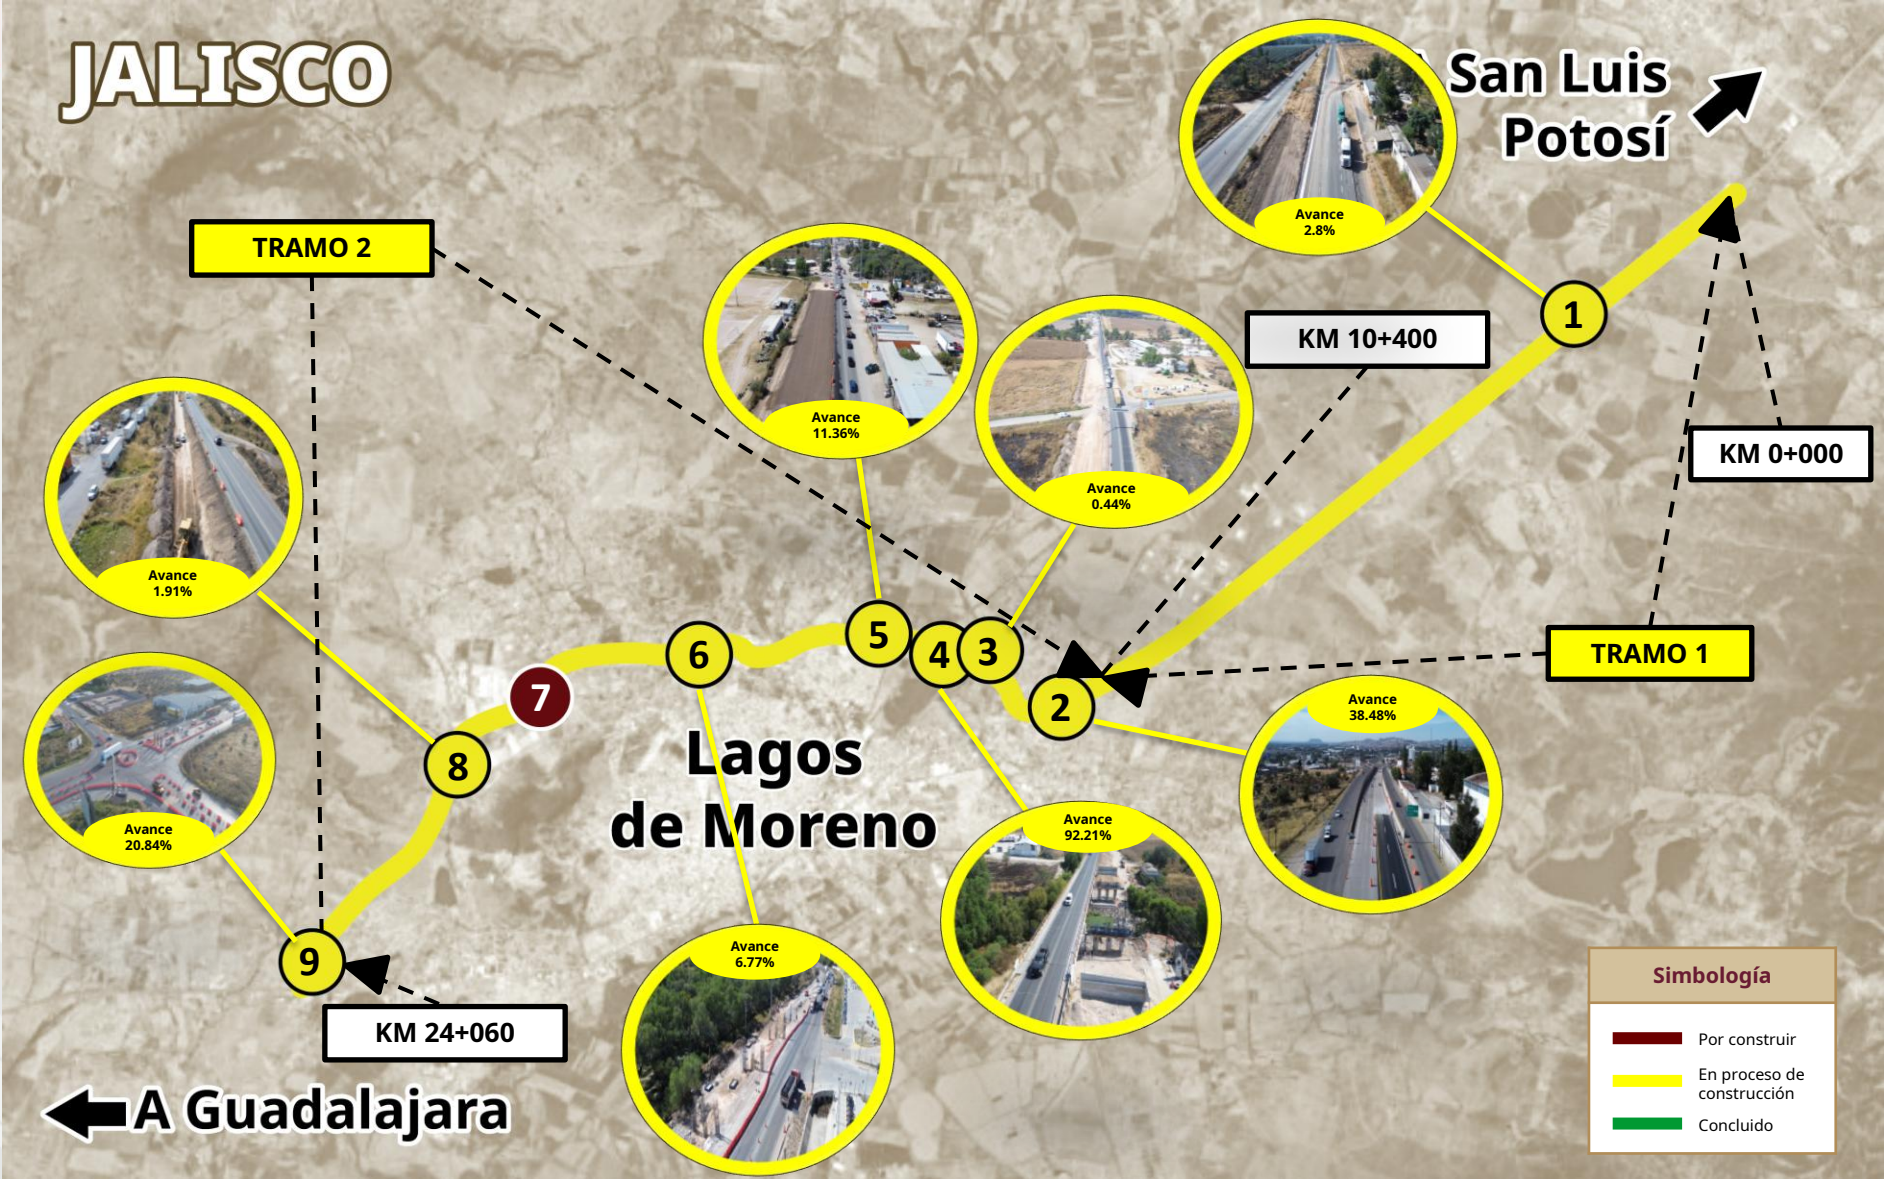

Descripción	
1	PIV con entronque "El Maguey" km 1+300 - Avance 2.8% . Problemas de DDV. (Modificación de proyecto). (Se movió la fuerza de trabajo)
2	Entronque a desnivel Lagos de Moreno Este km 11+800 (adecuación)- Avance 38.48% (Se movió la fuerza de trabajo)
3	PIV con entronque "Fracc. Andalucía" km 12+120 Avance 0.47% .
4	Puente km 12+450 "Río Lagos"- Avance 92.21% . (Se movió la fuerza de trabajo)
5	PIV con entronque "Sepúlveda" km 13+620 Avance 11.36% . (Se movió la fuerza de trabajo)
6	PSV con entronque "DRÄXLMAIER" km 15+900 Avance 6.77%
7	PIV con entronque "Encarnación" km 18+200
8	PSFC con retornos km 19+860 Avance 1.91% (Se movió la fuerza de trabajo)
9	PIV con entronque Tipo Glorieta "Lagos de Moreno Oeste" km 23+920 Avance 20.84% .

Avance físico general

- Real: 51.39%
- Programado: 50.71%
- Semanal: 0.42%
- Financiero: 32.13%

 **Inversión: 2,720.20 mdp (C/IVA)**

 **Inicio:** 1 de marzo de 2025
Término: Diciembre 2027

 **Meta:** 24.06 km

 **2,345** empleos directos
4,690 empleos indirectos

 **250,000** habitantes beneficiados

 **20 minutos** de ahorro en tiempo

Jalisco


Ampliación Libramiento Lagos de Moreno

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

TRAMO 2 - AVANCE TRONCAL Y ENTRONQUES							
Concepto	Unidad	Total	Ejecutado	Faltante	13/03/26 al 19/03/26		Observaciones
					Programado	Ejecutado	
Terracerías Troncal	%	100%	47.96%	52.04%	0.014	0.97%	En proceso
Drenaje Troncal	%	100%	15.50%	84.50%	0.00	0.37%	En proceso
Obras Inducidas	%	100%	9.04%	90.96%	0.00	5.22%	En proceso
Entronque 23+920	%	100%	20.84%	79.16%	0.00	0.39%	En proceso

Descripción de la obra

Ampliación y modernización del Libramiento Lagos de Moreno de 25 km. 11.0 km a 21.0 m de ancho de corona pasando de una A2 a A4S; y 14.0 km a 19.0 m de ancho de corona tipo A4; ESTRUCTURA DE PAVIMENTO: Subrasante de 30 cms., de espesor, Base Hidráulica de 20 cms., de espesor, Base Asfáltica de 15 cms., de espesor y carpeta asfáltica de 6 cms., de espesor, Con un TDPA de 16,551 Veh/día ESTRUCTURAS: 1 Retorno a Nivel, : 4 entronques a desnivel con PIV, 2 pasos Inferiores vehiculares (PIV), 1 Paso Superior Vehicular (PSV), 1 Puente, 1 Paso Superior Ferrocarril (PSFC), y 3 pasos Inferiores Peatonales con rampa (PIPR); Obras de drenaje, señalamiento Horizontal, Vertical y obras complementarias (cunetas, bordillos y lavaderos)

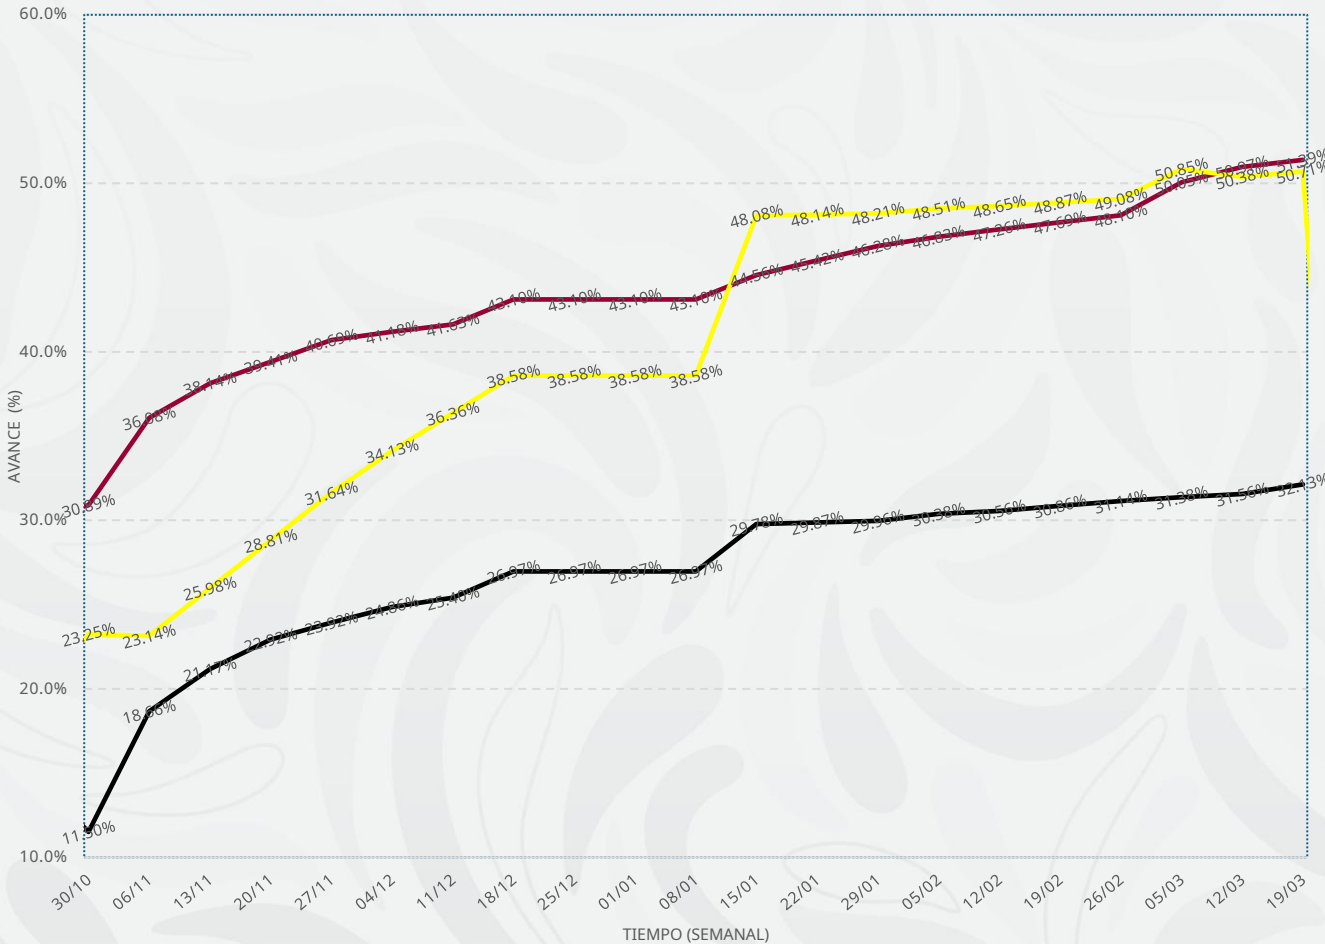

	06 al 12 de marzo 2026	13 al 19 de marzo 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	246	246
Maquinaria	69	69
