

Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha



Descripción	
1	Entronque Laguna Verde II Km 0+000
2	PSMA 1.5 Km 1+555.5
3	PSMA 2.7 Km 2+703.91
4	PIV 3.05 Km 3+041
5	Entronque Laguna Verde I Km 3+041
6	PSMA 3.9 Km 3+900
7	PSMA 6.0 Km 6+080 (97.00%) estructuralmente concluida.
8	PIV 6.8 Km 6+806 (90.00%)
9	PIV 7.04 Km 7+040 (5.00%) Se continua con la evaluación de la reubicación de la estructura.
10	PUENTE 7.3 Km 7+330
11	PUENTE 7.8 Km 7+815, (54.00%) Pendiente montaje de trabes en claro no. 01; se realiza el montaje de prelosas en claro no. 05
12	PLAZA DE COBRO Km 8+300, (16.00%) El proyecto ejecutivo está en revisión en la DGDC.
13	PUENTE 8.7 Km 8+665, (65.00%) continúan los trabajos de colocación de prelosas en claro no. 02
14	PSMA 8.9 Km 8+960, (100.00%)
15	PUENTE 14 Km 14+000
16	PUENTE 14.7 Km 14+700
17	PSV Km 14+900
18	PSMA 15.3 Km 15+370
19	PSV 16.8 Km 16+800
20	ENTRONQUE LA MANCHA Km 19+841

Avance físico

- Programado: 68.44%
- Real: 26.65% Incluye Ent. Chapachapa
- Financiero: 15.64%
- Semanal: 0.27%



Inversión: 2,252.78 mdp



Inicio: Marzo de 2025

Término: Agosto de 2026



Meta: 19.84 km, 5 Puentes, 1 Plaza de Cobro, 3 Entronques, 2 PSVs, 3 PIVs, 6 PSMA, 59 ODTs y el Entronque Chapachapa



2,252.78 (1)=2,253 empleos directos generados/millón de inversión

2,252.78 (2)= 4,506 empleos indirectos generados/millón de inversión



128,000 habitantes beneficiados



45 minutos de ahorro en tiempo, Tramo 4

Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha



Concesionaria: IDEAL
Constructora: MOTA-ENGIL, S.A. de C.V.



Simbología	
—	Por construir
—	En proceso de construcción
—	Concluido

Descripción	
1	Entronque Chapachapa Km 739+733 (Km op. 92+512) (100.00%)
2	ODT 92+827.25 (100.00%)
3	PSPyG 92+832.22 (100.00%)
4	Ampliación de ODT 100+102, (100.00%)

Avance físico


- Real: 100.00%
- Programado: 100.00%
- Financiero: 75.01%
- Semanal: 0.00%

Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	12/03/26 al 19/03/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Tramo 4 Laguna Verde - La Mancha						
Volumenes de obra						
Corte	1,414,039.20	166,710.08	1,247,329.12	27,193.00	2,249.00	El volumen programado corresponde a los 19.8 km y solo se trabaja en 7.4 km .
Terraplén	1,155,915.50	179,676.15	976,239.35	20,641.00	768.00	El volumen programado corresponde a los 19.8 km y solo se trabaja en 6.5 km .
Subyacente	162,462.20	55,953.70	106,508.50	27,077.03	1,230.00	El volumen programado corresponde a los 19.8 km y solo se trabaja en 6.7 km .
Pedraplén	97,038.03	45,182.52	51,855.51	26,588.00	1,004.00	El volumen programado corresponde a los 19.8 km y solo se trabaja en 6.7 km .
Estructuras Laguna Verde - La Mancha						
Zapata	4	2	2	0	0	PIV 6.8 Km 6+806 Estribo 01 en espera de reajuste de zapata.
Muros	2	2	0	0	0	Se realizó el montaje de 4 trabes AASHTO tipo IV PIV 6.8 Km 6+806
Aleros	4	4	0	0	2	Se realizó el colado de aleros 1 y 2 tercer trepado estribo 02 PIV 6.8 Km 6+806
Losa superior	1	0	1	1	0	Se realizan los trabajos de armado de losa superior PIV 6.8 Km 6+806
Muros	2	2	0	0	0	PSMA 6.0 KM 6+082 . estructuralmente concluida.
Aleros	4	4	0	0	4	PSMA 6.0 KM 6+082 estructuralmente concluida.
Losa superior	1	1	0	0	0	PSMA 6.0 KM 6+082 . estructuralmente concluida.

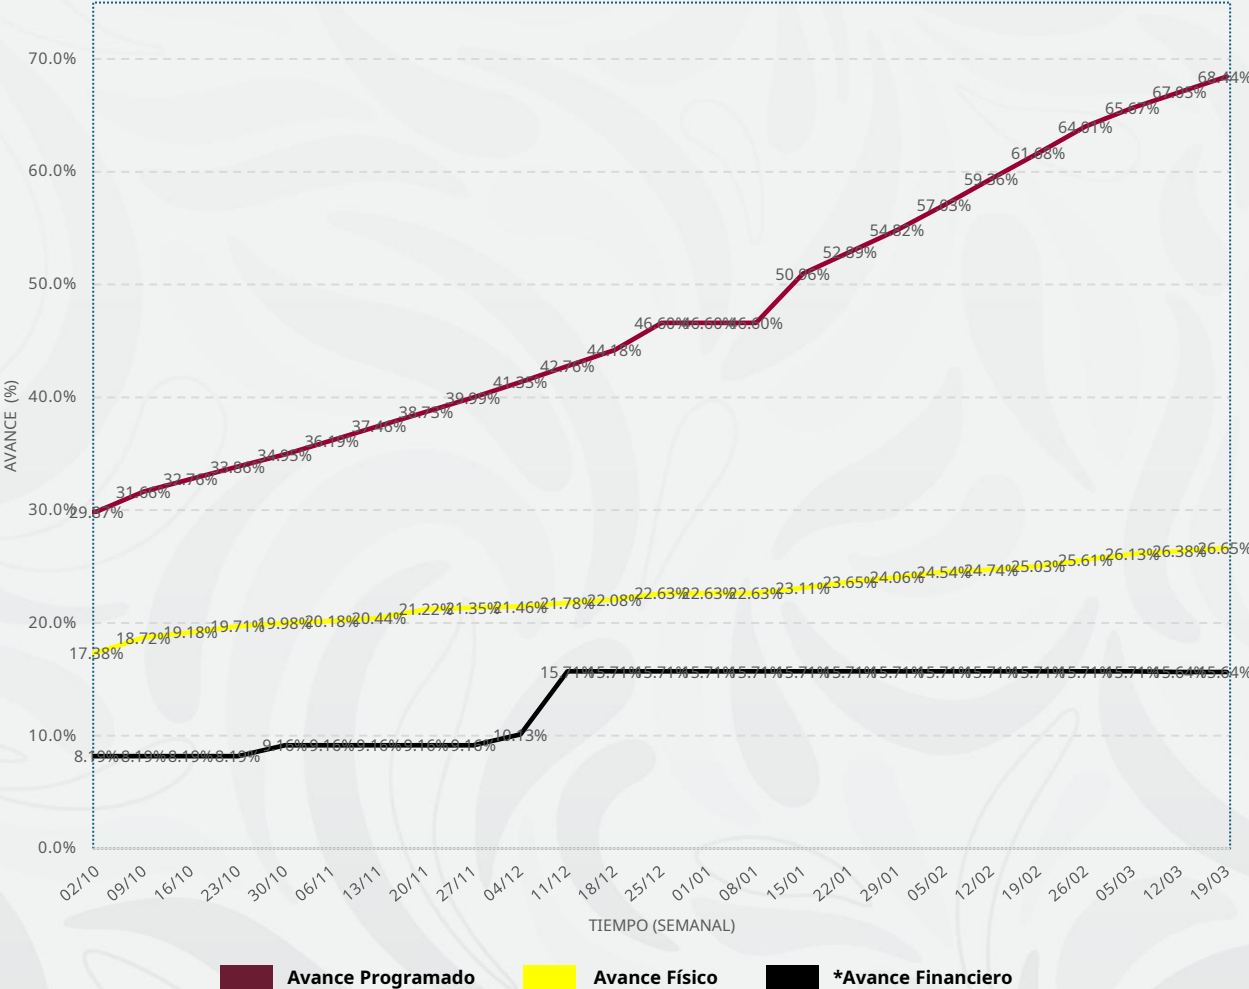

	06 de marzo al 12 de marzo	13 de marzo al 19 de marzo
Fuerza de Trabajo (personas)	146	146
Maquinaria	17	18
