

# Oaxaca

## Mitla-Entronque Tehuantepec II

Avance físico Global:

• Programado: 100%

• Semanal: 0.00%

• Real: 99.14%

Avance físico Tramo 2:

• Real: 97.42%

Avance financiero

• Real pagado: 88.56%

• Con deuda: 97.42%

• Nota: De este porcentaje se tiene una deuda de 2,635.1 mdp incluye IVA, por trabajos ejecutados.



| Descripción |                                          | Descripción |                                          | Descripción |                                                                               |
|-------------|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | PIV km 87+900. 40% *                     | 8           | Entronque Llano Laguna km 98+200. 100%   | 15          | PIV km 112+270. 100%                                                          |
| 2           | PIV km 91+530. 100%                      | 9           | Entronque Cerro Pascale km 100+500. 100% | 16          | PIV km 114+766. 100%                                                          |
| 3           | PIPR km 92+436. 100%                     | 10          | PIV km 106+570. 100%                     | 17          | Entronque Agua Blanca Km 122+600. 100%                                        |
| 4           | PIV km 92+438. 100%                      | 11          | PIV km 108+570. 100%                     | 18          | Entronque Quiavicuzas Km 137+900. 100%                                        |
| 5           | PIV km 92+680. 0% *                      | 12          | PIV km 109+247. 100%                     | 19          | Túnel El Tornillo km 139+400 (Colapsado). En elaboración proyecto del puente. |
| 6           | Entronque Llano Crucero km 92+690. 82% * | 13          | PIV km 110+460. 100%                     | 20          | PIPG Km 146+840. 95% *                                                        |
| 7           | Muro de pilas km 92+700. 32% *           | 14          | Entronque Danigare km 111+600. 100%      | 21          | PIPG km159+400. 95% *                                                         |

\* No hay avances debido a la falta de asignación de recursos



Inversión: 29,749.2 mdp incluye I.V.A sin incluir reclamos



Término: Inaugurada y puesta en operación 24 de enero de 2025 (pendiente obras complementarias)



Meta:169.23 km; el cual son 159.29 km de Troncal, 6.54 km de puentes, 1.78 km de viaductos y 1.62 km de túneles.

65 puentes, 14 viaductos, 10 túneles, 20 entronques, 2 casetas y 17 pasos de servidumbre.

En proceso: Trabajos en la troncal, 1 entronque y 8 pasos de servidumbre

❖ Nota: De los pasos de servidumbre 9 están terminados, 2 con un 95%, 1 al 40% y 5 sin iniciar

❖ El Túnel Tornillo se encuentra colapsado y en proceso proyecto del puente



10 Empleos directos generados  
30 Empleos indirectos generados



+1 millón 400 mil habitantes beneficiados



2 hrs. de ahorro en tiempo

Concesionaria: Autovía Mitla Tehuantepec, S.A. de C.V. (IDEAL)


| Elemento                       | Intervención | Ejecutado acumulado | Faltante | 13/03/26 al 19/03/26 |           | Observaciones                                               |
|--------------------------------|--------------|---------------------|----------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
|                                |              |                     |          | Programado           | Ejecutado |                                                             |
|                                |              |                     |          |                      |           |                                                             |
|                                |              |                     |          |                      |           |                                                             |
| Muro de pilas km 92+700        |              |                     |          |                      |           |                                                             |
| Perforación de pilastrones     | 38           | 17                  | 21       | 0                    | 0         | • Trabajos suspendidos por falta de asignación de recursos. |
| Armado y colado de pilastrones | 38           | 17                  | 21       | 0                    | 0         |                                                             |
|                                |              |                     |          |                      |           |                                                             |

❖Nota: A partir de esta fecha, ya no existirán avances debido a la considerable deuda que se tiene con las empresas contratadas por la concesionaria a la fecha y la falta de recursos presupuestales.

Maquinaria:

- Excavadora (1) inactivo

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Mitla - Tehuantepec

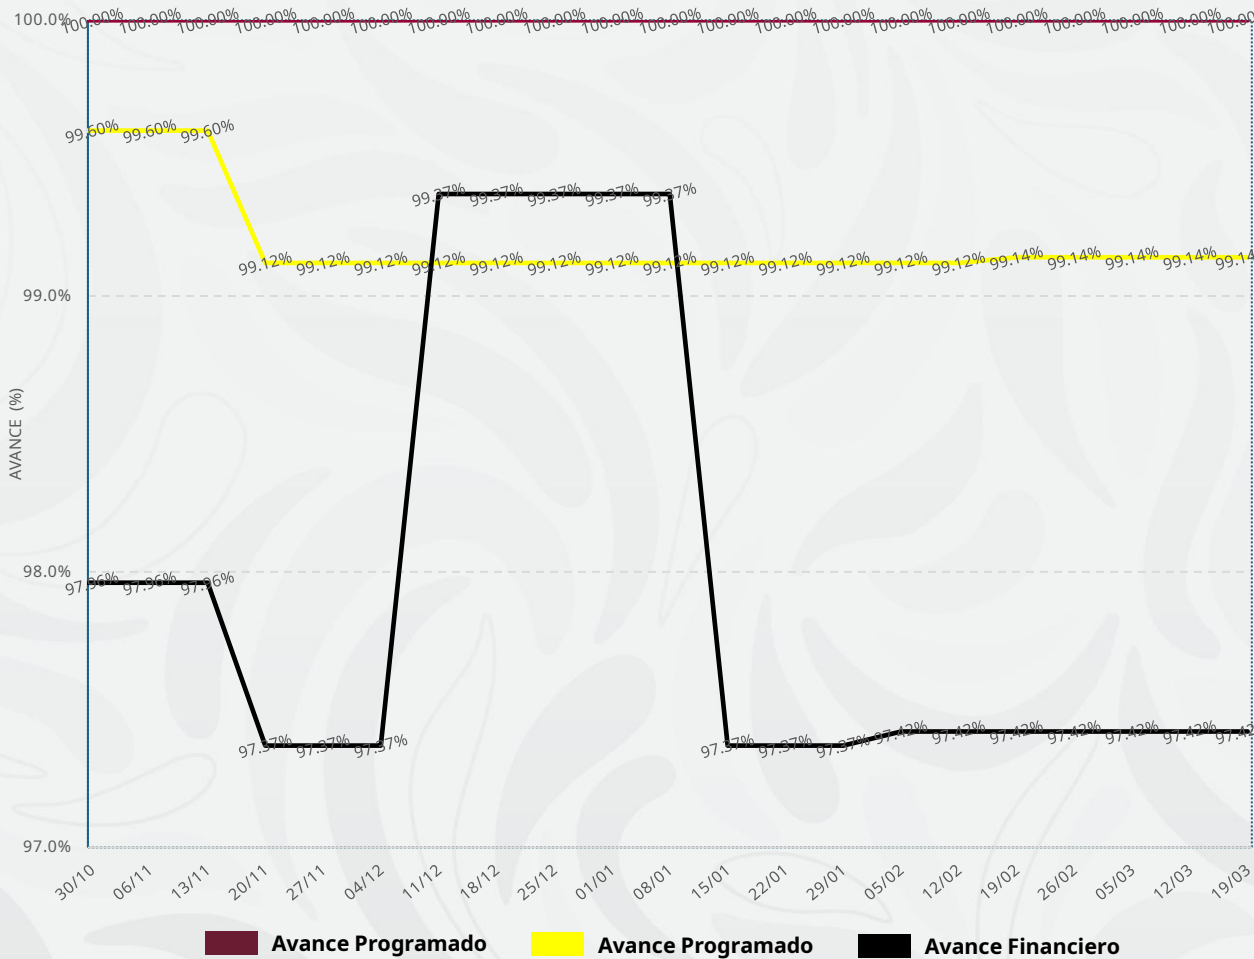

|                              | 06 de marzo al 12 de marzo de 2026 | 13 de marzo al 19 de marzo de 2026 |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Fuerza de Trabajo (personas) | 10                                 | 10                                 |
| Maquinaria                   | 0                                  | 0                                  |
| Frente de Trabajo            | No Aplica                          | No Aplica                          |
