


Nayarit

Tramo Tepic-Compostela

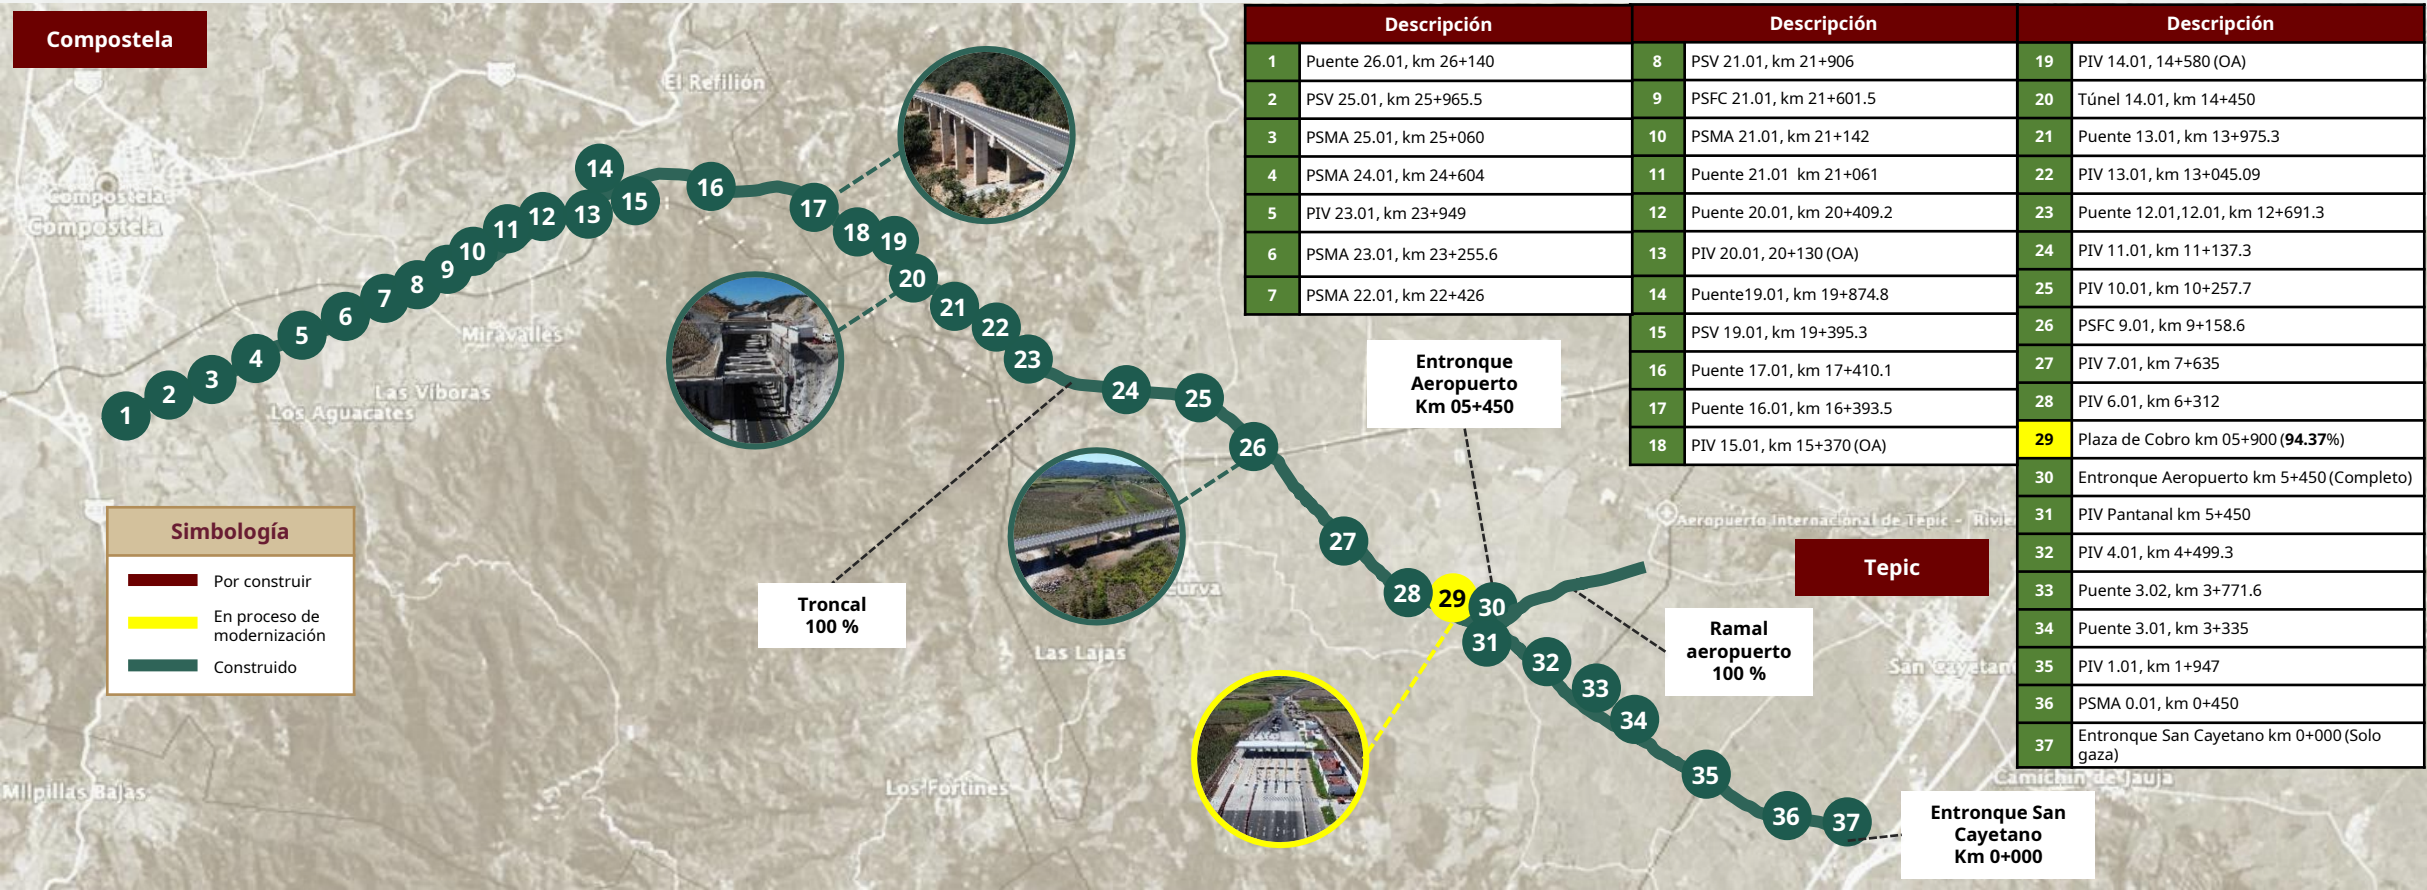

Concesionaria: FONADIN

Avance físico

- Programado: 100 %
- Real: 99.9982 %
- Financiero: 96.70 %
- Semanal: 0.0005 %



Inversión: 2,473.43 mdp (solo troncal y estructuras, no considera Ramal Aeropuerto*)



Meta: 30.17 km. (26 km en troncal y 4.17 en estructuras)
1 Túnel Falso, 1 Plaza de cobro, 10 Puentes, 2 PSFC, 1 Entronque (solo gazas) y 1 Entronque completo (Aeropuerto) y 21 Cruces (no considera Ramal Aeropuerto*) y múltiples obras de drenaje.

* Una vez que se cuente con el monto del Ramal Aeropuerto se actualizará la Inversión y Meta.



Inicio: Marzo 2023
Término: Septiembre 2025



2,473 empleos directos generados P/MDI
4,946 empleos indirectos generados P/MDI



490 mil habitantes beneficiados




35 minutos de ahorro en tiempo

Nayarit

Tramo Tepic-Compostela

Elemento	Meta	Ejecutado acumulabl e	Faltante	13/03/26 al 19/03/2026		Observaciones
				Programad o	Ejecutado	
Terraplén (m3)	2,095,966.26	2,095,954.62	11.64			
Subyacent e (m³)	290,689.00	281,764.49	8,924.51			
Puente 16.01 km 16+393.50						
Columnas	8	8	0			Trabajos concluidos.
Cortes (m³) Estabilizac ión de taludes	2,443,497.56	2,423,372.63	20,124.93			
Obras de drenaje	77	77	0			Trabajos concluidos.
P.S.F.C. 9.01 km 09+158.50						
Losa (claro)	7	7	0			Trabajos concluidos.
P.S.F.C. 21.01 km 21+601.50						
Junta de dilatación (pza)	2	2	0			

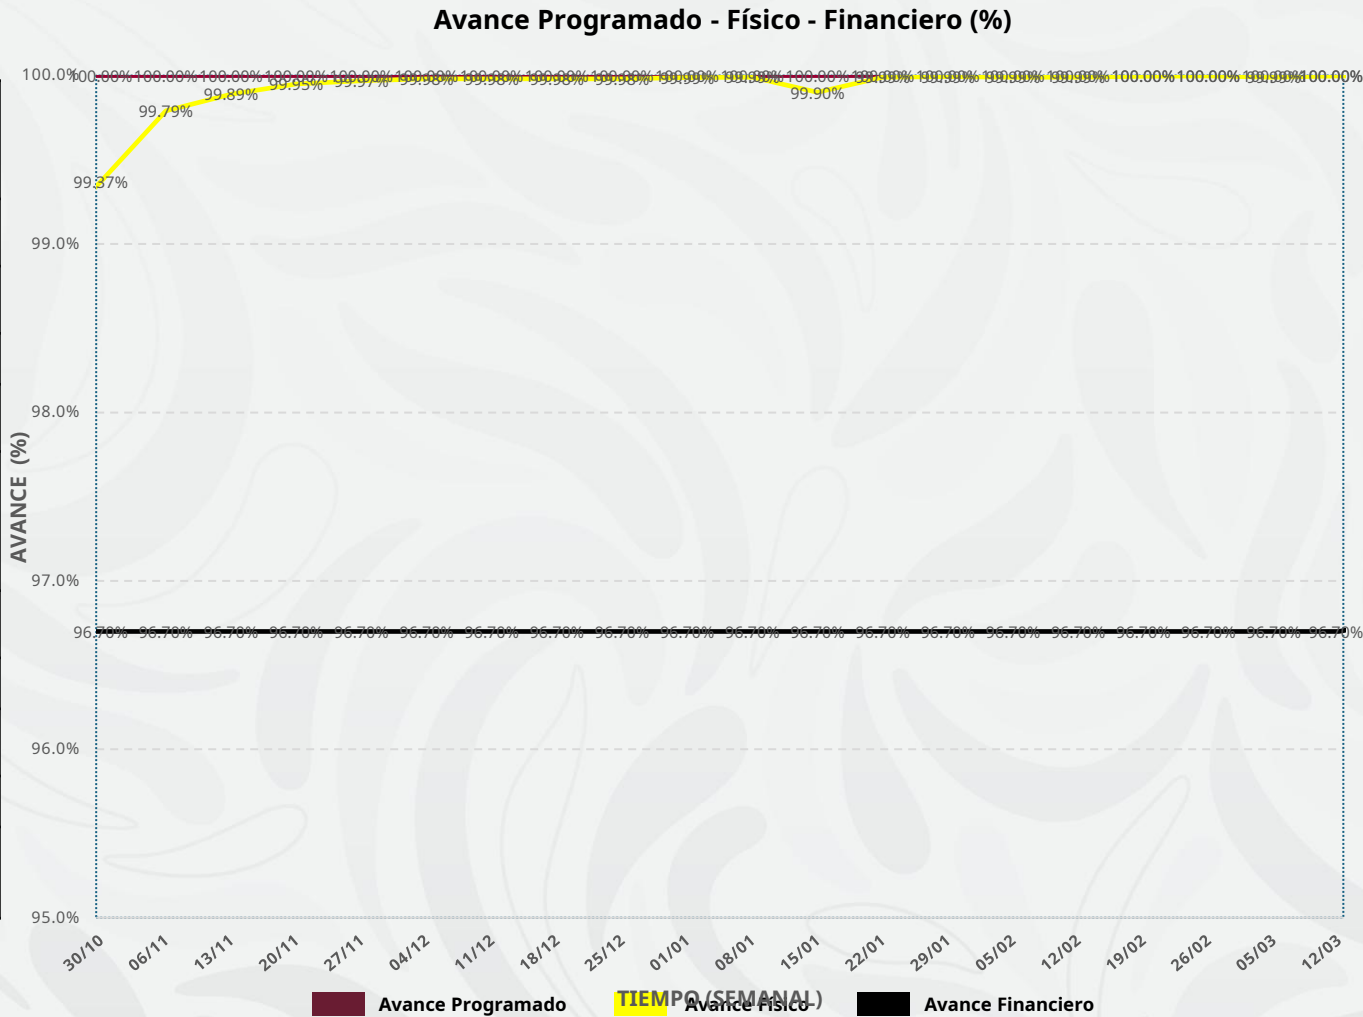

	06 de marzo al 12 de marzo	13 de marzo al 19 de marzo
Fuerza de Trabajo (personas)	120	120
Maquinaria	15	15
Frente de Trabajo	Ramal Aeropuerto, Plaza de Cobro km 05+900	Ramal Aeropuerto, Plaza de Cobro km 05+900
