


Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

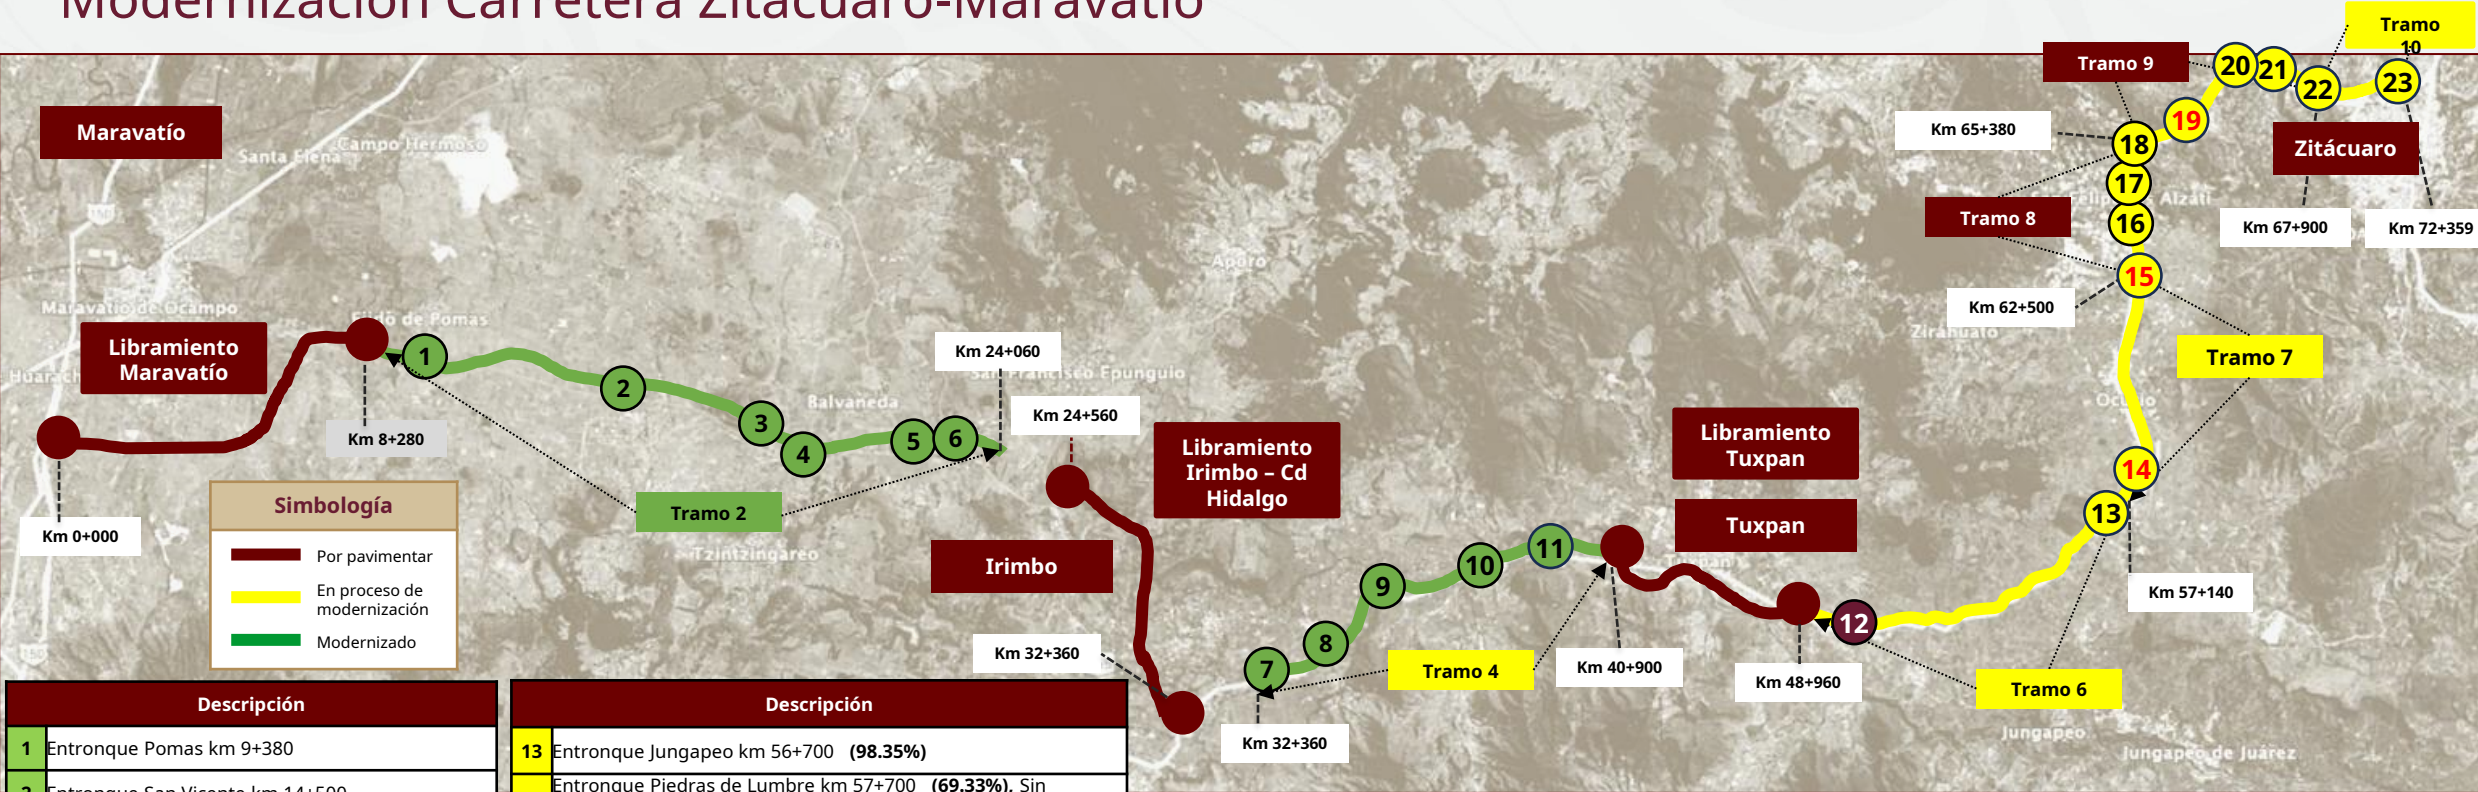

Descripción	
1	Entronque Pomas km 9+380
2	Entronque San Vicente km 14+500
3	PIP km 18+370
4	Entronque Zinzingareo km 18+700
5	Entronque Senguio km 21+280
6	PIP km 22+280
7	Entronque Santa Rosa km 32+420
8	Entronque Ziranda-Jaripeo km 33+500
9	Puente Turundeo Km 36+460 (100.00%),
10	Entronque Turundeo I km 37+550 (100.00%),
11	Entronque Turundeo II km 38+780 (100.00%),
12	Puente Obispo Km 50+400 (0.00%), Sin Iniciar

Descripción	
13	Entronque Jungapeo km 56+700 (98.35%)
14	Entronque Piedras de Lumbre km 57+700 (69.33%), Sin actividad, pendiente suministro de base hidráulica en ampliación de corona.
15	Entronque Zirahuato km 62+500 (62.01%), Pendiente tendido de base asfáltica en ampliaciones de corona
16	Entronque San Felipe I km 64+400 (35.04%)
17	Entronque San Felipe II Km 64+640 (35.04%)
18	Entronque Macutzio km 65+620 (25.72%)
19	Entronque Valle Verde km 67+220 (71.96%), Falta tendido de carpeta asfáltica.
20	Entronque Curungueo I Km 68+240 (75.30%)
21	Entronque Curungueo II Km 68+780 (75.30%)
22	Puente San Juan Viejo Km 69+860 (96.61%)
23	PSV Zitácuaro Km 72+160 (95.55%)

- Avance físico**
- Programado: 60.49% (Reprogramación T8)
 - Real: 62.89%
 - Semanal: 0.35%
 - Financiero: 17.56%

Nota 1:
Los avances se calculan en relación a la Inversión total del Ramal

Nota 2:
Las Estructuras en proceso remarcadas en color rojo, no presentan avance en el periodo semanal, o no han iniciado.

**Inversión:** \$4,575.3 mdp (total Ramal)
\$3,048.81 mdp (modernización)
\$1,526.49 mdp (Libramientos)

**4,800 empleos generados**

**Meta:** 71.3 Km

**126,000 habitantes beneficiados**

**Inicio:** septiembre 2020
Reinicio: 27 de enero de 2024
Término: 31 de diciembre de 2026

**Ahorro en tiempo:** 25 min

Concesionaria: Red de carreteras de occidente


Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

				TERRACERIAS		Observaciones
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 13 mar al 19 mar 26		
				Programad o	Ejecutado	
Cortes (m3)	705,558.00	767,163.86	-61,605.86	0.00	2,543.46	
Terraplén (m3)	445,687.00	441,064.37	4,622.63	1,489.73	3,570.83	
Subyacente (m3)	256,097.00	266,026.66	-9,929.66	720.46	1,636.17	
Subrasante (m3)	170,688.00	172,606.76	-1,918.76	0.00	1,022.41	

PAVIMENTOS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 13 mar al 19 mar 26		Observaciones
				Programad o	Ejecutado	
Base Hidráulica (m3)	125,659.04	122,028.53	3,630.51	704.35	688.22	
Bacheo (m3)	1,800.00	1,821.75	-21.75	60.00	4.50	SE ESTÁN TRABAJANDO TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 6 Y 7.
Fresado (m3)	10,676.00	10,745.35	-69.35	23.54	20.37	SE ESTÁN TRABAJANDO TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 6 Y 7.
Rayado Carpeta (Ha)	30.24	29.27	0.97	0.16	0.05	EN PROCESO TRAMO 6
Base Asfáltica (m3)	120,414.05	120,384.83	29.22	916.55	388.35	SE ESTÁN TRABAJANDO TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 6
Carpeta Asfáltica (m3)	45,247.80	31,081.52	14,166.28	124.21	445.68	SE ESTÁN TRABAJANDO TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 6

ESTRUCTURAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 13 mar al 19 mar 26		Observaciones
				Programad o	Ejecutado	
PSV SAN FELIPE	1.00	0.5095	0.4905	0.0699	0.0318	CONFORMACIÓN DE TERRACERÍAS
PSV SAN JUAN VIEJO	1.00	0.9661	0.0339	0.0024	0.0011	APROCHE DE CABEZALES
PSV ZITÁCUARO	1.00	0.9555	0.0445	0.0654	0.0007	COLOCACION DE DEFENSA METÁLICA
DEFENSA METÁLICA	35,327.00 ml	30,871.92 ml	4,455.08 ml	426.23 ml	496.50 ml	CONTINÚA LA COLOCACION EN TRAMO 4 Y 10
BALIZAMIENTO	157,137.60 ml	79,362.90 ml	77,774.70 ml	2,897.08 ml	1,091.95 ml	CONTINÚA LA COLOCACION EN TRAMO 4 y 6
BOTONES	12,041.00 pza	9,275.00 pza	2,766.00 pza	83.00 pza	35.00 pza	CONTINÚA LA COLOCACION EN TRAMO 4.
VERTICAL BAJO	1,011.00 pza	635.00 pza	376.00 pza	18.00 pza	14.00 pza	CONTINÚA LA COLOCACION EN TRAMO 4.

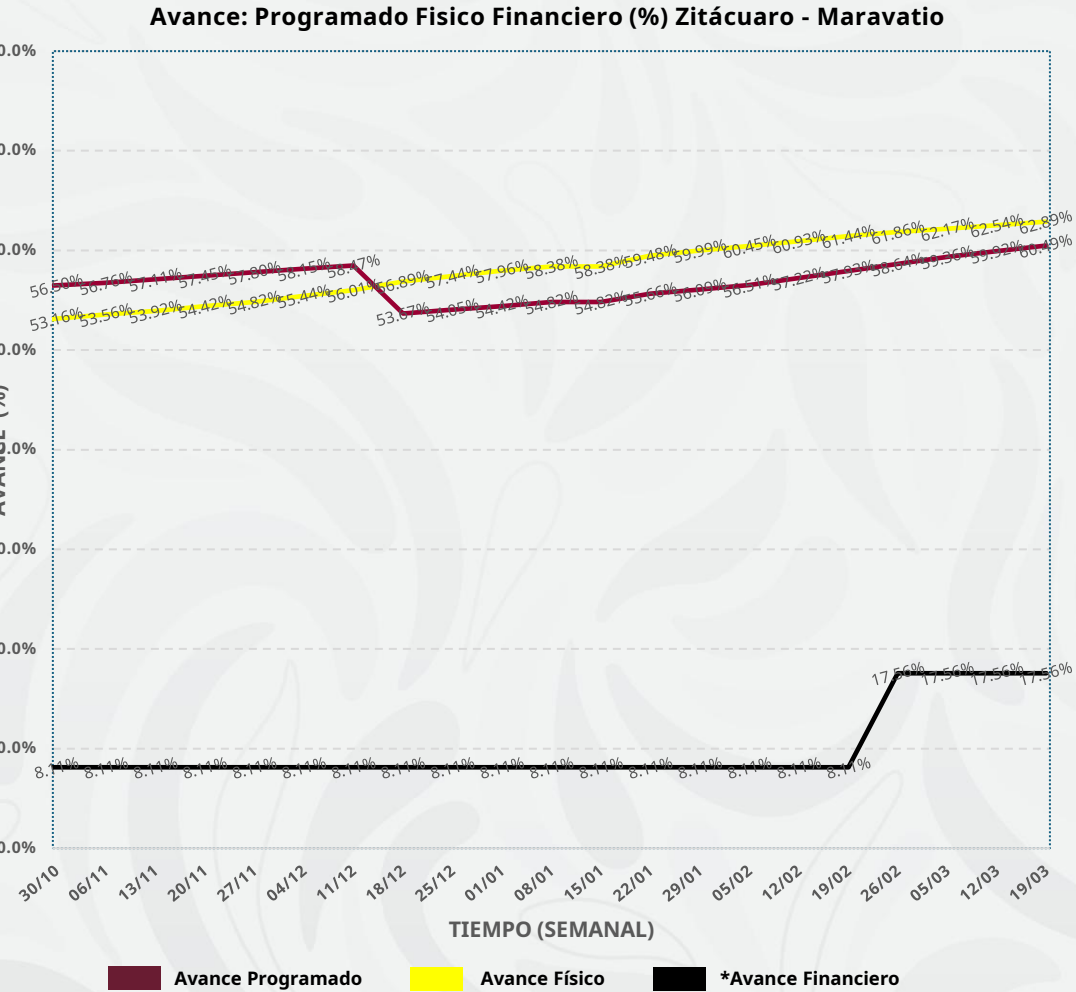

	Del 06 al 12 mar 26	Del 13 al 19 mar 26
Fuerza de Trabajo (personas)	290	285
Maquinaria	191	191
tramos activos	IV, VI, VII, VIII, IX, X	IV, VI, VII, VIII, IX, X
Frentes de trabajo (totales)	29	29
