

Colima

Tramo Armería-Manzanillo

Avance físico

• Programado: 100.00%

• Real: 42.30%

• Semanal: 0.28%

• Financiero: 35.25%



Descripción	
1	Puente Armería I km 45+500 (87%) Faltan trabajos de muros pantalla, cono de derrame y muro gavión en cimentación
2	Entronque Paraíso km 47+741 (100%)
3	PSFFCC Armería II km 50+100 (100%)
4	PSV Tilapia km 54+350 (100%)
5	Puente Palo Verde I km 55+950 (100%).
6	Puente Palo Verde II km 56+650 (92%)
7	PIV Ent. Salinero II km 59+500 (88%) Falta fuerza de trabajo
8	Entronque Salineros km 59+551 (27%) Está pendiente definición de Muros de Contención
9	PSFFCC Salinero I km 60+500 (93%) Faltan trabajos de cono de derrame, carpeta asfáltica lado izquierdo
10	Entronque Cuyutlán km 60+800 (A la espera de regularización de catálogo)
11	PIV Retorno en U km 77+600 (71%) Sin trabajos programados
12	Entronque Retorno en U km 77+600 (A la espera de regularización de catálogo)
13	PSFFCC Tepalcates I km 80+240(52.5%) Se tienen diafragmas CI y se encuentra en marcha cimbra de losa.
14	Entronque Tepalcates I km 79+660 (A la espera de regularización de catálogo)
15	Puente Nuevo Tepalcates II km 81+581
16	Entronque Tepalcates II km 80+500
17	Entronque 83+500 km (42%) No se tiene Fuerza de Trabajo Suficiente
18	Puente Adjuntas km 86+420 (89%)
19	PSV Panteones km 87+760 (14%) Solo se han trabajado traves
20	Entronque Panteones km 87+760
21	PIV Minatitlán Lib km 92+000 (4%) Se detuvieron trabajos por interferencia con instalaciones de CFE.
22	PIV Minatitlán Lib. II km 92+000 (64%)
23	Entronque Minatitlán km 92+731
24	PIV Minatitlán Lib I km 93+000 (16%)
25	Puente Canal km 93+220 (54%) Se realizó cambio de tránsito a Cuerpo Derecho
26	Entronque Jalipa km 94+400 (25%) Se movió la fuerza de trabajo
27	Puente Jalipa km 94+158 (74%)
OS	PSV Obra social retorno en U 49+900 (100%)


Colima

Tramo Armería-Manzanillo

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	20/03/26 al 26/03/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Volúmenes de Obra en Troncal						
Cortes (m³)	210,113	289,232	0	0	0	El programa origen para los trabajos que se ejecutan en la troncal llegó a su fin. Se está solicitando a la concesionaria entregue la reprogramación de los trabajos para concluir dentro del plazo establecido
Terraplenes (m³)	813,909	566,979	246,930	0	1,076	
Base y sub base (m³)	260,119	187,770	72,349	0	1,276	

NOTA: Los precios y avances mostrados en este reporte son con respecto a los catálogos y contrato vigente. El volumen programado proviene de un programa provisional. Se está trabajando en un nuevo programa.

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

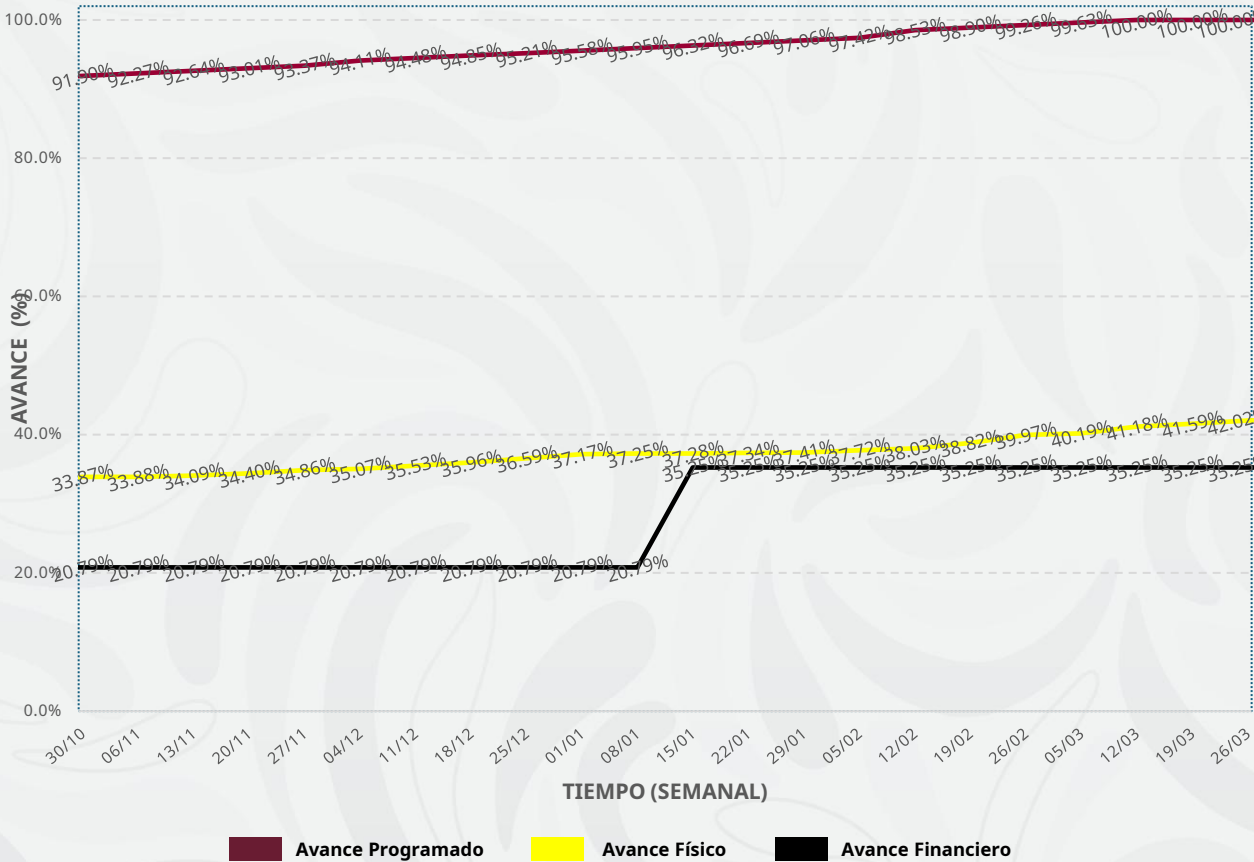

	13 de marzo al 19 de marzo	20 de marzo al 26 de marzo
Fuerza de Trabajo (personas)	117	23
Maquinaria	62	8
Frente de trabajo	Del Km 45+286 al Km 45+760 Del Km 56+000 al Km 57+740 Del Km 74+335 al Km 77+820 Del Km 94+220 al Km 94+640	Del Km 56+000 al Km 57+600 Del Km 66+000 al Km 71+830
