


Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha

Concesionaria: IDEAL
Constructora: MOTA-ENGIL, S.A. de C.V.

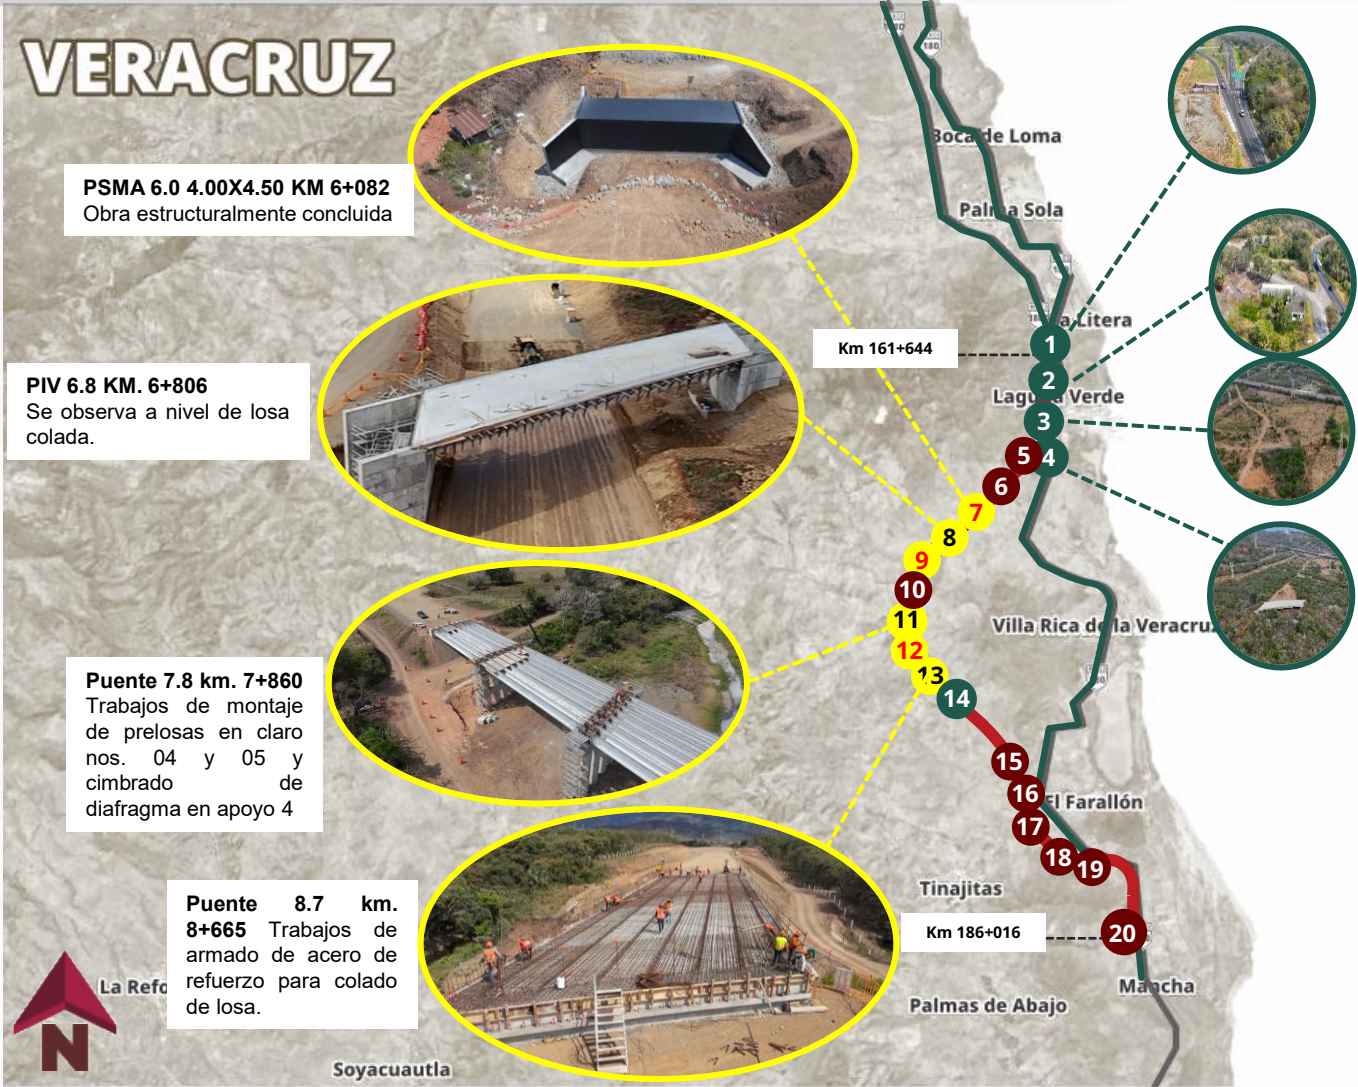

Descripción	
1	Entronque Laguna Verde II Km 0+000
2	PSMA 1.5 Km 1+555.5
3	PSMA 2.7 Km 2+703.91
4	PIV 3.05 Km 3+041
5	Entronque Laguna Verde I Km 3+041
6	PSMA 3.9 Km 3+900
7	PSMA 6.0 Km 6+080 (97.00%) estructuralmente concluida, pendiente trabajos de aproche.
8	PIV 6.8 Km 6+806 (96.00%)
9	PIV 7.04 Km 7+040 (5.00%) Se continua con la evaluación de la reubicación de la estructura.
10	PUENTE 7.3 Km 7+330
11	PUENTE 7.8 Km 7+815, (56.60%) Pendiente montaje de travesaños en claro no. 01; se realiza el montaje de prelosas en claros no. 04 y 05 y cimbrado de diafragma en apoyo 4.
12	PLAZA DE COBRO Km 8+300, (16.00%) El proyecto ejecutivo está en revisión en la DGDC.
13	PUENTE 8.7 Km 8+665, (70.00%) Trabajos de armado de acero de refuerzo para colado de losa.
14	PSMA 8.9 Km 8+960, (100.00%)
15	PUENTE 14 Km 14+000
16	PUENTE 14.7 Km 14+700
17	PSV Km 14+900
18	PSMA 15.3 Km 15+370
19	PSV 16.8 Km 16+800
20	ENTRONQUE LA MANCHA Km 19+841

Avance físico

- Programado: 69.83%
- Real: 27.70% Incluye Ent. Chapachapa
- Financiero: 15.64%
- Semanal: 1.05%

Inversión: 2,252.78 mdp

Inicio: Marzo de 2025
Término: Agosto de 2026

Meta: 19.84 km, 5 Puentes, 1 Plaza de Cobro, 3 Entronques, 2 PSVs, 3 PIVs, 6 PSMA, 59 ODTs y el Entronque Chapachapa

2,252.78 (1)=2,253 empleos directos generados/millón de inversión
2,252.78 (2)= 4,506 empleos indirectos generados/millón de inversión

128,000 habitantes beneficiados

45 minutos de ahorro en tiempo, Tramo 4

Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha

Concesionaria: IDEAL
Constructora: MOTA-ENGIL, S.A. de C.V.



Simbología	
	Por construir
	En proceso de construcción
	Concluido

Descripción	
1	Entronque Chapachapa Km 739+733 (Km op. 92+512) (100.00%)
2	ODT 92+827.25 (100.00%)
3	PSPyG 92+832.22 (100.00%)
4	Ampliación de ODT 100+102, (100.00%)

Avance físico

- Real: 100.00%
- Programado: 100.00%
- Financiero: 75.01%
- Semanal: 0.00%

Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	19/03/26 al 26/03/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Tramo 4 Laguna Verde - La Mancha						
Volúmenes de obra						
Desmonte	117.13	40.37	76.76	4.88	5.58	El volumen programado corresponde a los 19.8 km y solo se trabaja en 7.4 km .
Corte	1,414,039.20	170,022.70	1,244,016.50	27,193.00	3,312.62	El volumen programado corresponde a los 19.8 km y solo se trabaja en 7.4 km .
Terraplén	1,155,915.50	189,728.43	966,187.07	20,641.00	10,052.28	El volumen programado corresponde a los 19.8 km y solo se trabaja en 7.4 km .
Subyacente	162,462.20	58,054.72	104,407.48	27,077.03	2,101.02	El volumen programado corresponde a los 19.8 km y solo se trabaja en 7.4 km .
Subrasante	124,961.00	13,247.95	111,713.05	17,851.57	680.42	El volumen programado corresponde a los 19.8 km y solo se trabaja en 7.4 km .
Pedraplén	97,038.03	48,190.51	48,847.52	4,043.25	3,007.99	El volumen programado corresponde a los 19.8 km y solo se trabaja en 7.4 km .
Estructuras Laguna Verde - La Mancha						
Zapata	4	2	2	0	0	PIV 6.8 Km 6+806 Estribo 01 en espera de reajuste de zapata.
Losa superior	1	1	0	1	1	PIV 6.8 Km 6+806 a nivel de losa colada.

