


Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

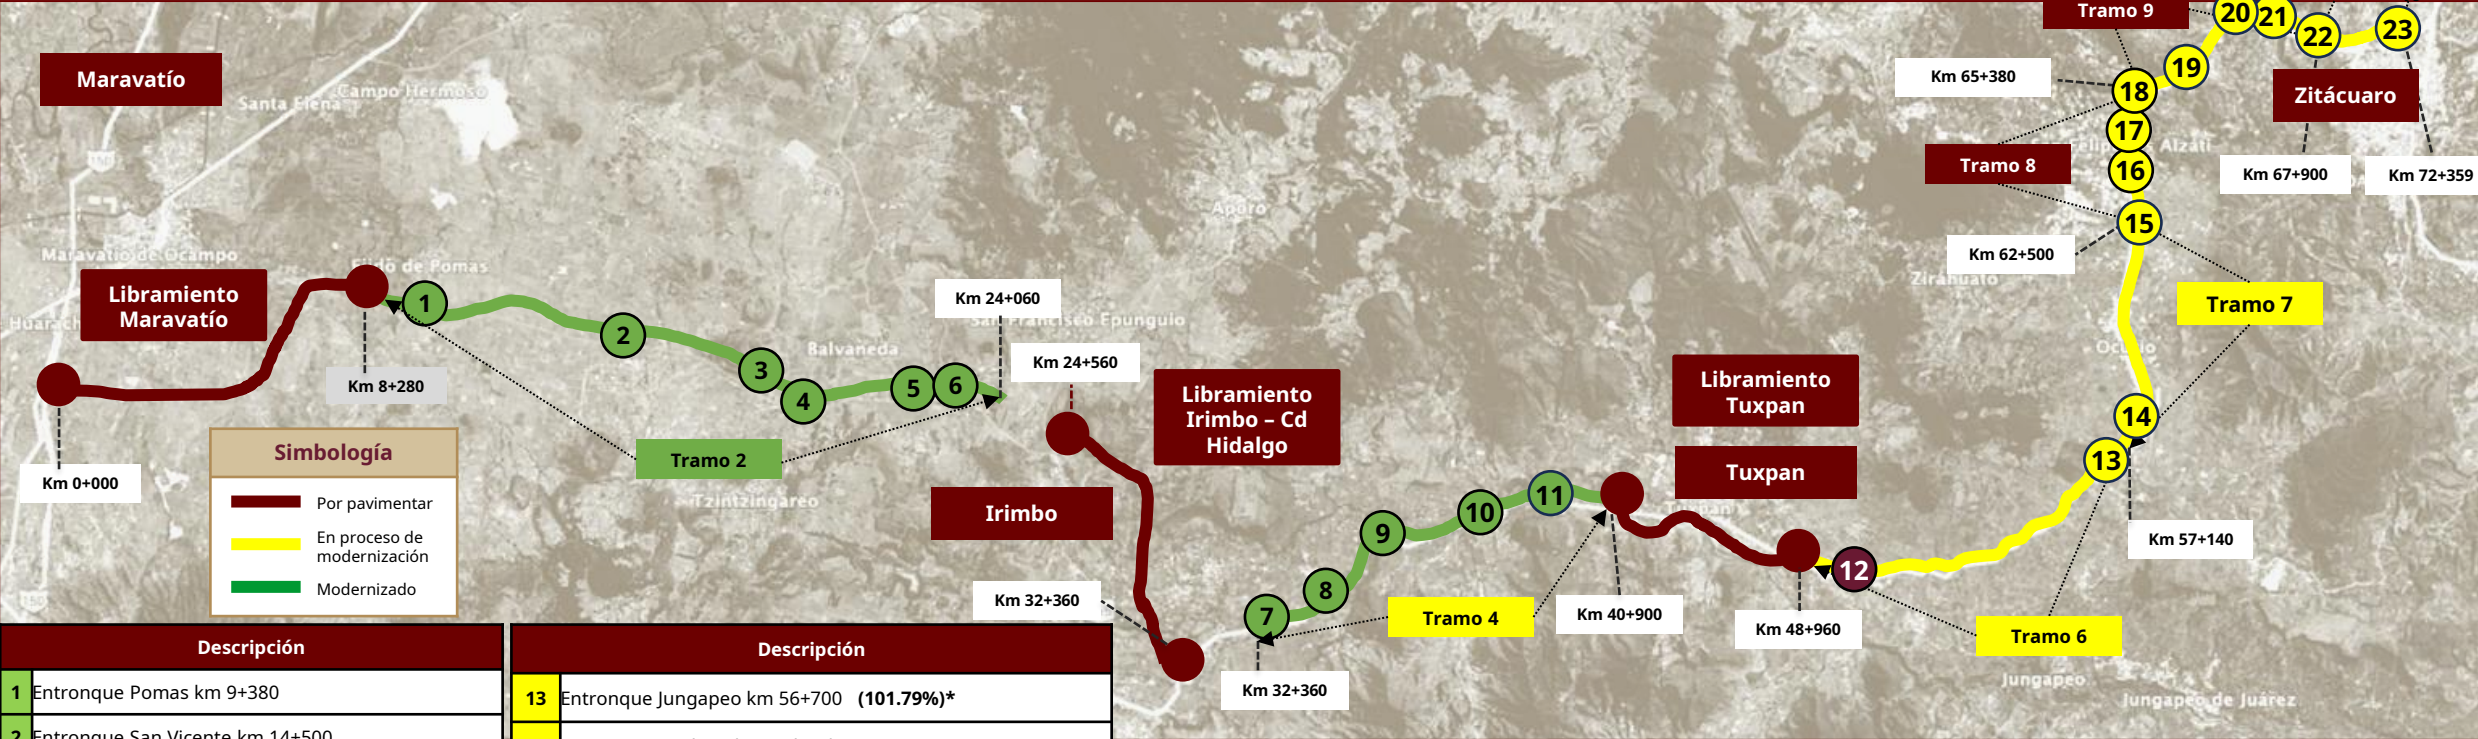

Descripción		Descripción	
1	Entronque Pomas km 9+380	13	Entronque Jungapeo km 56+700 (101.79%)*
2	Entronque San Vicente km 14+500	14	Entronque Piedras de Lumbre km 57+700 (69.73%)
3	PIP km 18+370	15	Entronque Zirahuato km 62+500 (62.08%)
4	Entronque Zinzingareo km 18+700	16	Entronque San Felipe I km 64+400 (37.31%)
5	Entronque Senguio km 21+280	17	Entronque San Felipe II Km 64+640 (37.31%)
6	PIP km 22+280	18	Entronque Macutzio km 65+620 (26.85%)
7	Entronque Santa Rosa km 32+420	19	Entronque Valle Verde km 67+220 (77.79%)
8	Entronque Ziranda-Jaripeo km 33+500	20	Entronque Curungueo I Km 68+240 (79.66%)
9	Puente Turundeo Km 36+460	21	Entronque Curungueo II Km 68+780 (79.66%)
10	Entronque Turundeo I km 37+550	22	Puente San Juan Viejo Km 69+860 (96.72%)
11	Entronque Turundeo II km 38+780	23	PSV Zitácuaro Km 72+160 (95.62%)
12	Puente Obispo Km 50+400 (0.00%), Sin Iniciar		

Avance físico

- Programado: 61.05% (Reprogramación T8)
- Real: 63.36%
- Semanal: 0.47%
- Financiero: 17.56%

Nota 1:

Los avances se calculan en relación a la Inversión total del Ramal

*Transición de PSV a PIV con incremento en volúmenes de obra y ejecución.



Inversión: \$4,575.3 mdp (total Ramal)
\$3,048.81 mdp (modernización)
\$1,526.49 mdp (Libramientos)



4,800 empleos generados



Meta: 71.3 Km



126,000 habitantes beneficiados



Inicio: septiembre 2020
Reinicio: 27 de enero de 2024
Término: 31 de diciembre de 2026



Ahorro en tiempo: 25 min


Concesionaria: Red de carreteras de occidente

Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

Zitácuaro - Maravatío

TERRACERIAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 20 mar al 26 mar 26		Observaciones
				Programad o	Ejecutado	
Cortes (m3)	705,558.00	769,707.32	-64,149.32	0.00	2,543.46	
Terraplén (m3)	445,687.00	444,635.21	1,051.79	1,489.73	3,570.83	
Subyacente (m3)	256,097.00	267,662.84	-11,565.84	720.46	1,636.18	
Subrasante (m3)	170,688.00	173,629.16	-2,941.16	0.00	1,022.41	
PAVIMENTOS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 20 mar al 26 mar 26		Observaciones
				Programad o	Ejecutado	
Base Hidráulica (m3)	125,659.04	122,827.96	2,831.08	704.35	799.43	
Bacheo (m3)	1,800.00	1,826.25	-26.25	60.00	4.50	SE ESTÁN TRABAJANDO TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 6 Y 9
Fresado (m3)	10,676.00	10,755.21	-79.21	23.54	9.86	SE ESTÁN TRABAJANDO TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 6 Y 9
Rayado Carpeta (Ha)	30.24	29.33	0.91	0.16	0.05	SE ESTÁN TRABAJANDO TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 6 Y 9
Base Asfáltica (m3)	120,414.05	120,694.03	-279.98	916.55	309.19	SE ESTÁN TRABAJANDO TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 6 Y 9
Carpeta Asfáltica (m3)	45,247.80	32,313.43	12,934.37	124.21	1,231.91	
ESTRUCTURAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 20 mar al 26 mar 26		Observaciones
				Programad o	Ejecutado	
PSV SAN FELIPE	1.00	0.5138	0.4862	0.0699	0.0043	CONFORMACIÓN DE TERRACERÍAS
PSV SAN JUAN VIEJO	1.00	0.9672	0.0328	0.0024	0.0011	APROCHE DE CABEZALES
PSV ZITÁCUARO	1.00	0.9562	0.0438	0.0654	0.0007	CONFORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA
DEFENSA METÁLICA	35,327.00 ml	31,368.42 ml	3,958.58 ml	426.23 ml	496.50 ml	
BALIZAMIENTO	157,137.60 ml	80,454.85 ml	76,682.75 ml	2,897.08 ml	1,091.95 ml	CONTINÚA LA COLOCACION EN TRAMO 4 y 6
CUNETAS	12,028.95 ml	10,682.63 ml	1,346.32 ml	222.57 ml	24.50 ml	CONTINÚA LA CONSTRUCCIÓN EN TRAMO 6
BOTONES	12,041.00 pza	9,310.00 pza	2,731.00 pza	83.00 pza	35.00 pza	CONTINÚA LA COLOCACION EN TRAMO 4.
VERTICAL BAJO	1,011.00 pza	650.00 pza	361.00 pza	18.00 pza	14.00 pza	CONTINÚA LA COLOCACIÓN EN TRAMO 4.

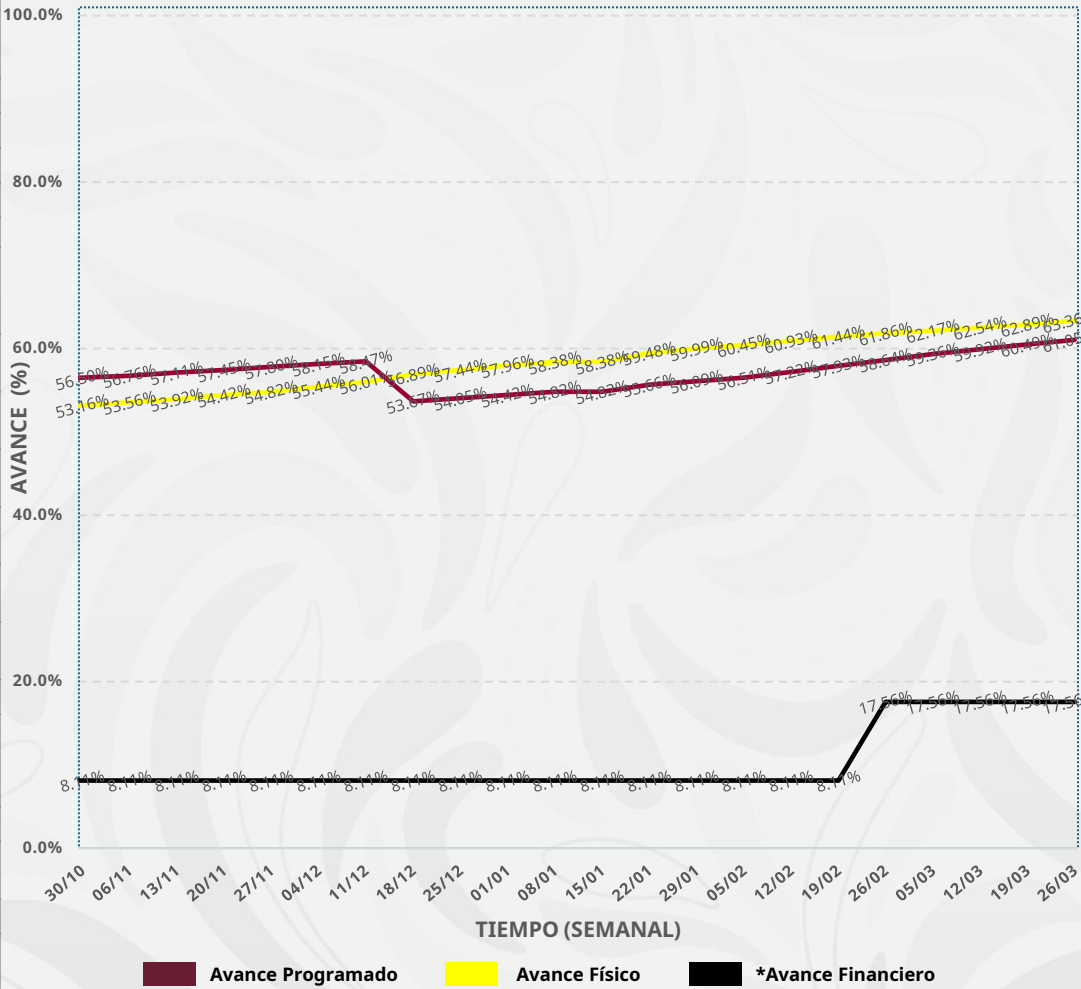

	Del 13 al 19 mar 26	Del 20 al 26 mar 26
Fuerza de Trabajo (personas)	285	287
Maquinaria	191	190
tramos activos	IV, VI, VII, VIII, IX, X	IV, VI, VII, VIII, IX, X
Frentes de trabajo (totales)	29	28
