

Estado de México

Atizapán-Atlacomulco



Descripción	
1	Entronque Chiluca 15.00% , (sin actividad, falta de recursos)
2	Viaducto Sin Nombre km 20+880.00 60.50% (bancos de apoyo)
3	Viaducto La Estadía km 22+332.00 67.50% (colado de bancos de apoyo)
4	Viaducto Los Gallos km 27+425.00 56.05%
5	Túnel Los Gallos km 27+770.00 95.00% , (sin actividad, faltan todos los elementos electromecánicos y pavimento)
6	Viaducto Sin Nombre km 31+033.00 60.59%
7	Viaducto Tlazala km 31+359.00 52.25% (reprogramación de empuje a 9/06/2026)
8	Túnel Cahuacán I km 36+258.00 95.00% , (sin actividad, faltan todos los elementos electromecánicos y pavimento)
9	Viaducto Cahuacán III km 38+995.00 27.36% (se reanudan actividades: cepillado de acero de refuerzo intemperizado)
10	Viaducto Sin Nombre km 42+053.00 10.48% (habilitado de zapata y avance en trepas)
11	Entronque Villa del Carbón km 47+974.00 00.00% (no se han iniciado trabajos)
12	Viaducto El Llano km 51+016.00 00.90% (sin actividad, problemas sociales)
13	Viaducto Sin Nombre km 54+770.00 03.80% , sin actividad, problemas sociales
14	Viaducto Los Chaparrales km 73+387.00 00.00% (no se han iniciado trabajos)
15	Viaducto El Pescado km 75+482.00 3.00% (no se han iniciado trabajos)
16	Entronque Ixtlahuaca km 76+188.00 35.00% , (sin actividades, problemas sociales)
17	Entronque La Luna km 83+960.00 00.00% (no se han iniciado trabajos)
18	Viaducto El Salto km 91+874.00 16.80% , (sin actividad, problemas sociales)
19	Entronque Atlacomulco

Inversión: 9,865.8 mdp a precios de 2014 incluye I.V.A., incluye monto de obra (7,662mdp) y Fondo de Obra Adicional (843 mdp)

Inicio: 01 marzo 2016
Término: 30 junio 2027

Avance físico:

- Programado: % 100.00
- Real: % 42.02
- Financiero: % 17.45
- Semanal: % 00.20
- Real respecto al ejecutable por DDV: % 100.00
- Financiero respecto al ejecutable por DDV: % 79.14

132,909 empleos generados
 (44,303 directos y 88,606 indirectos)

1 millón 244 mil habitantes beneficiados

60 minutos de ahorro en tiempo

Nota 1 : Se tiene una actualización de proyecto, presupuesto y reprogramación con nueva fecha de término. Sin embargo, la reprogramación no se encuentra regularizada con la SICT.


Nota 2: Por problemáticas sociales y climatológicas, solo se cuenta con 16.32 Km disponibles para trabajar

Meta: 74 km, 2 Plazas de cobro, 12 Viaductos, 2 Túneles, 4 Entronques, 80 PSVyG

Estado de México

Atizapán-Atlacomulco

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	21/05/2026 al 28/05/2026		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Pilotes	344	208.0	136.0	0	1.00	Se programó empuje de segunda dovela del Viaducto Tlazala para el 4 de junio. La mano de obra se incrementó un poco para alcanzar las expectativas correspondientes.
Zapatas	86	52.0	34.0	0	0.50	
Columnas	96	30.0	66.0	0	0.00	
Cabezales	76	15.1	60.9	0	0.40	
Caballetes	24	9.5	14.5	0	0.00	
Trabes de concreto	395	12.0	383.0	0	1.00	
Trabes metálicas	29	2.5	26.5	0	0.60	

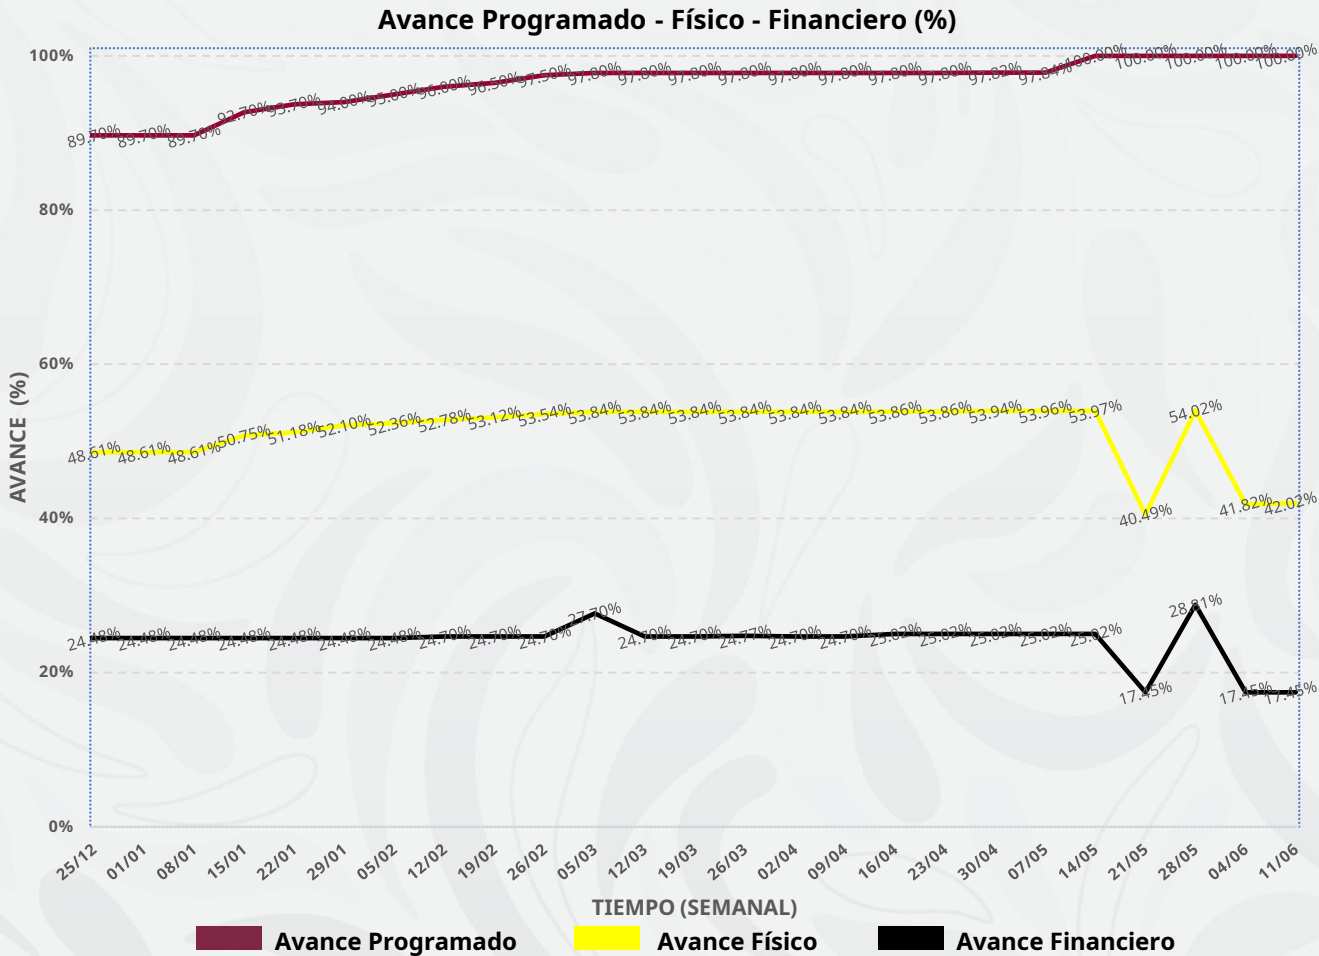

	Del 29 de mayo al 04 de junio	Del 06 al 11 de junio
Fuerza de Trabajo (personas)	2,765	2,726
Maquinaria	466	676
Frentes de trabajo	Tramos 01, 2A y 2B	Tramos 01, 2A y 2B
