



Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha

Concesionaria: IDEAL
Constructora: MOTA-ENGIL, S.A. de C.V.

VERACRUZ

PUENTE 7.3 KM 7+373 TRABAJOS DE COLADO DE CABEZAL EN CARGADERO 1 Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA CABEZAL EN APOYO 2.

PUENTE 7.8 KM 7+815 TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE PRELOSAS CLAROS Nos. 3-4

Simbología

- Por construir
- En proceso de construcción
- Concluido

Soyacuautila



Descripción	
1	Entronque Laguna Verde II Km 0+000
2	PSMA 1.5 Km 1+555.5
3	PSMA 2.7 Km 2+703.91
4	PIV 3.05 Km 3+041
5	Entronque Laguna Verde I Km 3+041
6	PSMA 3.9 Km 3+900 (5.00%) (se movió la fuerza de trabajo)
7	PSMA 6.0 Km 6+080
8	PIV 6.8 Km 6+806 (96.00%) (se movió la fuerza de trabajo)
9	PIV 7.04 Km 7+040 (5.00%) (Se continua con la evaluación de la reubicación de la estructura).
10	PUENTE 7.3 Km 7+330 (30.00%) (Trabajos de colado de cabezal en cargadero 1 y armado de acero de refuerzo para cabezal en apoyo 2).
11	PUENTE 7.8 Km 7+815, (62.10%) (Trabajos de colocación de prelosas claros nos. 3-4)
12	PLAZA DE COBRO Km 8+300, (16.00%) El proyecto ejecutivo está en revisión en la DGDC.
13	PUENTE 8.7 Km 8+665, (96.00%) (a nivel de losa colada)
14	PSMA 8.9 Km 8+960,
15	PUENTE 14 Km 14+000
16	PUENTE 14.7 Km 14+700
17	PSV Km 14+900
18	PSMA 15.3 Km 15+370
19	PSV 16.8 Km 16+800
20	ENTRONQUE LA MANCHA Km 19+841

Avance físico

- Programado: 89.14%
- Real: 35.71% Incluye Ent. Chapachapa
- Financiero: 17.06%
- Semanal: 0.67%



Inversión: 2,252.78 mdp



Inicio: Marzo de 2025
Término: Diciembre de 2026



Meta: 19.84 km, 5 Puentes, 1 Plaza de Cobro, 3 Entronques, 2 PSVs, 3 PIVs, 6 PSMAs, 59 ODTs y el Entronque Chapachapa



2,252.78 (1)=2,253 empleos directos generados/millón de inversión
2,252.78 (2)= 4,506 empleos indirectos generados/millón de inversión



128,000 habitantes beneficiados



45 minutos de ahorro en tiempo, Tramo 4

Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha

Concesionaria: IDEAL
Constructora: MOTA-ENGIL, S.A. de C.V.



Avance físico

- Real: 100.00%
- Programado: 100.00%
- Financiero: 75.01%
- Semanal: 0.00%

Descripción	
1	Entronque Chapachapa Km 739+733 (Km op. 92+512)
2	ODT 92+827.25
3	PSPyG 92+832.22
4	Ampliación de ODT 100+102,


Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha



Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	04/06/26 al 11/06/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Tramo 4 Laguna Verde - La Mancha						
Volúmenes de obra						
Terraplén	1,155,915.50	225,460.11	930,455.39	20,641.00	1,380.43	El volumen programado corresponde a los 19.8 km y solo se trabaja en 8.5 km .
Pedraplén	97,038.03	54,490.54	42,547.49	4,043.25	384.09	El volumen programado corresponde a los 19.8 km y solo se trabaja en 8.5 km .
Subyacente	162,462.20	71,463.85	90,998.35	27,077.03	295.30	El volumen programado corresponde a los 19.8 km y solo se trabaja en 8.5 km .
Subrasante	124,961.00	23,681.94	101,279.06	17,851.57	1,081.35	El volumen programado corresponde a los 19.8 km y solo se trabaja en 8.5 km .
Base Hidráulica	54,900.80	18,970.15	35,930.65	9,150.13	2,681.46	El volumen programado corresponde a los 19.8 km y solo se trabaja en 8.5 km .
Riego de impregnación	274,504.00	49,325.09	225,178.91	45,750.67	12,384.67	El volumen programado corresponde a los 19.8 km y solo se trabaja en 8.5 km .
Estructuras Tramo 4 Laguna Verde – La Mancha						
Cargaderos	2	2	0	0	2	Puente 7.3 Km 7+373
Apoyos	2	2	0	0	2	Puente 7.3 Km 7+373
Cabezales	4	2	2	1	2	Puente 7.3 Km 7+373 Trabajos de colado de cabezal en cargadero 1 y se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo para cabezal del apoyo 2. Cabezal de cargadero 2 colado.
Cargaderos	2	2	0	0	2	Puente 7.3 Km 7+373

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

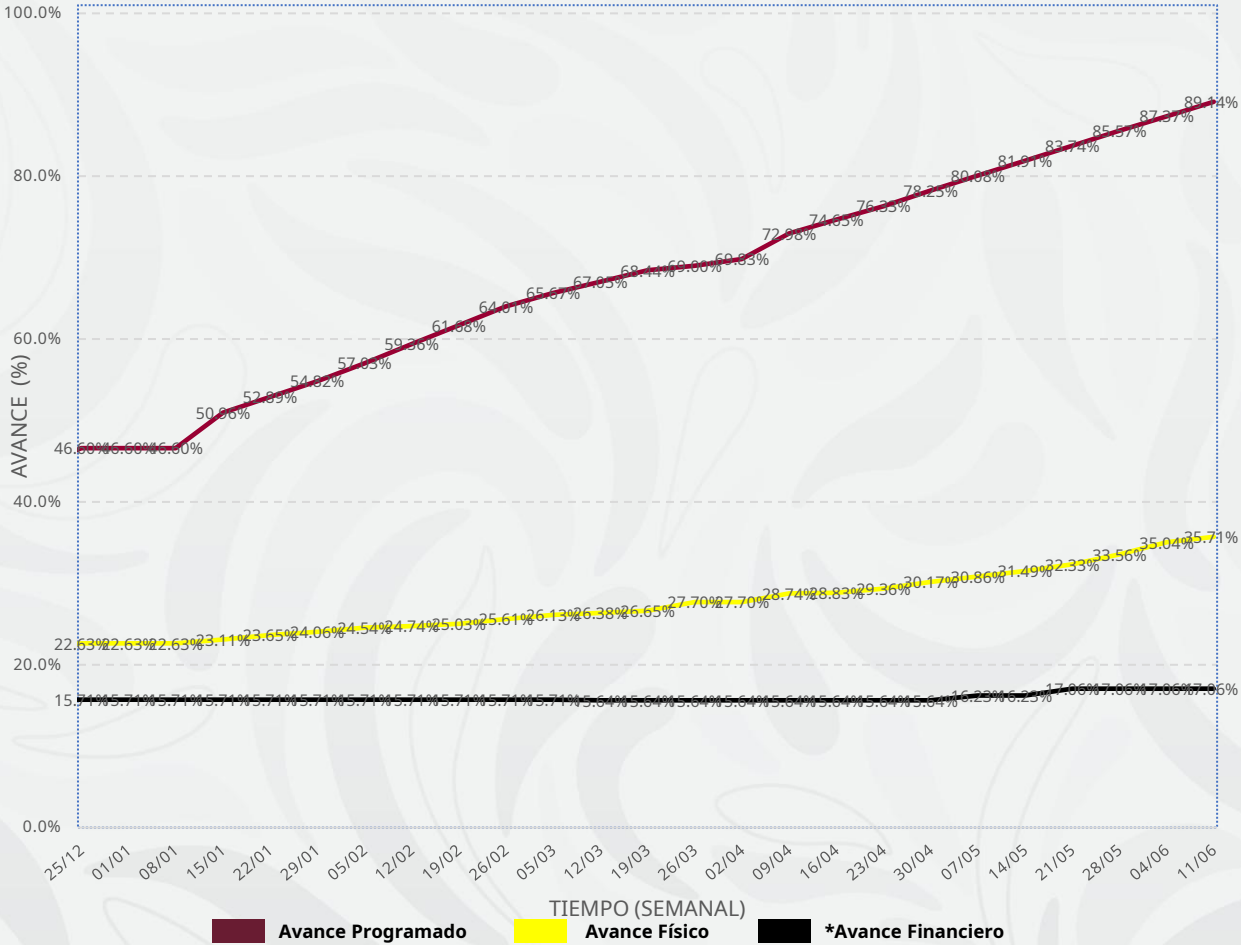

	29 de mayo al 04 de junio	05 de junio al 11 de junio
Fuerza de Trabajo (personas)	211	270
Maquinaria	42	47
