

San Luis Potosí

La Pitahaya-Libramiento Oriente de S.L.P. y El Ramal Villa de Reyes



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance físico • Programado: **11.55%**
• Real: **7.54%**

Avance financiero: 8.53%



Inversión: 8,331.12 mdp. Incluye I.V.A.



Inicio: 14 de agosto 2025
Término: 14 de febrero 2028



Meta: 68.5 km. + 2.4 Km del Ramal
79 Estructuras; Puentes, PSV'S, PSFCC, PIV'S.
1 Plaza de Cobro, 5 Entronques,
165 ODT'S.

Concesionaria: META




2000 Empleos directos generados
600 Empleos indirectos generados



128 000 habitantes beneficiados



20 minutos de ahorro en tiempo

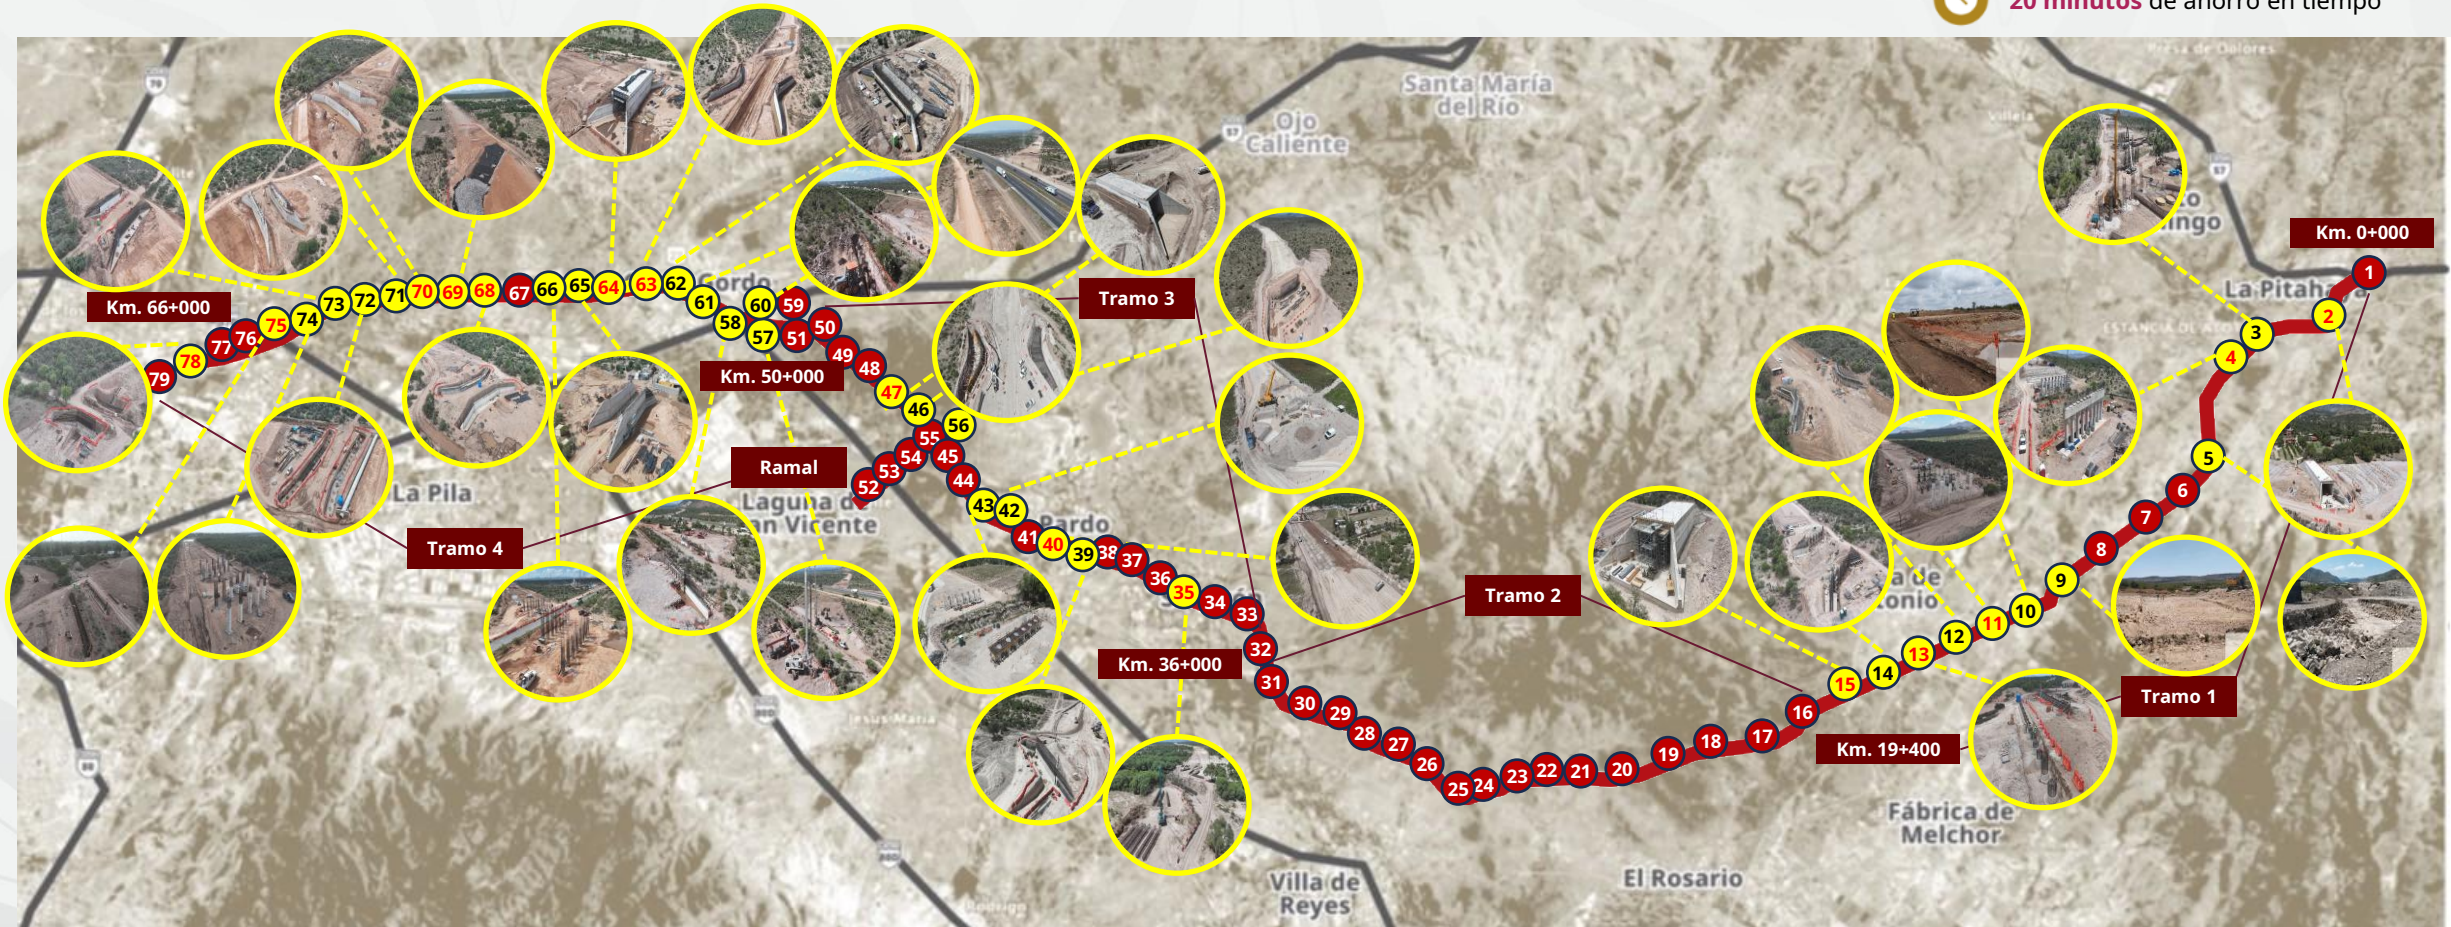

San Luis Potosí

La Pitahaya-Libramiento Oriente de S.L.P. y El Ramal Villa de Reyes



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Estructuras Proyectadas por Tramo

Tramo 1

Descripción	Descripción	Descripción
1 Ent. La Pitahaya Km. 0+500	7 PSFFCC Km. 12+780	13 Ducto Km. 18+426 38.00%
2 PSV Km. 2+096.73 94.50%	8 PIV Km. 12+930	14 Puente Km.18+610 48.00%
3 Puente Km. 2+481 14.00%	9 PSV Km. 14+043 0.50%	15 Dob Ca Km. 18+820 94.00%
4 Ducto Km. 2+680 53.00%	10 PIV Km. 14+810 0.22%	
5 PIV Km. 9+289.75 1.40%	11 PSFFCC Km. 16+250 6.80%	
6 Ducto Km. 10+853	12 PIV Km. 17+530 43.00%	

Tramo 2

Descripción	Descripción	Descripción
16 PSG Km.121+870	22 Ducto Km. 129+005	28 Puente Km. 134+662
17 PSV Km. 123+453	23 PSV Km. 130+725	29 PSG Km. 135+950
18 Puente Km. 123+608	24 PSG Km. 131+530	30 PIV Km. 137+310
19 PSV Km. 126+360	25 PSV Km. 132+820	31 Puente Carranco Km. 137+820
20 PSV Km. 128+210	26 Ducto Km. 134+020	
21 Puente Km. 128+420	27 PSV Km. 134+604	

Estructuras Sin Actividad

2 PSV Km. 2+096.73 94.50% (la fuerza de trabajo se movió a otro actividad)	63 PIV Km. 53+150.26 46.60% (la fuerza de trabajo se movió a otro actividad)
4 Ducto Km. 2+680 53.00% (la fuerza de trabajo se movió a otro actividad)	64 PSV Km. 54+424.37 84.20% (la fuerza de trabajo se movió a otro actividad)
11 PSFFCC Km. 16+250 6.80% (por proceso constructivo y cuestión de seguridad)	68 PSV Km. 58+505 39.40% (la fuerza de trabajo se movió a otro actividad)
13 Ducto Km. 18+426 38.00% (la fuerza de trabajo se movió a otro actividad)	69 PSV Km. 59+030 2.01% (se esta revisando unas filtraciones)
15 Dob Ca Km. 18+820 94.00% (la fuerza de trabajo se movió a otro actividad)	70 PSV Km. 60+5.79 39.00% (pendiente de autorizar libranza de postes de CFE)
35 P. Altamira 39+520 13.91% (la fuerza de trabajo se movió a otro actividad)	75 Ducto Km. 65+791.31 52.80% (la fuerza de trabajo se movió a otro actividad)
40 PSG Km. 41+981.48 3.00% (en espera del suministro de acero)	78 PSV Km. 66+449.24 15.10% (la fuerza de trabajo se movió a otro actividad)
47 PSG Km. 45+380 91.50% (el terraplén ya esta casi por llegar a la estructura)	

Tramo 3

Descripción	Descripción	Descripción
32 PIV Km. 36+719.53	41 PSV Km. 42+386	50 PIV Km. 49+120
33 PIV Km. 37+739.99	42 PSG Km. 42+650 6.50%	51 PIV Km. 49+900
34 PSV Km. 38+242.30	43 Puente Km. 42+990 40.60%	52 E.c. Car 37 PSV Km. 16+540
35 P. Altamira 39+520 13.91%	44 PSV Km. 43+456.78	53 PSV Km. 17+040
36 PSG Km. 39+750	45 PSV Km. 43+577.34	54 PSV Km. 17+610
37 PIV Km. 40+349.53	46 PIV Km. 44+243.13 25.80%	55 PIV Km. 18+365
38 PIV Km. 41+119.44	47 PSG Km. 45+380 91.50%	56 Ec.IndPSVKm18+700 16.40%
39 Ducto 41+532 14.50%	48 Ducto Km. 45+517	
40 PSG Km. 41+981.48 3.00%	49 PSG Km. 46+930	

Tramo 4

Descripción	Descripción	Descripción
57 Ducto Km. 51+500 22.20%	66 PSV Km. 55+407 19.80%	75 Ducto Km. 65+791.31 52.80%
58 Ducto Km. 10+333 68.10%	67 PIV Km. 56+354.38	76 Ec Lib Ote Km. 66+000
59 PSV Km. 10+500	68 PSV Km. 58+505 39.40%	77 PSV Km. 66+441.21
60 Ducto 20+580 23.40%	69 PSV Km. 59+030 2.01%	78 PSV Km. 66+449.24 15.10%
61 Ec Carr. 57 Km.51+800 0.05%	70 PSV Km. 60+579.85 39.00%	79 PSV Km. 1+412
62 PSG Km. 52+190 38.20%	71 PSV Km. 61+561.78 76.80%	
63 PIV Km. 53+150.26 46.60%	72 PSV Km. 62+398.36 28.20%	
64 PSV Km. 54+424.37 84.60%	73 PSV Km. 63+517.92 51.30%	
65 PSV Km. 54+952.42 79.43%	74 PSV Km. 64+800 40.20%	


Simbología

	Por construir
	En proceso de construcción
	Concluido

San Luis Potosí

La Pitahaya-Libramiento Oriente de S.L.P. y El Ramal Villa de Reyes

Volúmenes de obra				
Tramo I km. 0+000 al Km. 19+400				
Tramo III Km. 36+000 al Km. 50+000				
Tramo IV km. 50+000 al Km. 66+000				
Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	Ejecutado
Terracerías				
Desmonte, cualquiera que sea su tipo y	388.22	276.95	111.27	1.19
Despalme de espesor variable en corte y	733,873.06	386,171.55	347,701.51	43,181.31
Excavaciones en cortes y adicionales debajo	2,860,090.52	316,030.97	2,544,059.55	1,756.00
Construcción de terraplenes utilizando	3,858,592.51	396,125.02	3,462,467.48	7,824.55
Construcción de terraplenes utilizando	3,710,618.07	661,132.96	3,049,485.11	45,326.24
Formación y compactación de terraplenes	330,950.70	55,488.86	275,461.84	1,060.52
Formación y compactación de terraplenes	1,570,694.98	13,980.86	1,556,714.12	418.80
Obras de Drenaje				
Excavación para estructuras u obras de	53,714.94	5,464.33	48,250.61	-
Plantilla de material Granular, P.U.O.T	5,780.69	437.66	5,343.03	23.15
Arroje y Relleno con material de calidad de	74,713.07	8,459.22	66,253.85	639.50
Alcantarilla de concreto reforzado de f'c =	7,394.04	681.55	6,712.49	-
Concreto hidráulico de f'c= 100 kg/cm2 en	1,399.10	421.22	977.88	7.45
Concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2, por	3,314.74	3,267.47	47.27	107.19
Concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 en	13,274.04	580.90	12,693.14	47.42
Acero para concreto hidráulico con límite	356,544.18	142,965.47	213,578.71	7,128.46
Malla electrosoldada 6x6 10-10, P.U.O.T	2,330.47	947.01	1,383.46	-
Entronques				
Terracerías				
Despalme de espesor variable en corte y	61,394.70	47,454.81	13,939.89	542.24
Excavaciones en cortes y adicionales debajo	848,439.10	181,750.31	666,688.79	3,002.31
Construcción de terraplenes utilizando	325,337.10	63,037.06	262,300.04	420.89
Formación y compactación de terraplenes	68,896.40	1,645.02	67,251.39	85.85
Formación y compactación de terraplenes utilizando materiales	321,746.40	1,421.76	320,324.64	939.65

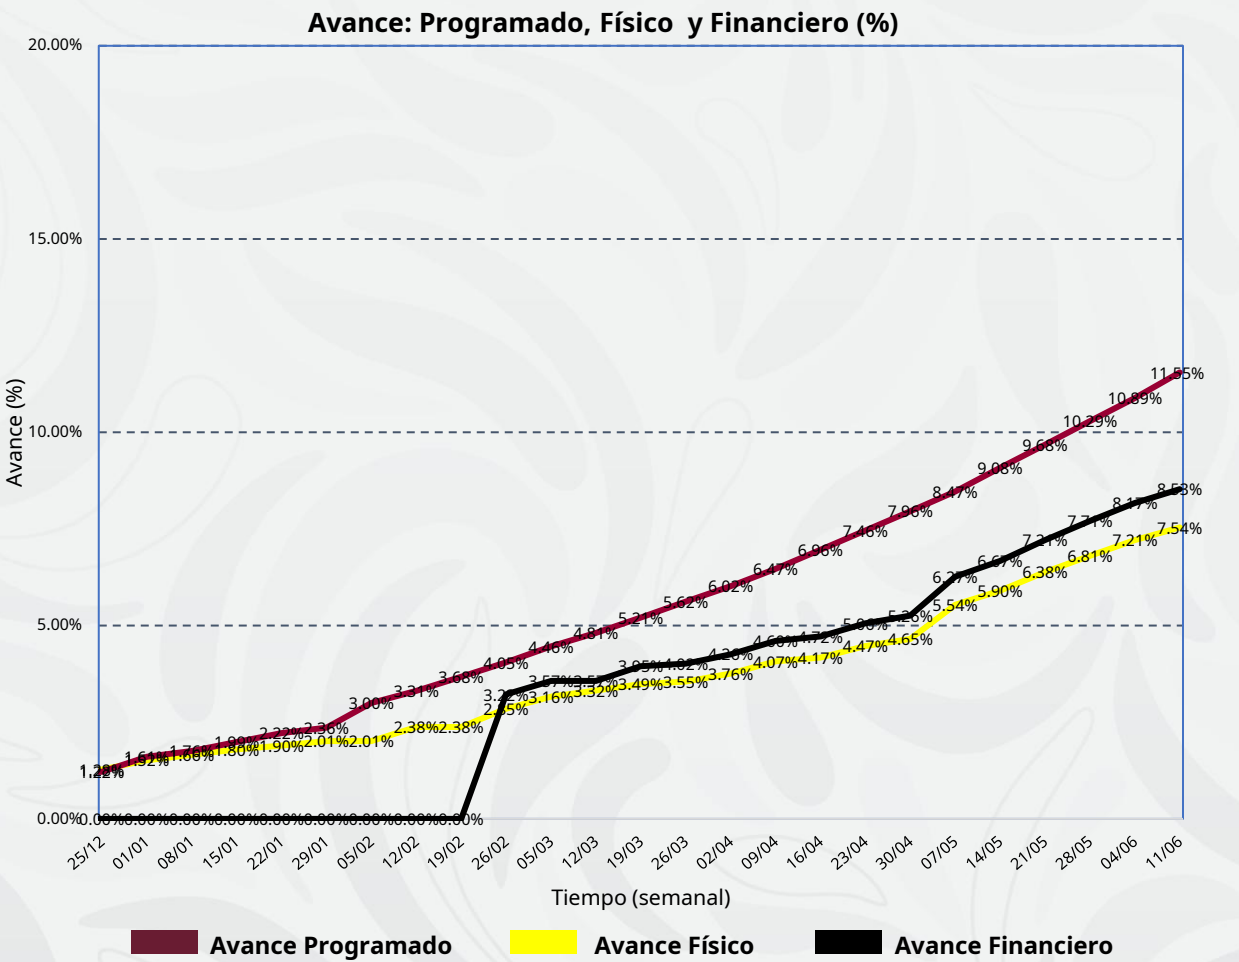

	29 mayo al 04 junio 2026	05 al 11 junio 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	857	901
Maquinaria	169	169
Frente de Trabajo	Tramo 1/Tramo 3/Tramo 4	Tramo 1/Tramo 3/Tramo 4
