


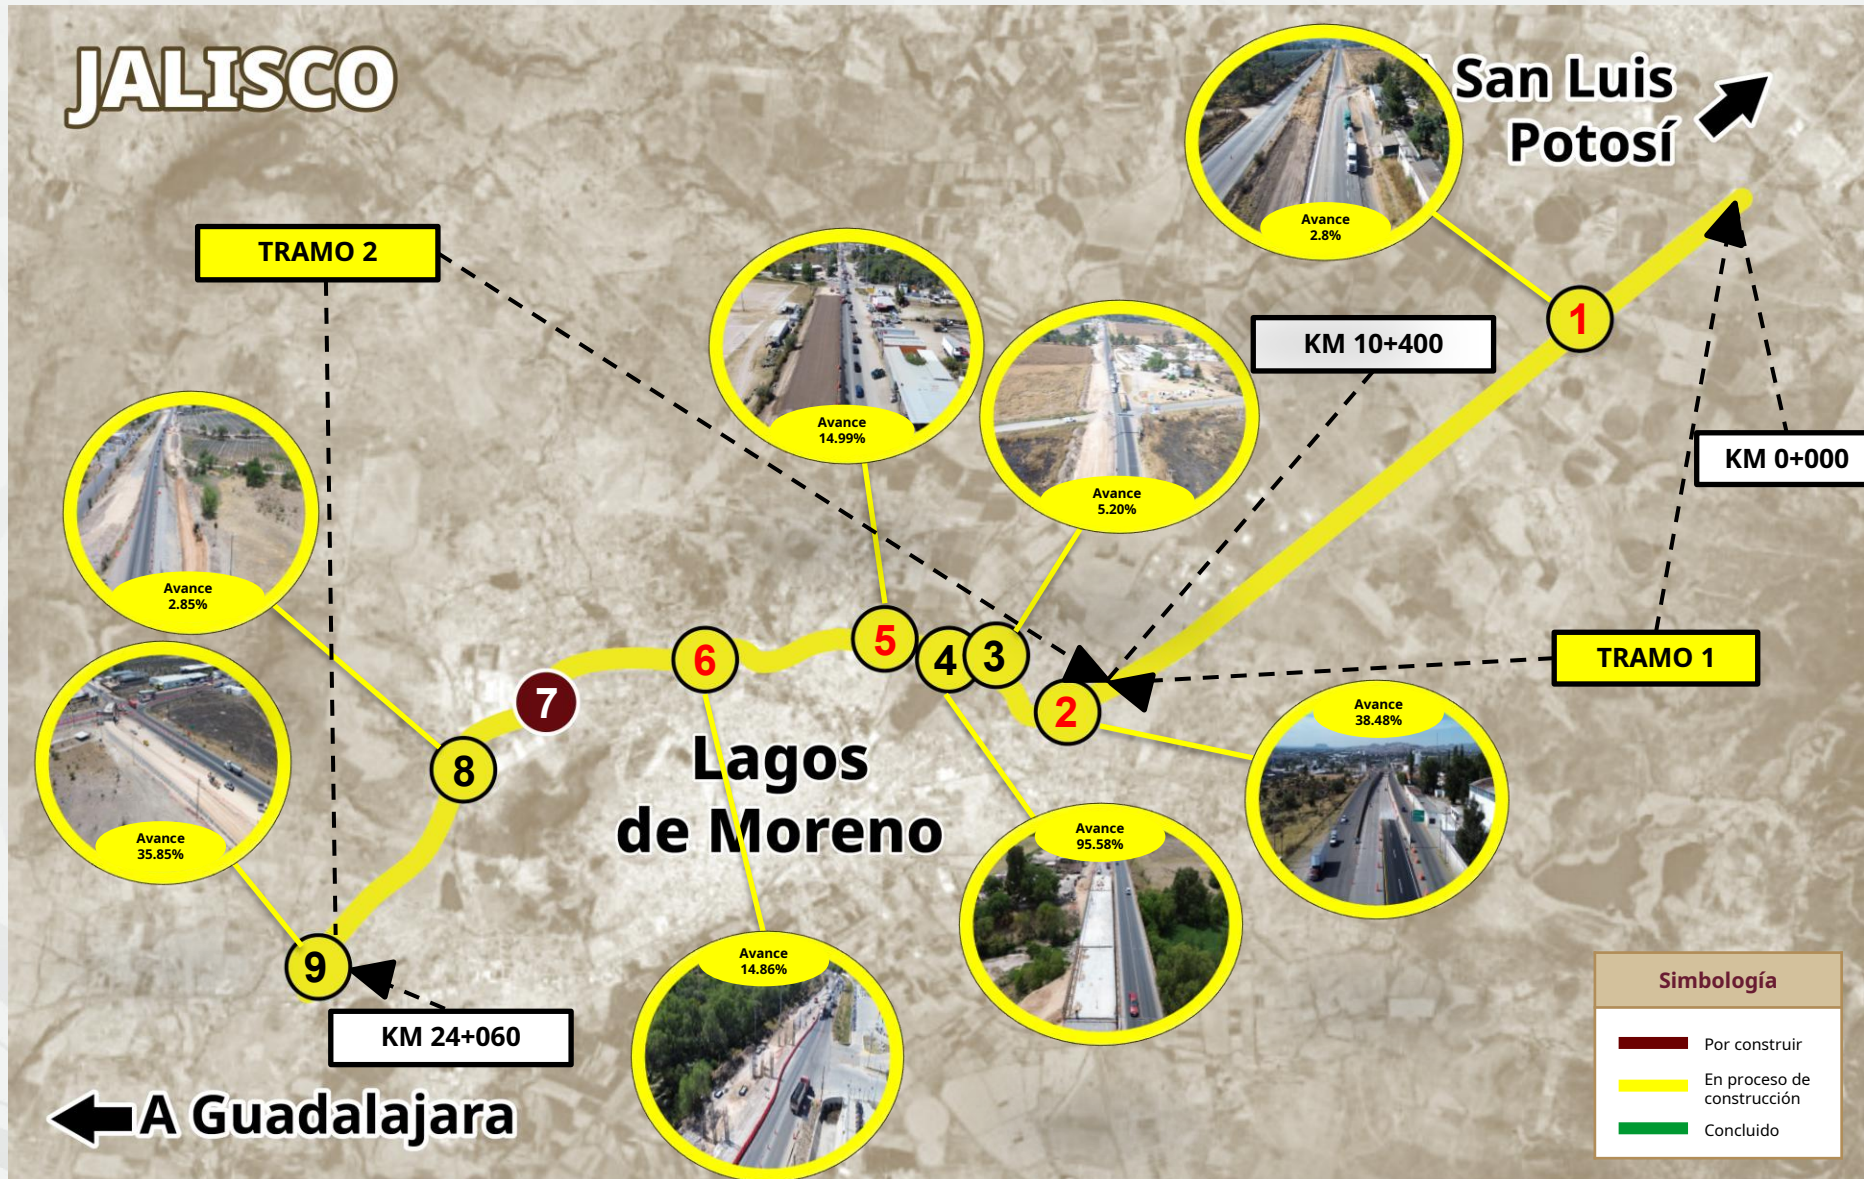


Descripción	
1	PIV con entronque "El Maguey" km 1+300 - Avance 2.8%. Problemas de DDV. (Modificación de proyecto).
2	Entronque a desnivel Lagos de Moreno Este km 11+800 (adecuación)- Avance 38.48% (se movió la fuerza de trabajo)
3	PIV con entronque "Fracc. Andalucía" km 12+120 Avance 5.20%.
4	Puente km 12+450 "Rio Lagos"- Avance 95.58%.
5	PIV con entronque "Sepúlveda" km 13+620 Avance 14.99%. (se movió la fuerza de trabajo)
6	PSV con entronque "DRÄXLMAIER" km 15+900 Avance 14.86%
7	PIV con entronque "Encarnación" km 18+200
8	PSFC con retornos km 19+860 Avance 2.85%
9	PIV con entronque Tipo Glorieta "Lagos de Moreno Oeste" km 23+920 Avance 35.85% .

Jalisco

Ampliación Libramiento Lagos de Moreno

TRAMO 2 - AVANCE TRONCAL Y ENTRONQUES							
Concepto	Unidad	Total	Ejecutado	Faltante	05/06/26 al 11/06/26		Observaciones
					Programado	Ejecutado	
Terracerías Troncal	%	100%	60.73%	39.27%	0.021%	1.85%	En proceso
Pavimentos Troncal	%	100%	31.60%	68.40%	0.040%	2.25%	En proceso
Drenaje Troncal	%	100%	31.66%	68.34%	0.00%	7.47%	En proceso
Obras Inducidas	%	100%	42.10%	57.90%	0.00%	0.00%	En proceso
Entronque km 12+120	%	100%	5.20%	94.80%	0.00%	0.01%	En proceso
Entronque km 12+450	%	100%	95.58%	4.42%	0.00%	1.84%	En proceso
Entronque km 13+620	%	100%	14.99%	85.01%	0.00%	0.00%	En proceso
Entronque km 15+900	%	100%	14.86%	85.14%	0.00%	1.96%	En proceso
PSFC 19+860	%	100%	2.85%	97.15%	0.00%	0.10%	En proceso

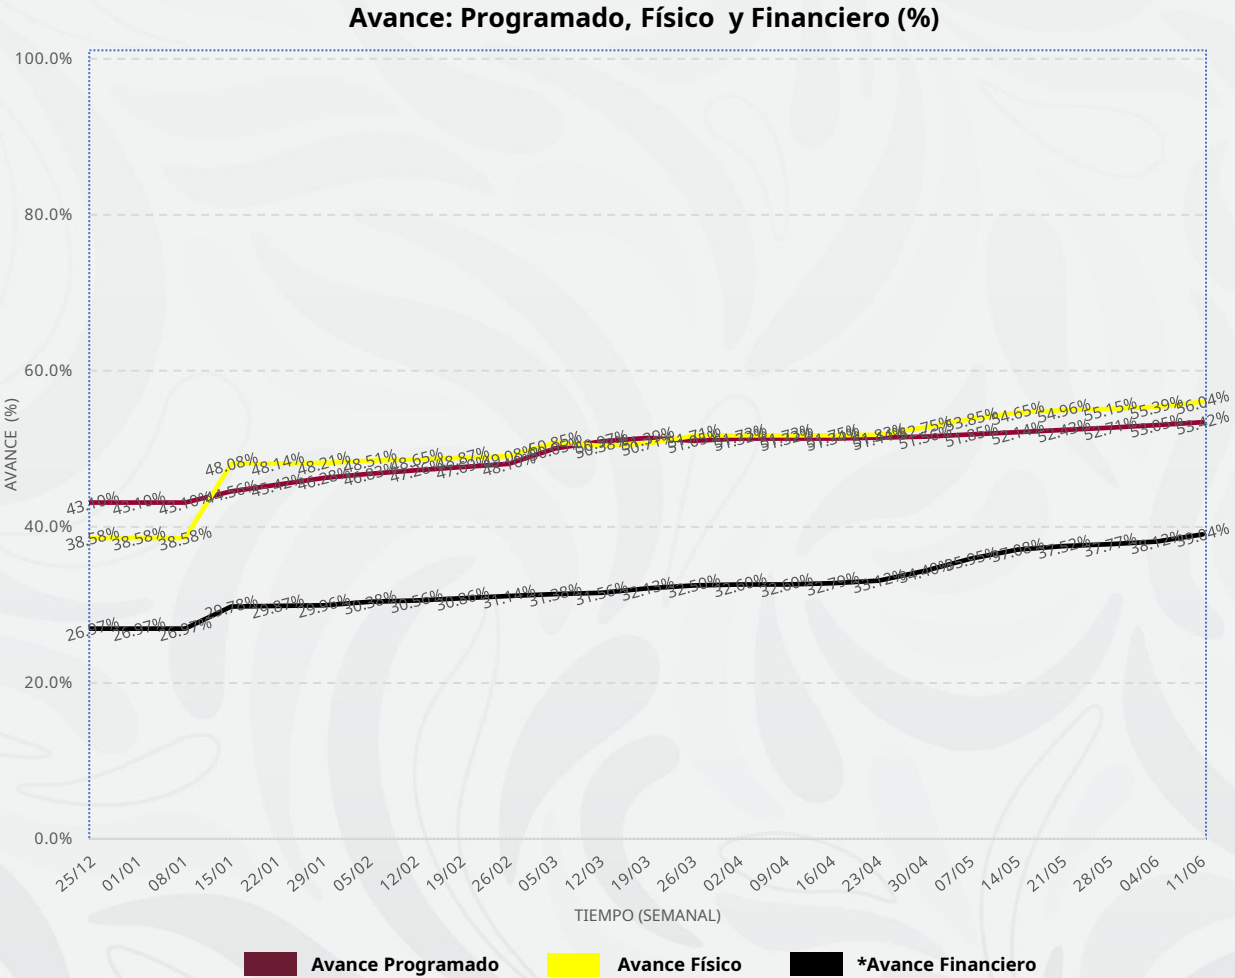

	29 de mayo al 04 de junio 2026	05 al 11 de junio 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	246	246
Maquinaria	69	69
