


Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

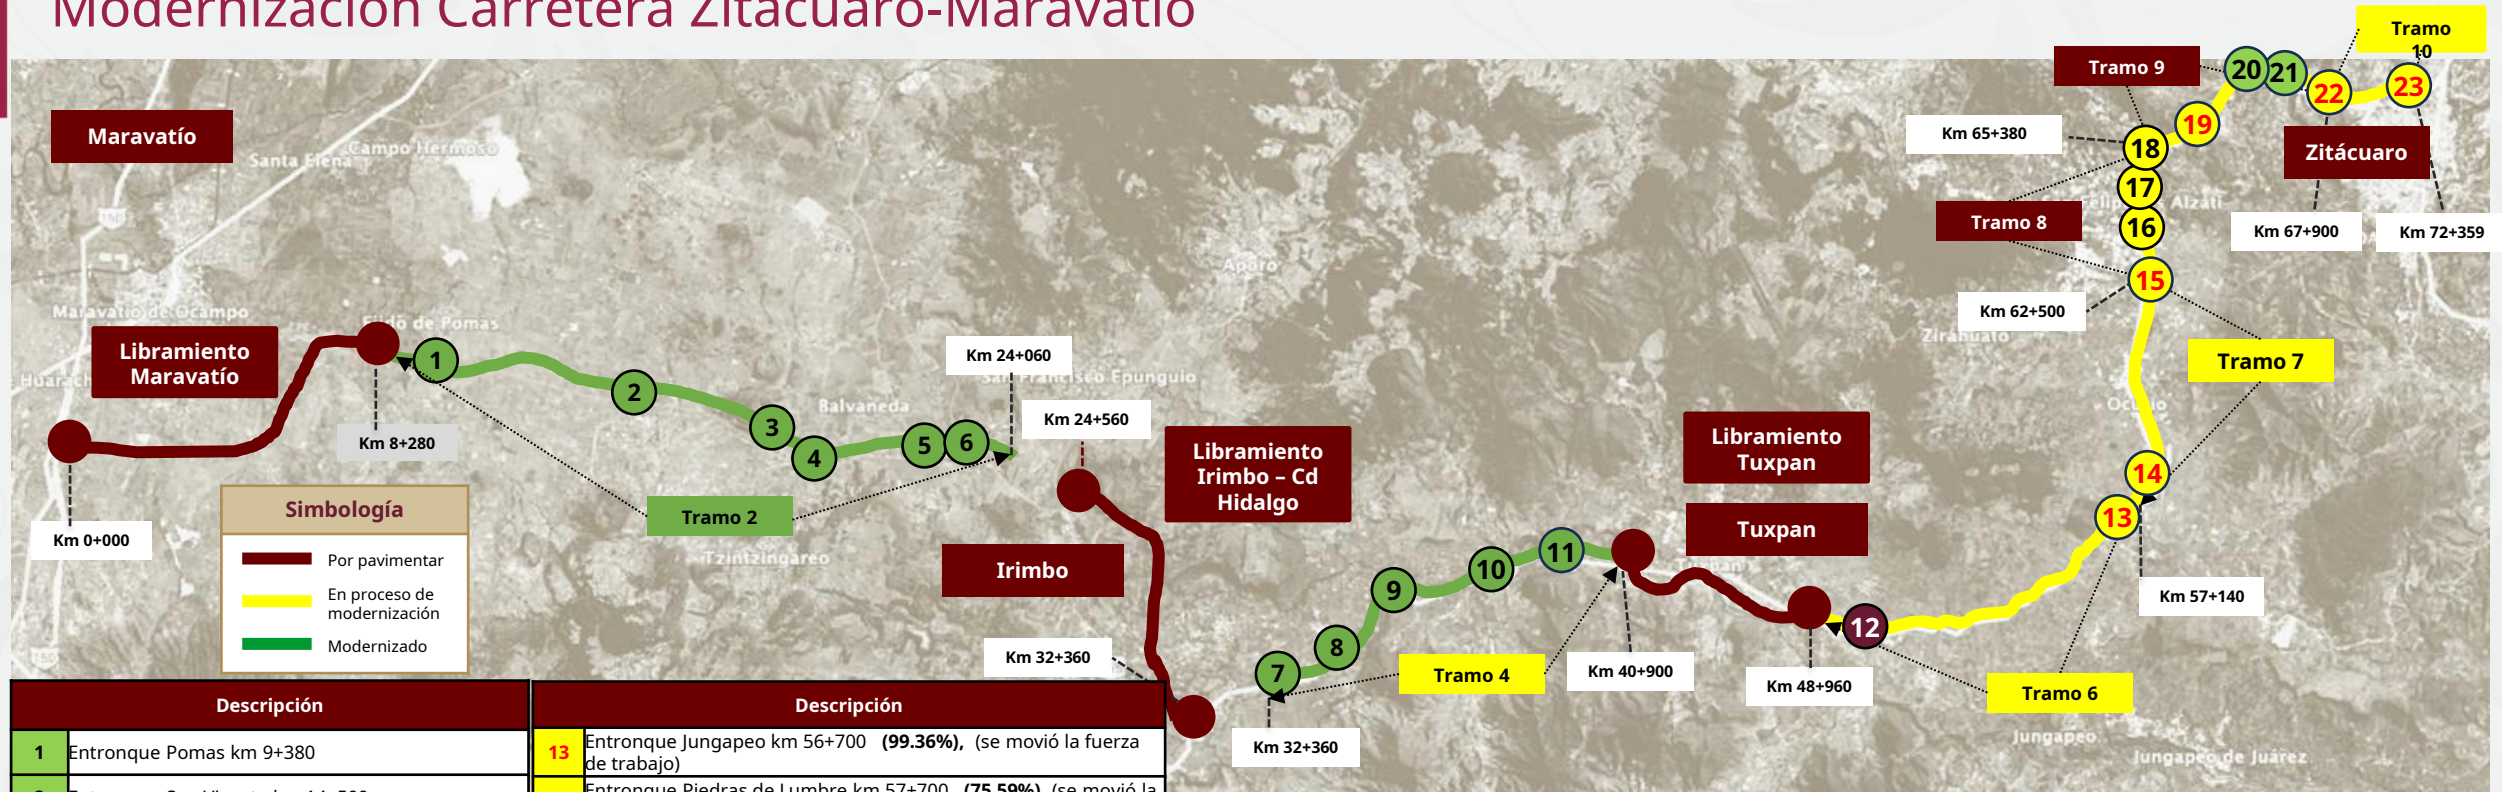

Descripción		Descripción	
1	Entronque Pomas km 9+380	13	Entronque Jungapeo km 56+700 (99.36%) , (se movió la fuerza de trabajo)
2	Entronque San Vicente km 14+500	14	Entronque Piedras de Lumbre km 57+700 (75.59%) , (se movió la fuerza de trabajo)
3	PIP km 18+370	15	Entronque Zirahuato km 62+500 (72.03%) , (se movió la fuerza de trabajo)
4	Entronque Zinzingareo km 18+700	16	Entronque San Felipe I km 64+400 (67.85%)
5	Entronque Senguio km 21+280	17	Entronque San Felipe II Km 64+640 (67.85%)
6	PIP km 22+280	18	Entronque Macutzio km 65+620 (47.86%)
7	Entronque Santa Rosa km 32+420	19	Entronque Valle Verde km 67+220 (98.20%) , (se movió la fuerza de trabajo)
8	Entronque Ziranda-Jaripeo km 33+500	20	Entronque Curungueo I Km 68+240
9	Puente Turundeo Km 36+460	21	Entronque Curungueo II Km 68+780
10	Entronque Turundeo I km 37+550	22	Puente San Juan Viejo Km 69+860 (98.75%) , (Sin Actividad)
11	Entronque Turundeo II km 38+780	23	PSV Zitácuaro Km 72+160 (97.28%) , (Sin Actividad)
12	Puente Obispo Km 50+400 (0.00%) , Sin Iniciar		

Avance físico

- Programado: 65.65% (Reprogramación T8)
- Real: 67.28%
- Semanal: 0.23%
- Financiero: 20.44%

Nota 1:

Los avances se calculan en relación a la Inversión total del Ramal

Nota 2:

Las Estructuras en proceso remarcadas en color rojo, no presentan avance en el periodo semanal, o no han iniciado.



Inversión: \$4,575.3 mdp (total Ramal)
\$3,048.81 mdp (modernización)
\$1,526.49 mdp (Libramientos)



4,800 empleos generados



Meta: 71.3 Km



126,000 habitantes beneficiados



Inicio: septiembre 2020
Reinicio: 27 de enero de 2024
Término: 31 de diciembre de 2026



Ahorro en tiempo: 25 min

Concesionaria: Red de carreteras de occidente

Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío




TERRACERIAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 05 jun al 11 jun 26		Observaciones
				Programa do	Ejecutado	
Cortes (m3)	705,558.00	791,639.25	-86,081.25	0.00	679.21	
Terraplén (m3)	445,687.00	496,868.43	-51,181.43	0.00	5,018.19	
Subyacente (m3)	256,097.00	288,062.42	-31,965.42	0.00	1,483.02	
Subrasante (m3)	170,688.00	185,398.44	-14,710.44	0.00	810.80	

PAVIMENTOS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 05 jun al 11 jun 26		Observaciones
				Programa do	Ejecutado	
Base Hidráulica (m3)	125,659.04	133,180.82	-7,521.78	0.00	667.22	
Geomalla (m2)	84,520.00	88,887.80	-4,367.80	0.00	476.80	SE TRABAJA EN TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 6, 7 Y 8
Base Asfáltica (m3)	120,414.05	127,410.37	-6,996.32	0.00	370.54	SE TRABAJA EN TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 6, 7 Y 8

ESTRUCTURAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 05 jun al 11 jun 26		Observaciones
				Programa do	Ejecutado	
PIV JUNGPEO	1.00	1.0089	0.0000	0.0000	0.0000	CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE Y ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN GASA 0
PSV SAN FELIPE	1.00	0.5759	0.4241	0.0110	0.0181	TENDIDO DE BASE ASFÁLTICA
PSV SAN JUAN VIEJO	1.00	0.9875	0.0125	0.0000	0.0200	CONFORMACIÓN DE TERRACERÍAS
PSV ZITÁCUARO	1.00	0.9728	0.0272	0.0000	0.0700	REHABILITACIÓN DE LATERALES
DEFENSA METÁLICA	35,327.00 ml	33,294.03 ml	2,032.97 ml	0.00 ml	14.11 ml	SE INSTALA EN TRAMOS AISLADOS DISPONIBLES

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

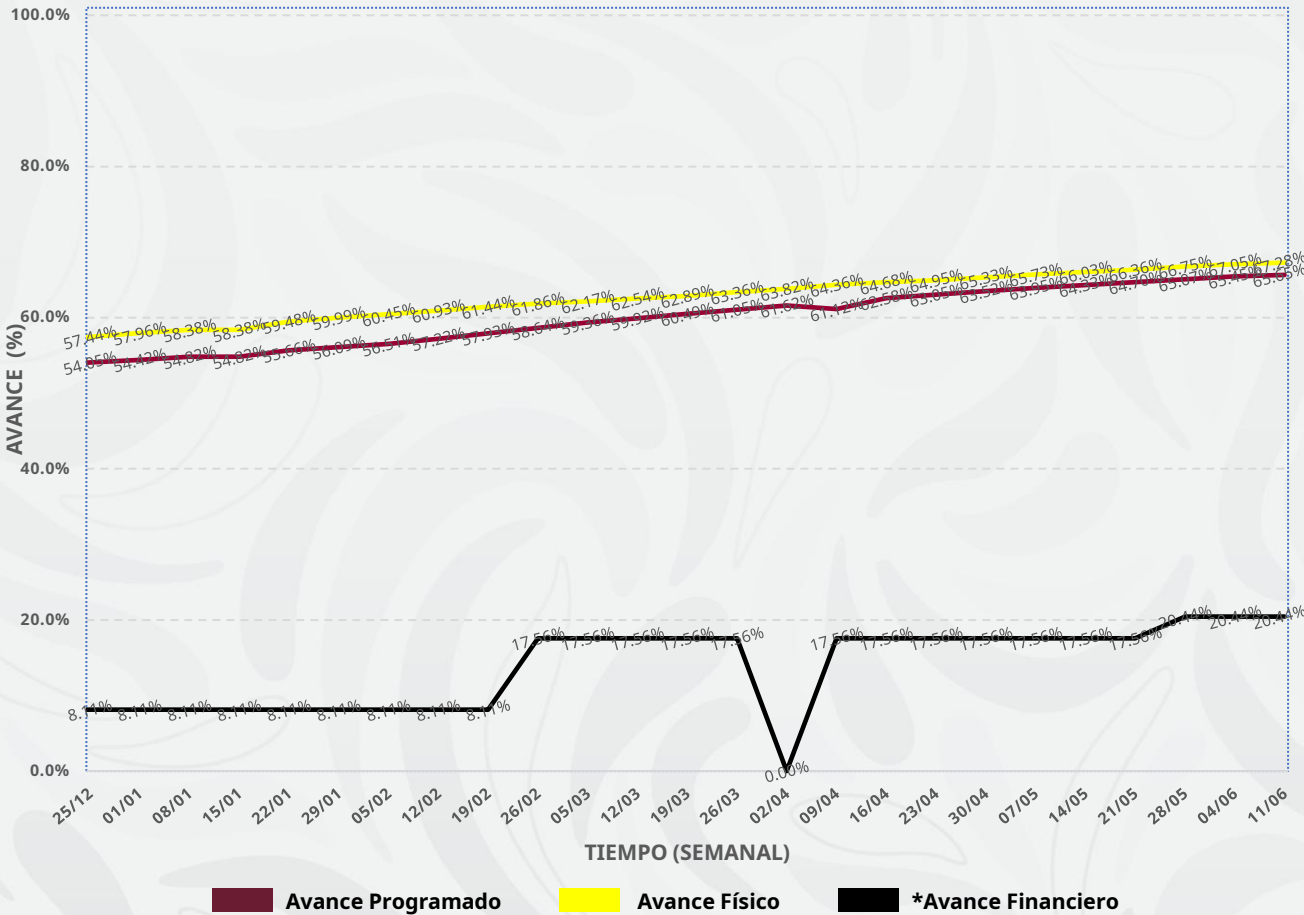

	Del 29 de mayo al 04 de junio	Del 05 al 11 de junio
Fuerza de Trabajo (personas)	292	288
Maquinaria	192	190
tramos activos	VI, VII, VIII, IX, X	VI, VII, VIII, IX, X
Frentes de trabajo (totales)	22	18
