

Estado de México

Atizapán-Atlacomulco



Simbología

Por construir

En proceso de modernización

Modernizado

Descripción	
1	Entronque Chiluca 15.00% , (sin actividad, falta de recursos)
2	Viaducto Sin Nombre km 20+880.00 53.92%
3	Viaducto La Estadía km 22+332.00 54.56%
4	Viaducto Los Gallos km 27+425.00 47.92%
5	Túnel Los Gallos km 27+770.00 95.00% , (sin actividad, faltan todos los elementos electromecánicos y pavimento)
6	Viaducto Sin Nombre km 31+033.00 49.82%
7	Viaducto Tlazala km 31+359.00 45.26%
8	Túnel Cahuacán I km 36+258.00 95.00% , (sin actividad, faltan todos los elementos electromecánicos y pavimento)
9	Viaducto Cahuacán III km 38+995.00 27.12% ,
10	Viaducto Sin Nombre km 42+053.00 5.44% (sin fuerza de trabajo)
11	Entronque Villa del Carbón km 47+974.00 00.00% (no se han iniciado trabajos)
12	Viaducto El Llano km 51+016.00 00.90% (sin actividad, problemas sociales)
13	Viaducto Sin Nombre km 54+770.00 03.80% , sin actividad, problemas sociales
14	Viaducto Los Chaparrales km 73+387.00 00.00% (no se han iniciado trabajos)
15	Viaducto El Pescado km 75+482.00 00.00% (no se han iniciado trabajos)
16	Entronque Ixtlahuaca km 76+188.00 35.00% , (sin actividades, problemas sociales)
17	Entronque La Luna km 83+960.00 00.00% (no se han iniciado trabajos)
18	Viaducto El Salto km 91+874.00 16.80% , (sin actividad, problemas sociales)
19	Entronque Atlacomulco

Inversión: 9,865.8 mdp a precios de 2014 incluye I.V.A., incluye monto de obra (7,662mdp) y Fondo de Obra Adicional (843 mdp)

Meta: 74 km, 2 Plazas de cobro, 12 Viaductos, 2 Túneles, 4 Entronques, 80 PSVyG

Inicio: 01 marzo 2016
Término: 30 junio 2027

Avance físico:

- Programado: 97.80%
- Real: 53.86%
- Financiero: 25.02%
- Semanal: 00.20%

132,909 empleos generados
(44,303 directos y 88,606 indirectos)


1 millón 244 mil habitantes beneficiados

60 minutos de ahorro en tiempo

Estado de México

Atizapán-Atlacomulco

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

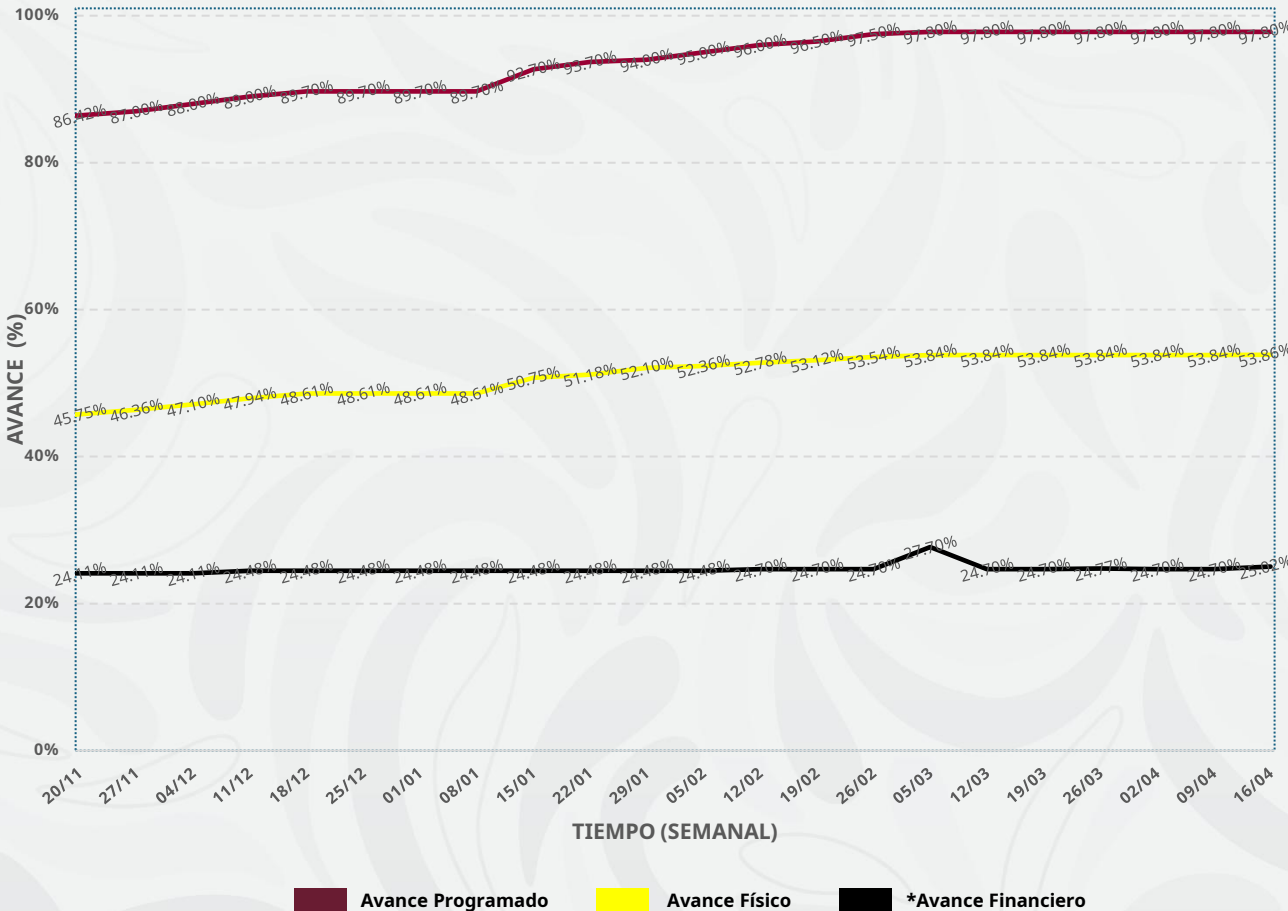

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	10/04/26 al 16/04/2026		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Pilotes	344	201	143	2	2	• La mano de obra se mantiene para alcanzar las expectativas correspondientes.
Zapatas	86	49	37	1	0.15	
Columnas	96	29	67	1	0.47	
Cabezales	76	14	62	1	0.25	
Caballetes	24	9	15	1	0.05	
Trabes de concreto	395	8	387	0	3	
Trabes metálicas	29	1	28	1	0.02	

	Del 3 al 9 de abril	Del 10 al 16 de abril
Fuerza de Trabajo (personas)	1,960	1,984
Maquinaria	507	516
Frentes de trabajo	Tramos 01, 2A y 2B	Tramos 01, 2A y 2B
