

Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha

Concesionaria: IDEAL
Constructora: MOTA-ENGIL, S.A. de C.V.

VERACRUZ

PSMA 6.0 4.00X4.50 KM
6+082 obra
 estructuralmente concluida.
 Continúan los trabajos de
 conformación de enfoque.

Villa Candelaria

Bocade Loma

Palma Sola

la Litera

Lago Verde

Mesa de Veinticuatro

El Limón

Villa Rica de la Veracruz

PUENTE 7.3 KM
7+373 Trabajos de
 perforación en apoyo
 cargadero no. 1 pila
 no. 1.

Km 186+01

Palmas de Abajo

Mancha

Soyacuautla



La Reforma



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Descripción	
1	Entronque Laguna Verde II Km 0+000
2	PSMA 1.5 Km 1+555.5
3	PSMA 2.7 Km 2+703.91
4	PIV 3.05 Km 3+041
5	Entronque Laguna Verde I Km 3+041
6	PSMA 3.9 Km 3+900
7	PSMA 6.0 Km 6+080 (99.00%)
8	PIV 6.8 Km 6+806 (96.00%) se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo para obra de drenaje en rampa de acceso.
9	PIV 7.04 Km 7+040 (5.00%) Se continua con la evaluación de la reubicación de la estructura.
10	PUENTE 7.3 Km 7+330 (0.83%) trabajos de perforación en apoyo Cargadero No .1 pila No 1.
11	PUENTE 7.8 Km 7+815, (61.70%) Pendiente montaje de trabes en claro no. 01; se realiza el montaje de prelosas en claros nos. 02 al 05.
12	PLAZA DE COBRO Km 8+300, (16.00%) El proyecto ejecutivo está en revisión en la DGDC.
13	PUENTE 8.7 Km 8+665, (96.00%) a nivel de los colada
14	PSMA 8.9 Km 8+960, (100.00%)
15	PUENTE 14 Km 14+000
16	PUENTE 14.7 Km 14+700
17	PSV Km 14+900
18	PSMA 15.3 Km 15+370
19	PSV 16.8 Km 16+800
20	ENTRONQUE LA MANCHA Km 19+841

Simbología

- Por construir
 En proceso de construcción
 Concluido

Avance físico

- Programado: 74.65%
- Real: 28.83% Incluye Ent. Chapachapa
- Financiero: 15.64%
- Semanal: 0.09%

 **Inversión: 2,252.78 mdp**

 **Inicio:** Marzo de 2025
Término: Agosto de 2026

Meta: 19.84 km, 5 Puentes,
1 Plaza de Cobro, 3 Entronques,
2 PSVs, 3 PIVs, 6 PSMAs, 59 ODTs
y el Entronque Chapachapa

 **2,252.78 (1)=2,253** empleos directos generados/millón de inversión
2,252.78 (2)= 4,506 empleos indirectos generados/millón de inversión

 **128,000** habitantes beneficiados

 **45 minutos** de ahorro en tiempo,
Tramo 4

Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha

Concesionaria: IDEAL
Constructora: MOTA-ENGIL, S.A. de C.V.



Avance físico

- Real: 100.00%
- Programado: 100.00%
- Financiero: 75.01%
- Semanal: 0.00%

Descripción	
1	Entronque Chapachapa Km 739+733 (Km op. 92+512)
2	ODT 92+827.25
3	PSPyG 92+832.22
4	Ampliación de ODT 100+102,


Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha



Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	09/04/26 al 16/04/26		Observaciones
				Programa do	Ejecutado	
Tramo 4 Laguna Verde - La Mancha						
Volúmenes de obra						
Corte	1,414,039.20	172,701.95	1,241,337.25	27,193.00	2,679.25	El volumen programado corresponde a los 19. 8 km y solo se trabaja en 7.6 km.
Terraplén	1,155,915.50	195,746.64	960,168.86	20,641.00	4,595.21	El volumen programado corresponde a los 19. 8 km y solo se trabaja en 7.6 km.
Subyacente	162,462.20	62,077.28	100,384.92	27,077.03	245.85	El volumen programado corresponde a los 19. 8 km y solo se trabaja en 7.6 km.

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

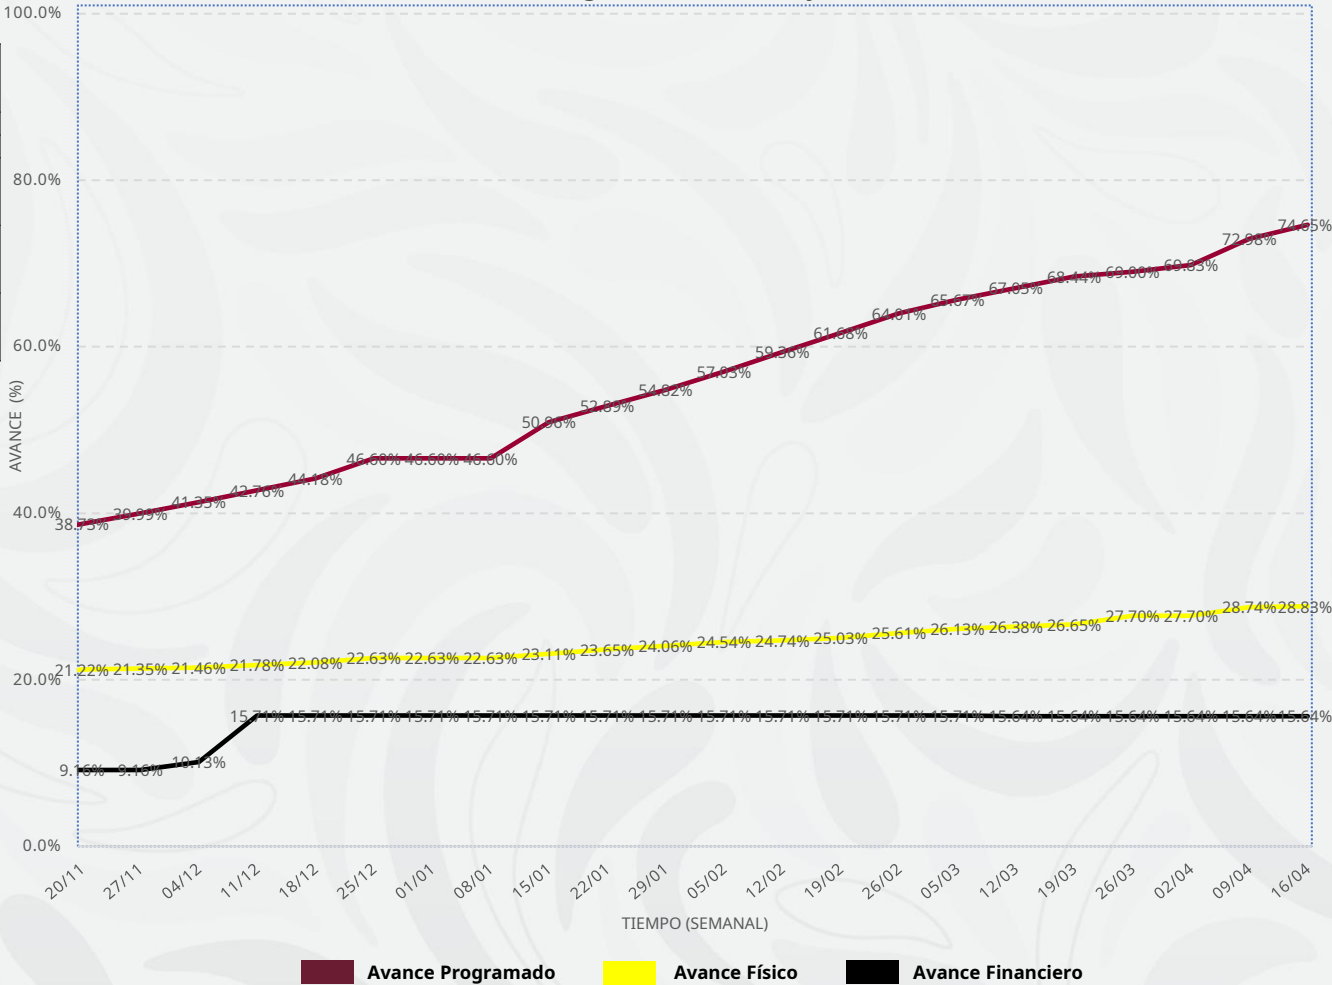

	27 de marzo al 02 de abril	03 de abril al 09 de abril	10 de abril al 16 de abril
Fuerza de Trabajo (personas)	113	113	118
Maquinaria	21	21	28
