


Michoacán

Lázaro Cárdenas-Nueva Italia

Avance físico

- Programado: 0.00%
 - Real: 0.07%
- Semanal: 0.01 %
 - Financiero: 0.00%

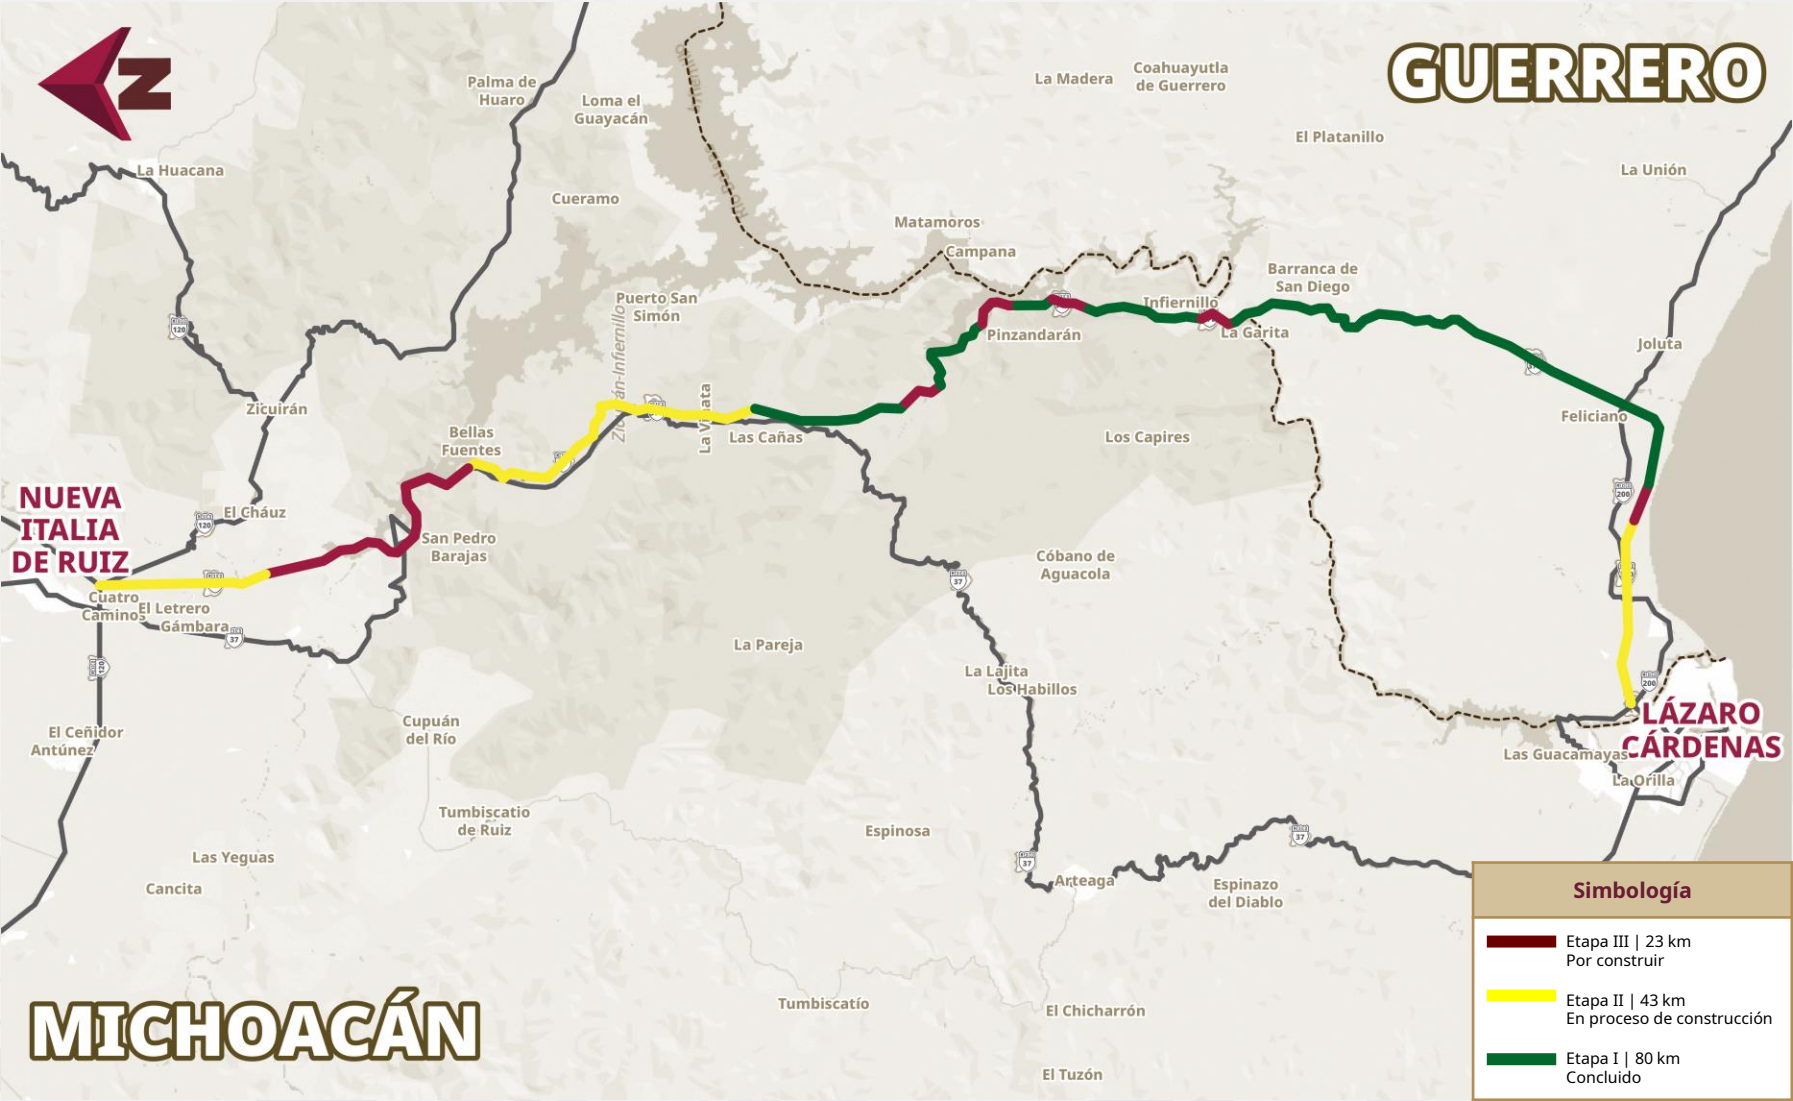

- 

Inversión: 16,000 mdp
- 

Inicio: Marzo 2026
Término: 2029
- 

Meta: 146 km
45 PIV's | 3 PSV's | 28
Puentes de concreto | 5 PSFCC
| 1 Túnel
1 Ampliación de plaza de cobro
3 Puentes de acero (estructuras
complejas)
- 

4,123 empleos generados
- 


**1,800,000 habitantes
beneficiados**

Michoacán

Lázaro Cárdenas-Nueva Italia

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	09/04/2026 al 16/04/2026		Observaciones
				Programad o	Ejecutado	
Desmonte	146 km	8.90 km	137.10 km	.300 km	.300 km	

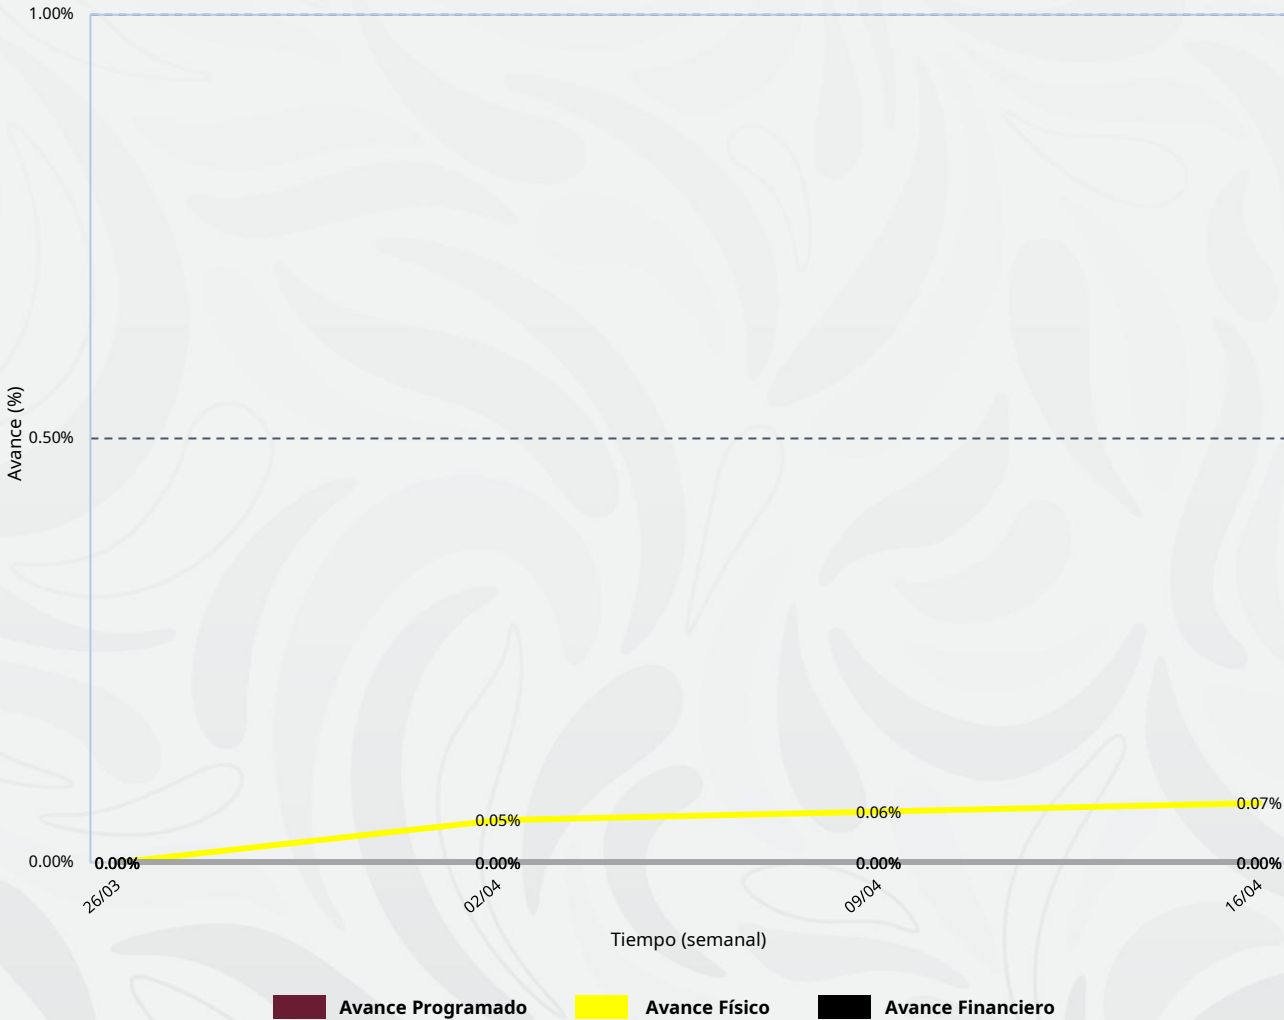

	Del 02 de abril al 09 de abril de 2026.	Del 09 de abril al 16 de abril de 2026.
Fuerza de Trabajo (personas)	50	50
Maquinaria	20	20
Frente de Trabajo	Actividades de deshierbe y desmonte	Actividades de deshierbe y desmonte
