

San Luis Potosí

La Pitahaya-Libramiento Oriente de S.L.P.y el Ramal Villa de Reyes



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance físico • Programado: **7.46%**
• Real: **4.47%**

Avance financiero: 5.06%



Inversión: 8,331.12 mdp.
Incluye I.V.A.



Inicio: julio 2024
Término: 14 de febrero 2028



Meta: 68.5 km. + 2.4 Km del Ramal
79 Estructuras; Puentes, PSV'S,
PSFCC, PIV'S.
1 Plaza de Cobro, 5 Entronques,
165 ODT'S.

Concesionaria: META



2000 Empleos directos generados
600 Empleos indirectos generados



128 000 habitantes beneficiados



20 minutos de ahorro en tiempo



San Luis Potosí

La Pitahaya-Libramiento Oriente de S.L.P.y el Ramal Villa de Reyes



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Estructuras Proyectadas por Tramo

Tramo 1

Descripción	Descripción	Descripción
1 Ent. La Pitahaya Km. 0+500	7 PSFFCC Km. 12+780	13 Ducto Km. 18+426 23.0%
2 PSV Km. 2+096.73 46.00%	8 PIV Km. 12+930	14 Puente Km.18+610 23.50%
3 Puente Km. 2+481 3.0%	9 PSV Km. 14+043	15 Dob Ca Km. 18+820 71.00%
4 Ducto Km. 2+680 42.0%	10 PIV Km. 14+810	
5 PIV Km. 9+289.75	11 PSFFCC Km. 16+250 5.90%	
6 Ducto Km. 10+853	12 PIV Km. 17+530 22.0%	

Tramo 2

Descripción	Descripción	Descripción
16 PSG Km.121+870	22 Ducto Km. 129+005	28 Puente Km. 134+662
17 PSV Km. 123+453	23 PSV Km. 130+725	29 PSG Km. 135+950
18 Puente Km. 123+608	24 PSG Km. 131+530	30 PIV Km. 137+310
19 PSV Km. 126+360	25 PSV Km. 132+820	31 Puente Carranco Km. 137+820
20 PSV Km. 128+210	26 Ducto Km. 134+020	
21 Puente Km. 128+420	27 PSV Km. 134+604	

Estructuras Sin Actividad

2	PSV Km. 2+096.73 46.00% (se movió la fuerza de trabajo)
3	Puente Km. 2+481 3.0% (se movió la fuerza de trabajo)
4	Ducto Km. 2+680 42.0% (se movió la fuerza de trabajo)
40	PSG Km. 41+981.48 3.00% (en espera del suministro de acero)
46	PIV Km. 44+243.13 2.00% (en espera del suministro de acero)
61	Ec Carr. 57 Km.51+800 0.01% (la fuerza de trabajo se movió a otro actividad)
63	PIV Km. 53+150.26 46.60% (la fuerza de trabajo se movió a otro actividad)
69	PSV Km. 59+030 2.01% (se esta revisando unas filtraciones)
70	PSV Km. 60+5.79 39.00% (pendiente de autorizar libranza de postes de CFE)
71	PSV Km. 61+561.78 67.00% (estructura sin actividad en espera la colocación de neoprenos y montaje de trabes)

Tramo 3

Descripción	Descripción	Descripción
32 PIV Km. 36+719.53	41 PSV Km. 42+386	50 PIV Km. 49+120
33 PIV Km. 37+739.99	42 PSG Km. 42+650	51 PIV Km. 49+900
34 PSV Km. 38+242.30	43 Puente Km. 42+990 15.66%	52 E.c. Car 37 PSV Km. 16+540
35 Puente Altamira Km. 39+520	44 PSV Km. 43+456.78	53 PSV Km. 17+040
36 PSG Km. 39+750	45 PSV Km. 43+577.34	54 PSV Km. 17+610
37 PIV Km. 40+349.53	46 PIV Km. 44+243.13 2.00%	55 PIV Km. 18+365
38 PIV Km. 41+119.44	47 PSG Km. 45+380 71.20%	56 Ec.IndPSVKm18+700 4.80%
39 Ducto Km. 41+532.47	48 Ducto Km. 45+517	
40 PSG Km. 41+981.48 3.00%	49 PSG Km. 46+930	

Tramo 4

Descripción	Descripción	Descripción
57 Ducto Km. 51+500 10.20%	66 PSV Km. 55+407 18.70%	75 Ducto Km. 65+79.31 29.67%
58 Ducto Km. 10+333 49.57%	67 PIV Km. 56+354.38	76 Ec Lib Ote Km. 66+000
59 PSV Km. 10+500	68 PSV Km. 58+505 35.80%	77 PSV Km. 66+441.21
60 Ducto 20+580 21.13%	69 PSV Km. 59+030 2.01%	78 PSV Km. 66+449.24 6.10%
61 Ec Carr. 57 Km.51+800 0.02%	70 PSV Km. 60+579.85 39.00%	79 PSV Km. 1+412
62 PSG Km. 52+190 31.50%	71 PSV Km. 61+561.78 67.00%	
63 PIV Km. 53+150.26 46.60%	72 PSV Km. 62+398.36 22.30%	
64 PSV Km. 54+424.37 72.00%	73 PSV Km. 63+517.92 46.60%	
65 PSV Km. 54+952.42 59.30%	74 PSV Km. 64+800 24.60%	

Simbología


	Por construir
	En proceso de construcción
	Concluido

San Luis Potosí

La Pitahaya-Libramiento Oriente de S.L.P.y el Ramal Villa de Reyes

Volúmenes de obra					
Tramo I km. 0+000 al Km. 19+400 Tramo III Km. 36+000 al Km. 50+000 Tramo IV km. 50+000 al Km. 66+000					
Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	Ejecutado	03/04/26 al 09/04/26
Terracerías					
Desmonte, cualquiera que sea su tipo y características en carreteras, sin trasplante,	388.22	238.71	149.51	2.80	
Despalme de espesor variable en corte y terraplén, el material producto	733,873.06	319,167.54	414,705.52	7,245.63	
Excavaciones en cortes y adicionales debajo de la subrasante, cualquiera que sea su	2,860,090.52	178,863.45	2,681,227.07	530.20	
Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de	3,858,592.51	173,498.72	3,685,093.79	1,443.47	
Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de	3,710,618.07	301,811.82	3,408,806.25	39,781.49	
Formación y compactación de terraplenes utilizando materiales compactables	330,950.70	,324.05	308,626.65	230.20	
Formación y compactación de terraplenes utilizando materiales compactables	1,570,694.98	10,687.90	1,560,007.08	-	
Obras de Drenaje					
Excavación para estructuras u obras de drenaje, cualquiera que sea su clasificación, con una	53,714.94	3,533.48	50,181.46	-	
Plantilla de material Granular, P.U.O.T	5,780.69	271.70	5,508.99	-	
Arrope y Relleno con material de calidad de subrasante, compactado al 95% de la	74,713.07	4,034.29	70,678.78	803.10	
Alcantarilla de concreto reforzado de f'c = 280 kg/cm2, en dirección normal de 152 cm	7,394.04	602.35	6,791.69	-	
Concreto hidráulico de f'c= 100 kg/cm2 en plantilla, por unidad de obra terminada.	1,399.10	308.67	1,090.43	22.00	
Concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2, por unidad de obra terminada.	3,314.74	2,222.17	1,092.57	89.58	
Concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 en losa, por unidad de obra terminada.	13,274.04	406.22	12,867.82	16.35	
Acero para concreto hidráulico con límite elástico igual o mayor de fy = 4200 kg/cm2	356,544.18	109,224.66	247,319.52	1,924.27	
Malla electrosoldada 6x6 10-10, P.U.O.T	2,330.47	653.22	1,677.25	180.13	
Entronques Terracerías					
Despalme de espesor variable en corte y terraplén, el material producto del	61,394.70	42,747.22	18,647.48	-	
Excavaciones en cortes y adicionales debajo de la subrasante, cualquiera que sea su	848,439.10	121,551.02	726,888.08	1,251.07	
Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de	325,337.10	58,783.82	266,553.28	1,434.07	

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

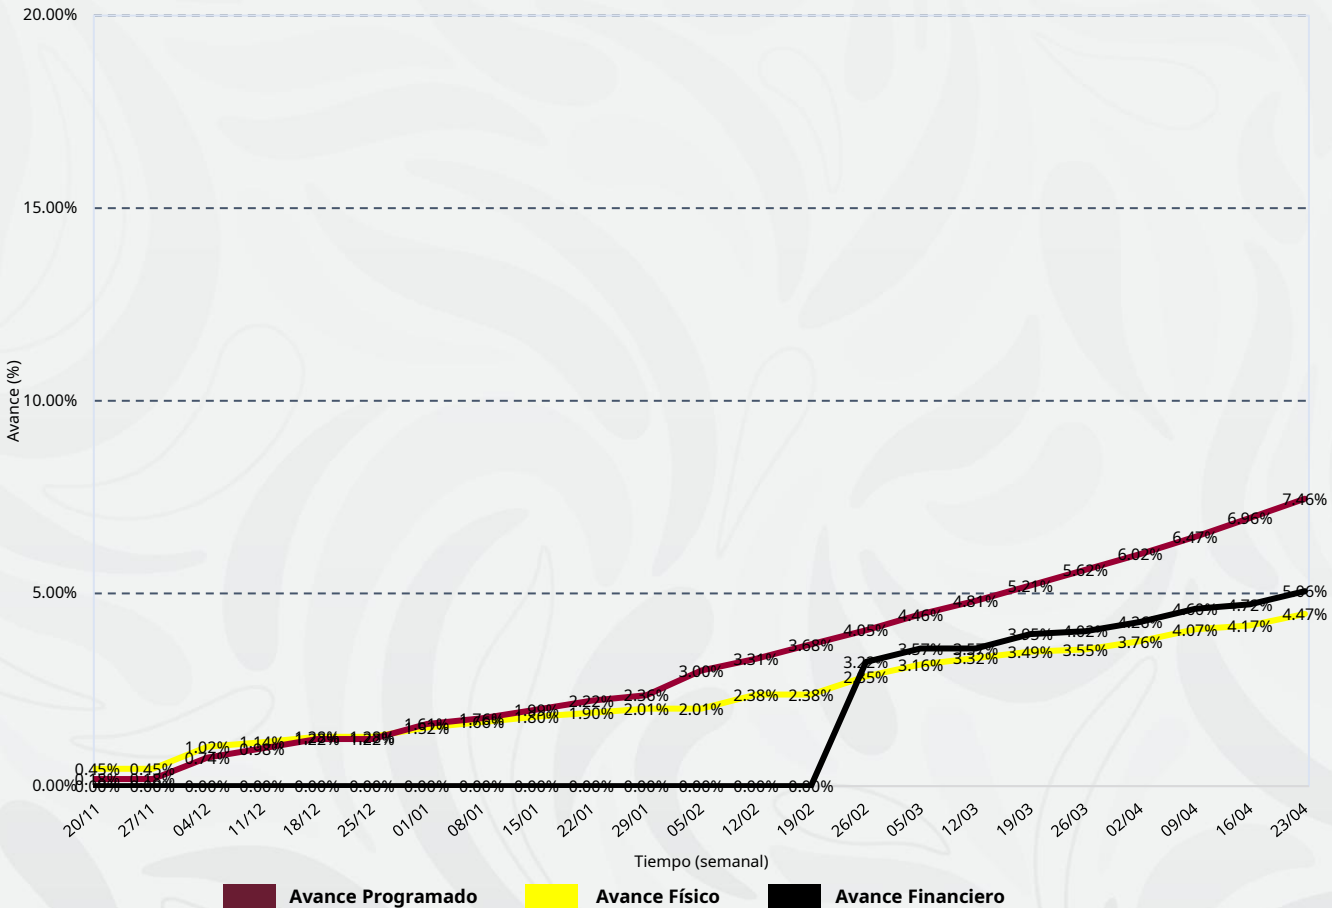

	Del 10 de abril al 16 de abril de 2026	Del 17 de abril al 23 de abril de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	706	453
Maquinaria	170	176
Frente de Trabajo	Tramo 1/Tramo 3/Tramo 4	Tramo 1/Tramo 3/Tramo 4
