


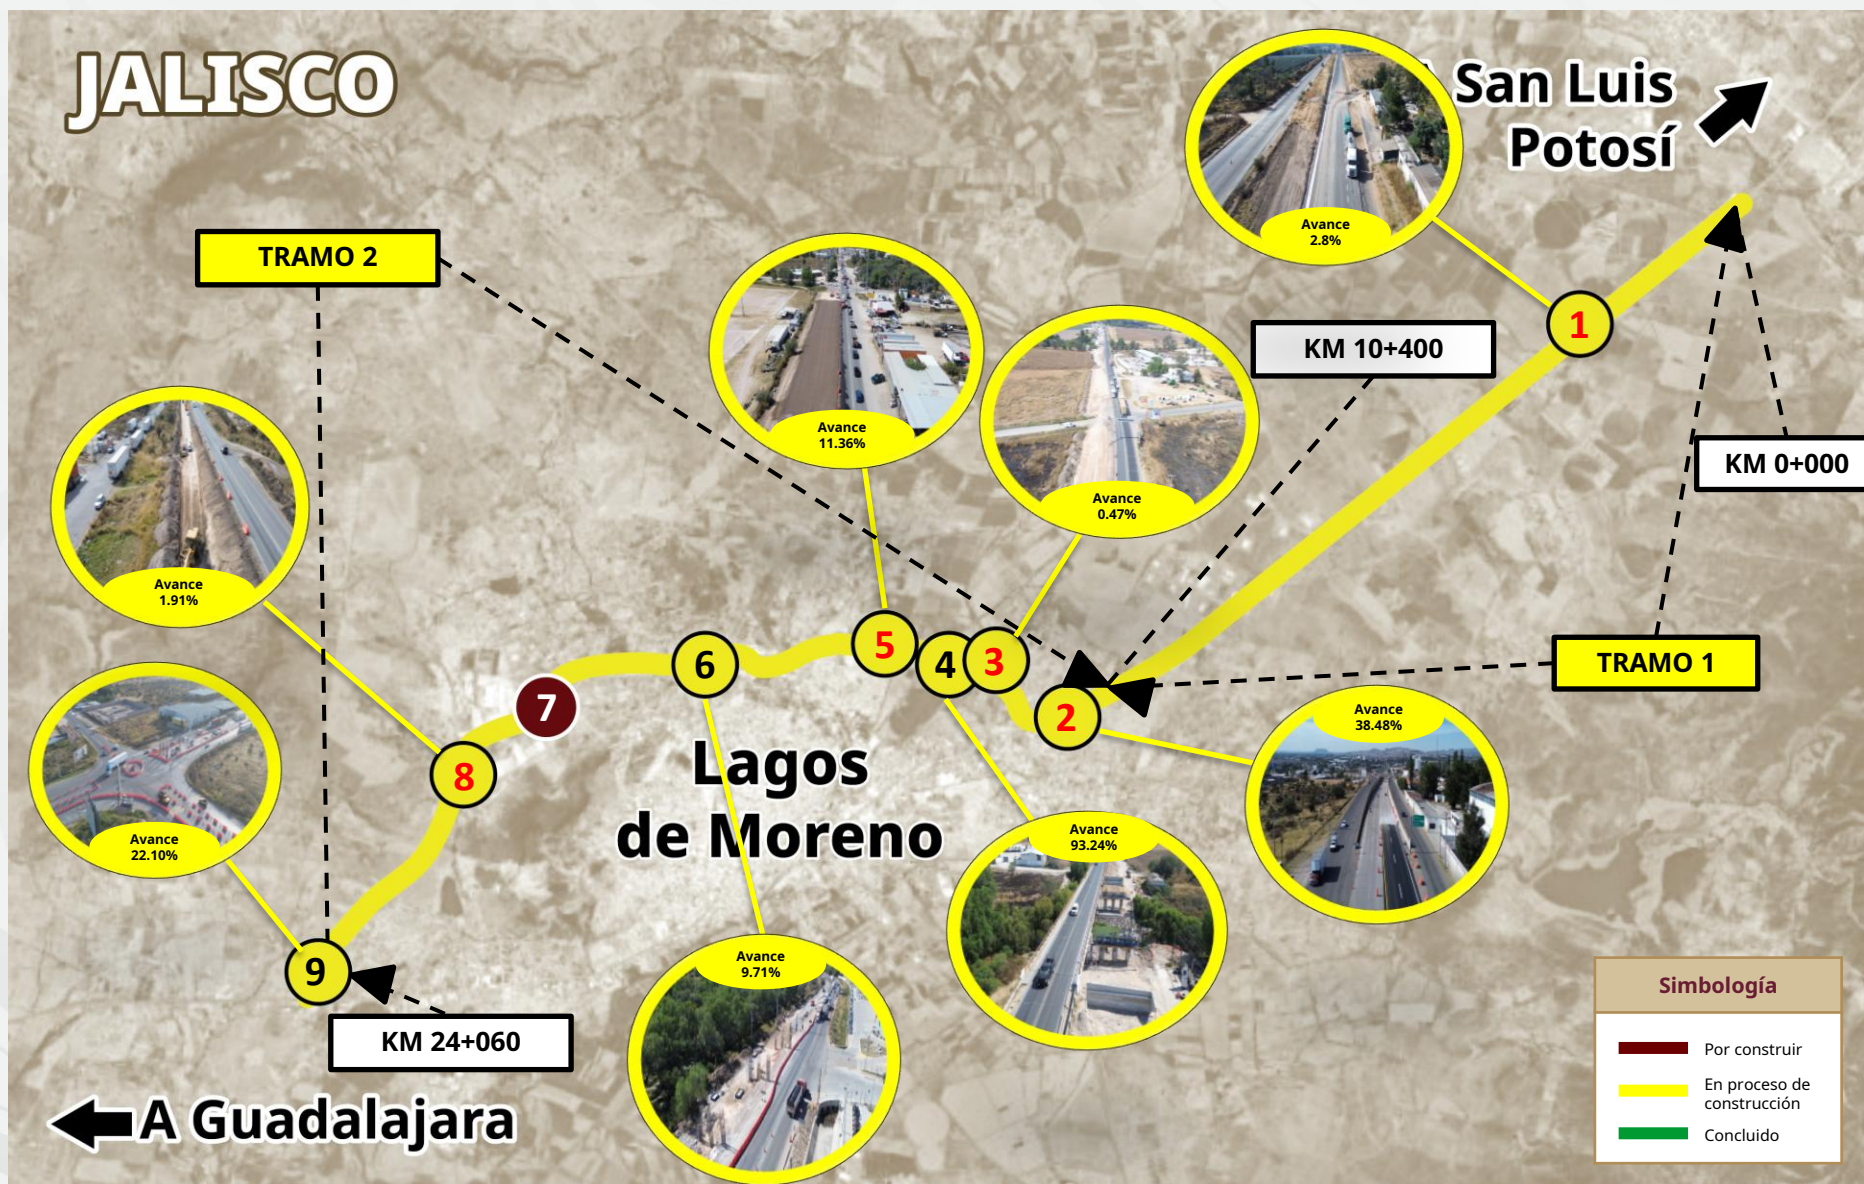


Descripción	
1	PIV con entronque "El Maguey" km 1+300 - Avance 2.8% . (Problemas de DDV. (Modificación de proyecto).
2	Entronque a desnivel Lagos de Moreno Este km 11+800 (adecuación)- Avance 38.48% (se movió la fuerza de trabajo).
3	PIV con entronque "Fracc. Andalucía" km 12+120 Avance 0.47% . (se movió la fuerza de trabajo).
4	Puente km 12+450 "Río Lagos"- Avance 93.24% .
5	PIV con entronque "Sepúlveda" km 13+620 Avance 11.36% . (se movió la fuerza de trabajo).
6	PSV con entronque "DRÄXLMAIER" km 15+900 Avance 9.71%
7	PIV con entronque "Encarnación" km 18+200
8	PSFC con retornos km 19+860 Avance 1.91% (se movió la fuerza de trabajo).
9	PIV con entronque Tipo Glorieta "Lagos de Moreno Oeste" km 23+920 Avance 22.10% .

Jalisco

Ampliación Libramiento Lagos de Moreno

TRAMO 2 - AVANCE TRONCAL Y ENTRONQUES							
Concepto	Unidad	Total	Ejecutado	Faltante	17/04/26 al 23/04/26		Observaciones
					Programado	Ejecutado	
Terracerías Troncal	%	100%	52.55%	47.45%	0.014	0.0%	En proceso
Obras Inducidas	%	100%	12.72%	87.28%	0.00	2.10%	En proceso
Entronque 23+920	%	100%	22.10%	77.90%	0.00	0.10%	En proceso
Entronque km 15+900	%	100%	9.71%	90.29%	0.00	1.45%	En proceso

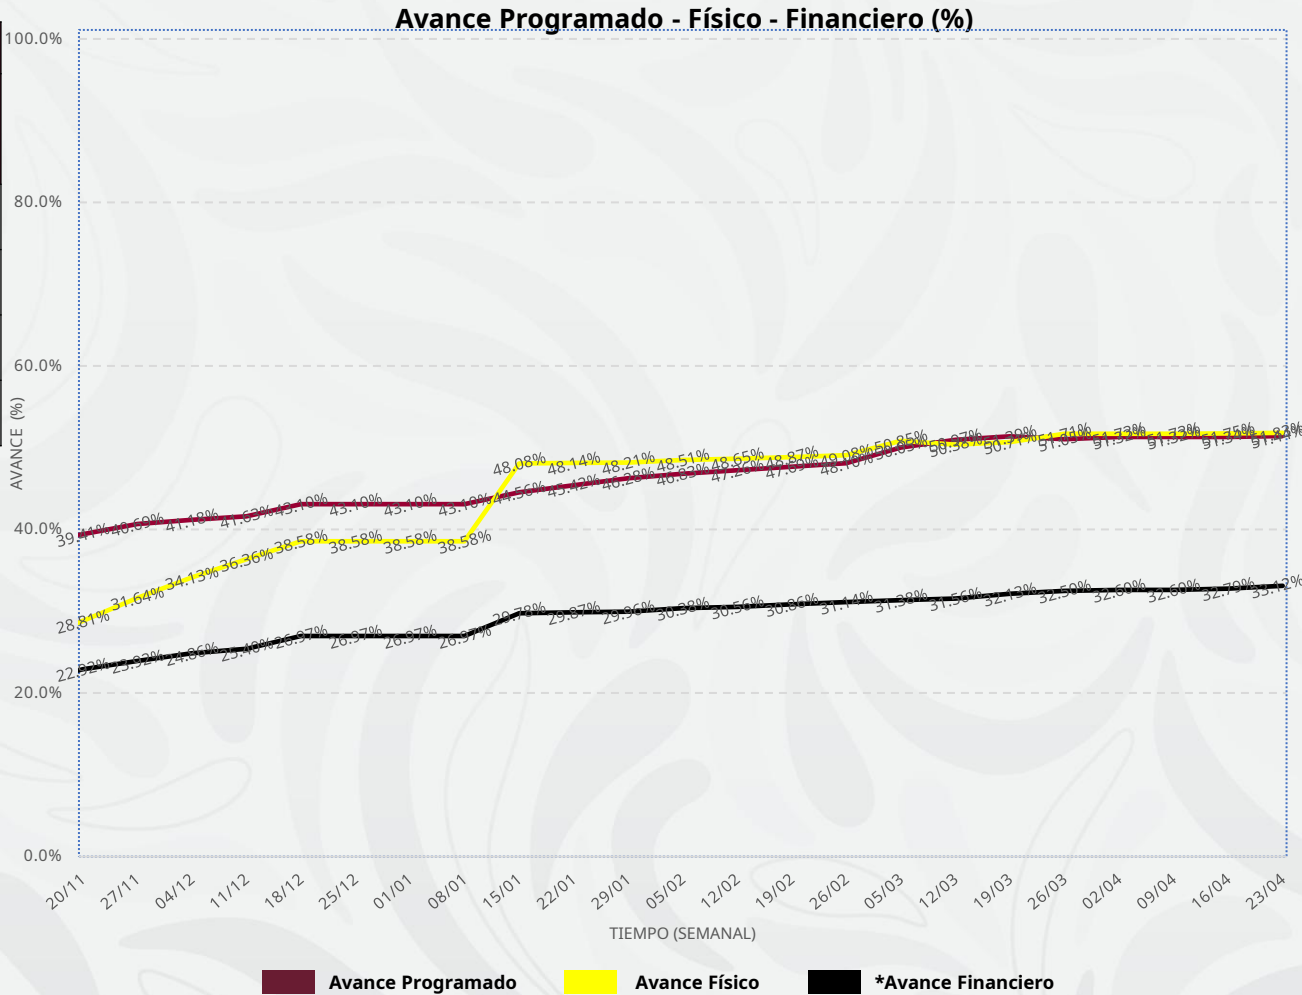

	10 de abril al 16 de abril 2026	17 de abril al 23 de abril 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	246	246
Maquinaria	69	69
