



Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha

Concesionaria: IDEAL
Constructora: MOTA-ENGIL, S.A. de C.V.

VERACRUZ

PSMA 6.0 4.00X4.50 KM 6+082.
trabajos de conformación de
aproche concluidos.

PUENTE 7.3 KM 7+373 En
proceso de perforación pila
01 del cargadero 01

PUENTE 7.8 KM 7+815
CLARO No. 01 Trabajos de
desvío de línea de media
tensión a cargo de CFE.

Simbología

- Por construir
- En proceso de construcción
- Concluido



Descripción

1	Entronque Laguna Verde II Km 0+000
2	PSMA 1.5 Km 1+555.5
3	PSMA 2.7 Km 2+703.91
4	PIV 3.05 Km 3+041
5	Entronque Laguna Verde I Km 3+041
6	PSMA 3.9 Km 3+900
7	PSMA 6.0 Km 6+080
8	PIV 6.8 Km 6+806 (96.00%) (se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo para obra de drenaje en rampa de acceso.).
9	PIV 7.04 Km 7+040 (5.00%) Se continua con la evaluación de la reubicación de la estructura.
10	PUENTE 7.3 Km 7+330 (3.33%) En proceso de perforación pila 01 del cargadero 01
11	PUENTE 7.8 Km 7+815, (61.70%) (Se realiza el desvío de línea de media tensión en claro no. 01).
12	PLAZA DE COBRO Km 8+300, (16.00%) (El proyecto ejecutivo está en revisión en la DGDC).
13	PUENTE 8.7 Km 8+665, (96.00%) a nivel de losa colada
14	PSMA 8.9 Km 8+960,
15	PUENTE 14 Km 14+000
16	PUENTE 14.7 Km 14+700
17	PSV Km 14+900
18	PSMA 15.3 Km 15+370
19	PSV 16.8 Km 16+800
20	ENTRONQUE LA MANCHA Km 19+841

Avance físico

- Programado: 76.33%
- Real: 29.35% Incluye Ent. Chapachapa
- Financiero: 15.64%
- Semanal: 0.52%



Inversión: 2,252.78 mdp



Inicio: Marzo de 2025
Término: Agosto de 2026



Meta: 19.84 km, 5 Puentes,
1 Plaza de Cobro, 3 Entronques,
2 PSVs, 3 PIVs, 6 PSMA, 59 ODTs
y el Entronque Chapachapa



2,252.78 (1)=2,253 empleos directos
generados/millón de inversión
2,252.78 (2)= 4,506 empleos
indirectos generados/millón de
inversión



128,000 habitantes beneficiados



45 minutos de ahorro en tiempo,
Tramo 4

Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha



Concesionaria: IDEAL
Constructora: MOTA-ENGIL, S.A. de C.V.



Avance físico

- Real: 100.00%
- Programado: 100.00%
- Financiero: 75.01%
- Semanal: 0.00%

Descripción	
1	Entronque Chapachapa Km 739+733 (Km op. 92+512)
2	ODT 92+827.25
3	PSPyG 92+832.22
4	Ampliación de ODT 100+102,


Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha



Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	16/04/26 al 23/04/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Tramo 4 Laguna Verde - La Mancha						
Volúmenes de obra						
Corte	1,414,039.20	178,797.34	1,235,241.86	27,193.00	6,095.39	El volumen programado corresponde a los 19.8 km y solo se trabaja en 7.6 km .
Terraplén	1,155,915.50	203,986.90	951,928.60	20,641.00	8,240.26	El volumen programado corresponde a los 19.8 km y solo se trabaja en 7.6 km .
Pedraplén	97,038.03	53,725.47	43,312.56	4,043.25	1,411.73	El volumen programado corresponde a los 19.8 km y solo se trabaja en 7.6 km .
Subyacente	162,462.20	64,624.79	97,837.41	27,077.03	2,547.51	El volumen programado corresponde a los 19.8 km y solo se trabaja en 7.6 km .
Subrasante	124,961.00	17,283.51	107,677.49	17,851.57	1,550.98	El volumen programado corresponde a los 19.8 km y solo se trabaja en 7.6 km .
Estructuras Tramo 4 Laguna Verde - La Mancha						
Cargaderos	2	0	2	0	0	Puente 7.3 Km 7+373 En proceso de perforación pila 01 del cargadero 01
Apoyos	2	0	2	0	0	Puente 7.3 Km 7+373
Pilas	12	0	12	0	0	Puente 7.3 Km 7+373 En proceso de perforación pila 01 del cargadero 01

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

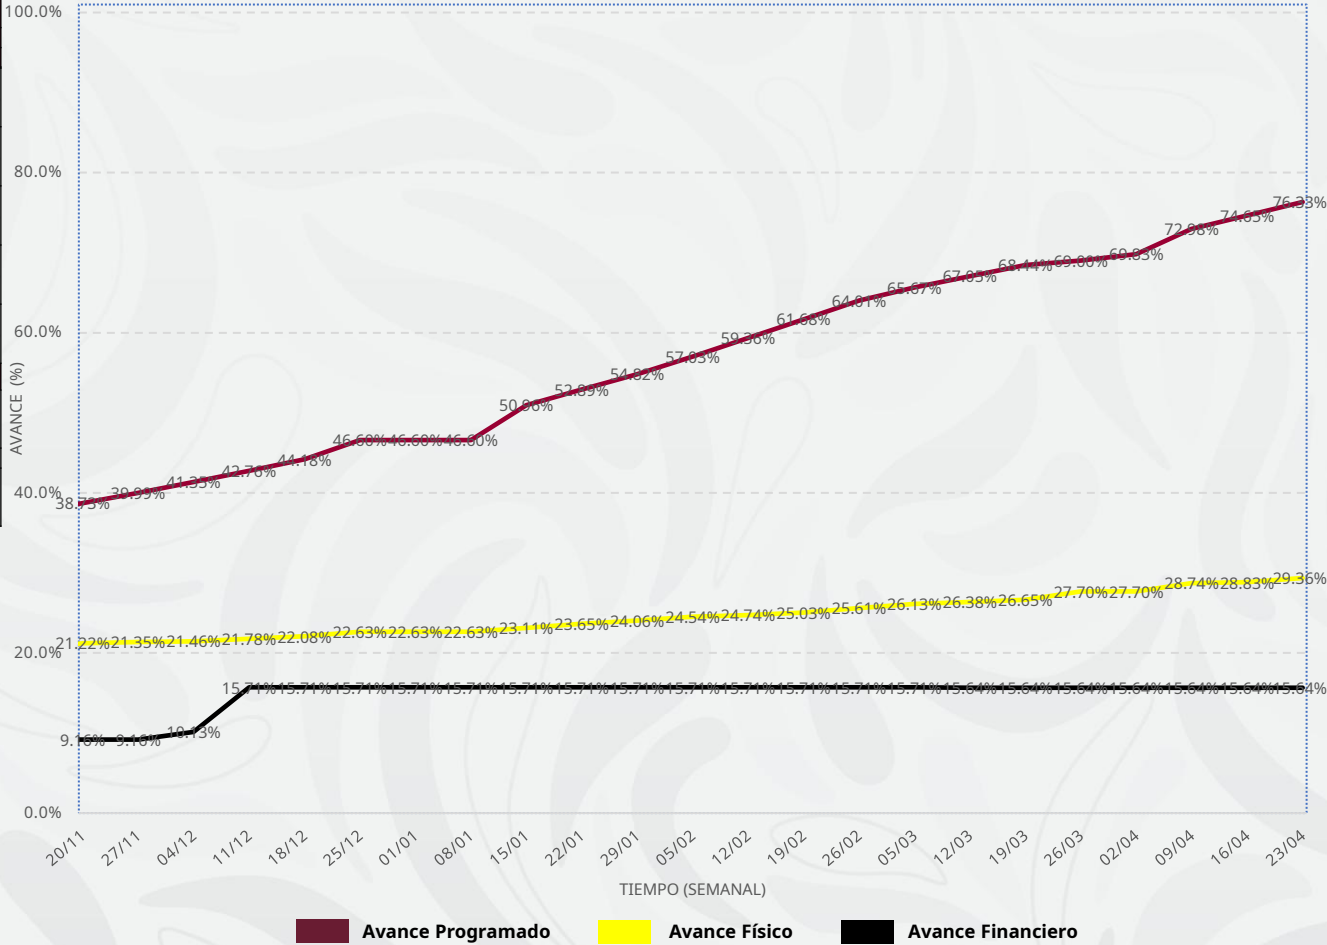

	03 de abril al 09 de abril	10 de abril al 16 de abril	17 de abril al 23 de abril
Fuerza de Trabajo (personas)	113	118	158
Maquinaria	21	28	27
