


Nayarit

Tramo Tepic-Compostela

CONCLUIDA

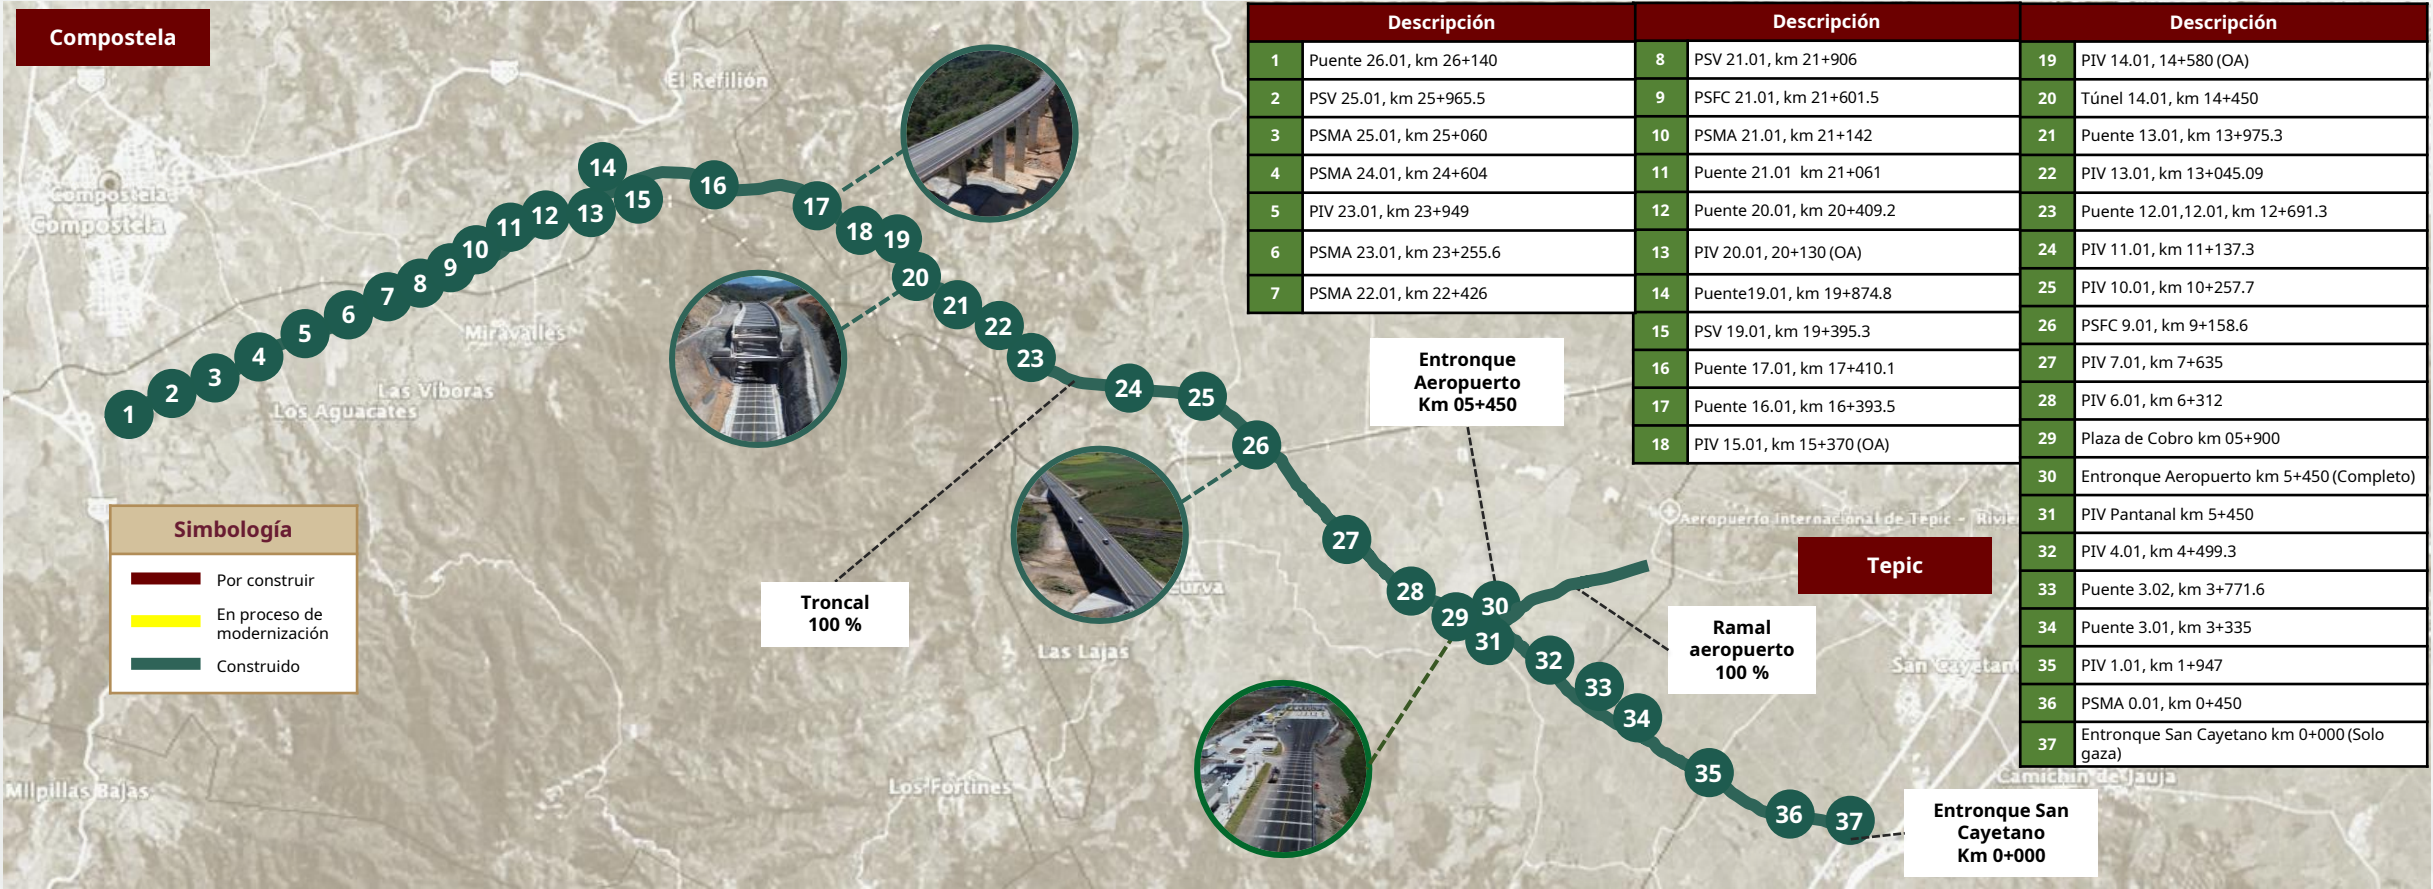

Concesionaria: FONADIN

Avance físico

- Programado: 100 %
- Real: 100 %
- Financiero: 96.70 %
- Semanal: 0.0004 %



Inversión: 2,473.43 mdp (solo troncal y estructuras, no considera Ramal Aeropuerto*)



Meta: 30.17 km. (26 km en troncal y 4.17 en estructuras)
1 Túnel Falso, 1 Plaza de cobro, 10 Puentes, 2 PSFC, 1 Entronque (solo gazas) y 1 Entronque completo (Aeropuerto) y 21 Cruces (no considera Ramal Aeropuerto*) y múltiples obras de drenaje.

* Una vez que se cuente con el monto del Ramal Aeropuerto se actualizará la Inversión y Meta.



Inicio: Marzo 2023
Término: Septiembre 2025



2,473 empleos directos generados P/MDI
4,946 empleos indirectos generados P/MDI



490 mil habitantes beneficiados



35 minutos de ahorro en tiempo


Nayarit

Tramo Tepic-Compostela



Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Tepic- Compostela

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	09/04/2026 al 16/04/2026		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Terraplén (m3)	2,095,966.26	2,095,954.62	11.64			
Subyacente (m³)	290,689.00	281,764.49	8,924.51			
Puente 16.01 km 16+393.50						
Columnas	8	8	0			Trabajos concluidos.
Cortes (m³) Estabilización de taludes	2,443,497.56	2,423,372.63	20,124.93			
Obras de drenaje	77	77	0			Trabajos concluidos.
P.S.F.C. 9.01 km 09+158.50						
Losa (claro)	7	7	0			Trabajos concluidos.
P.S.F.C. 21.01 km 21+601.50						
Junta de dilatación (pza)	2	2	0			

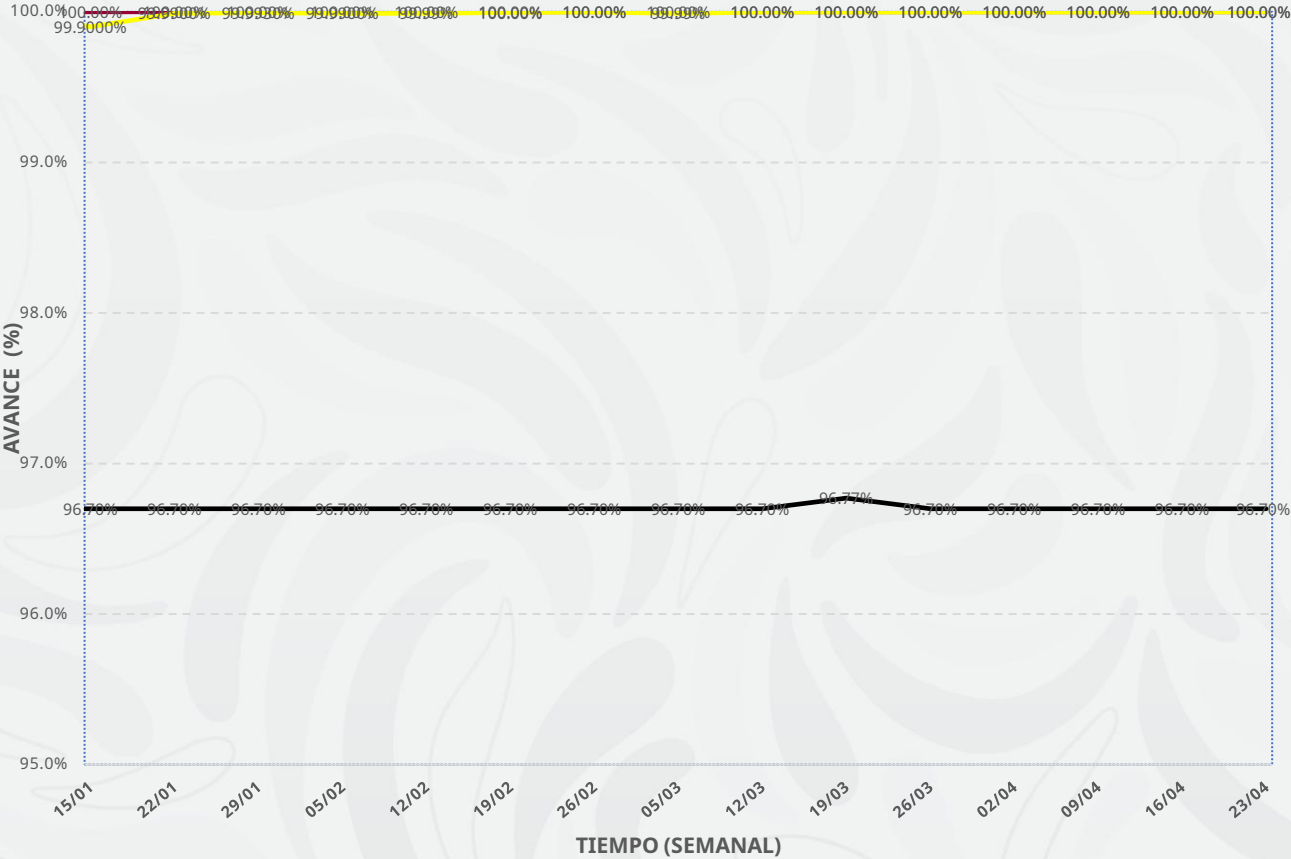

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	10 de abril al 16 de abril	17 de abril al 23 de abril
Fuerza de Trabajo (personas)	70	70
Maquinaria	10	10
Frente de Trabajo	Ramal Aeropuerto, Plaza de Cobro km 05+900	Ramal Aeropuerto, Plaza de Cobro km 05+900
