


# Michoacán

## Uruapan-Nueva Italia

**Avance físico**

- Programado: 16.33 %
- Real: 16.54 %
- Semanal: 0.75 %
- Financiero: 0%

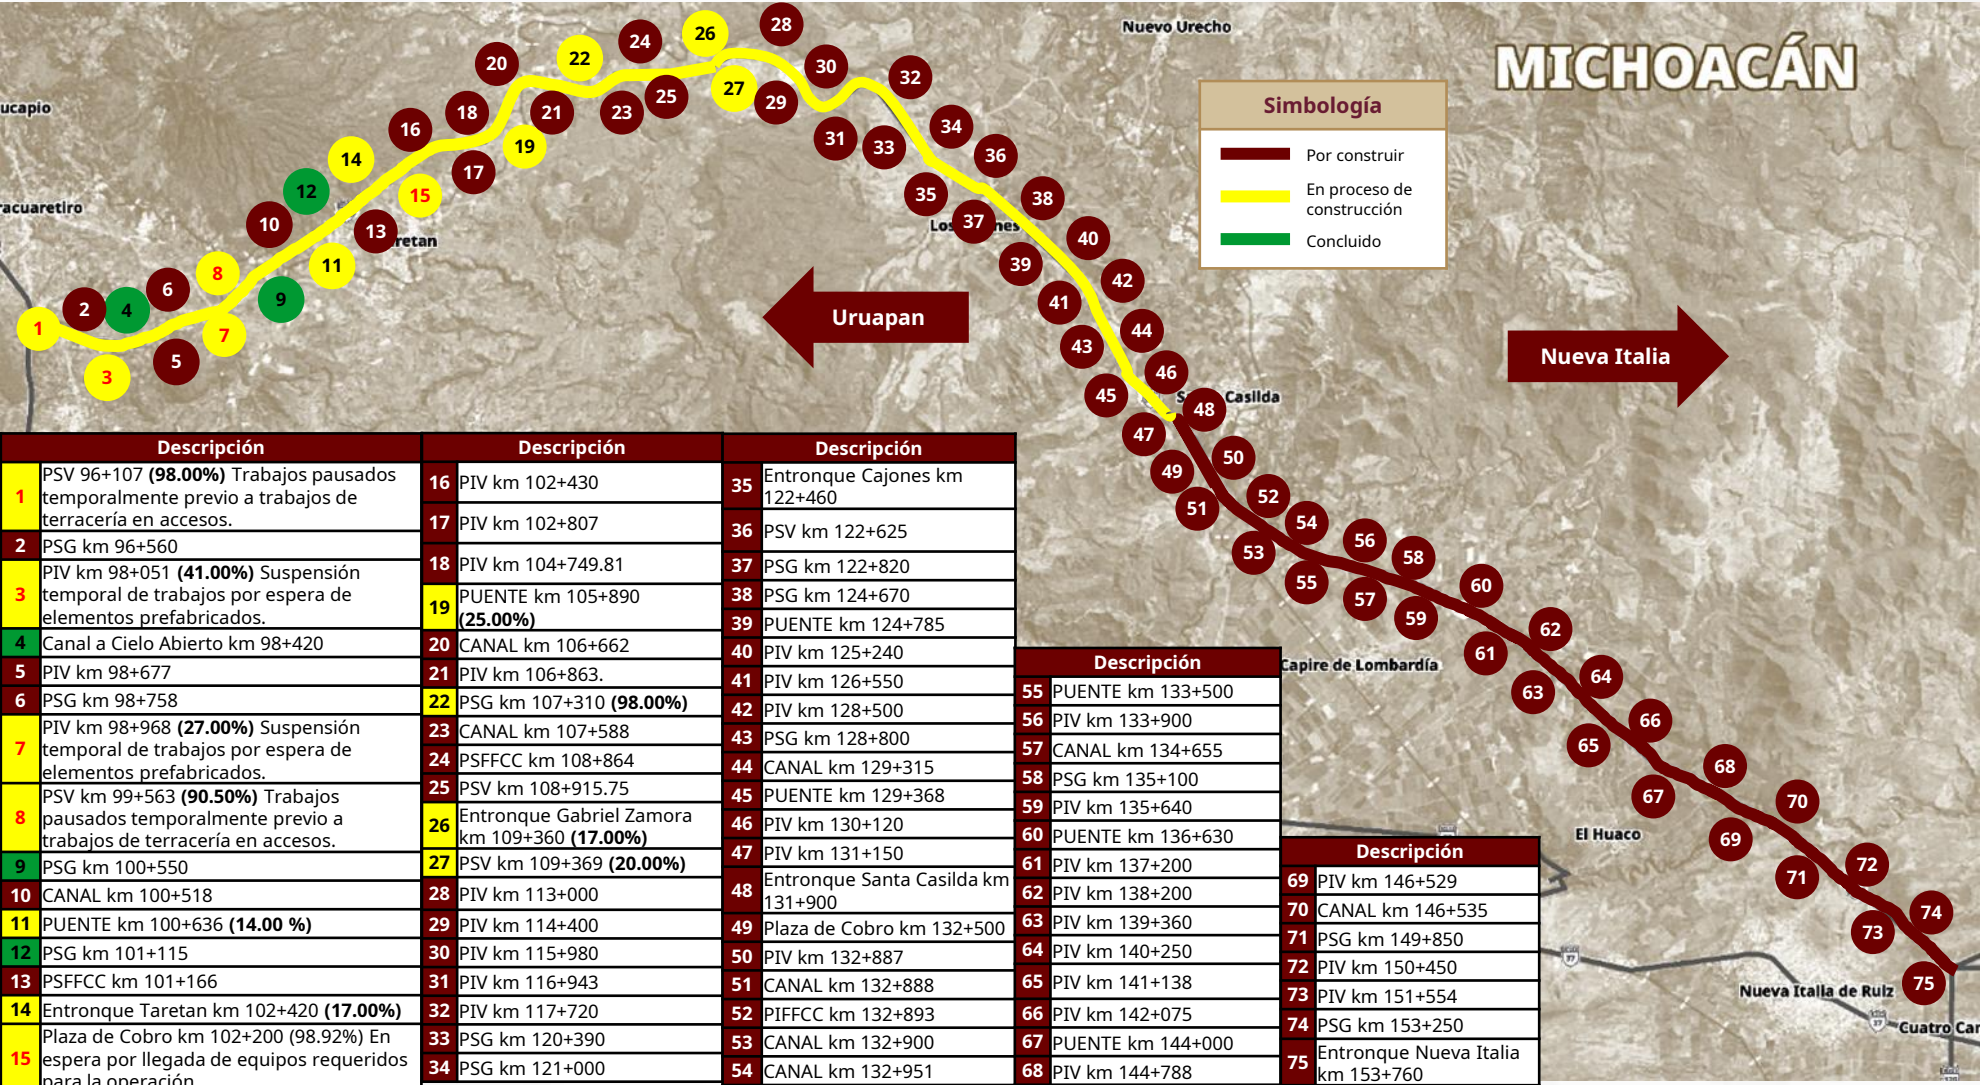

-  **Inversión: 7,049 mdp**
-  **Inicio:** noviembre de 2023  
**Término:** agosto de 2027
-  **Meta: 67.09 km**  
65.00 km (troncal)  
2.09 km (estructuras)  
2 plazas de cobro, 7 puentes,  
5 entronques, 61 cruces y  
múltiples obras de drenaje.
-  **21,147** empleos generados  
**7,049** empleos directos  
**14,098** empleos indirectos
-  **1,800,000** habitantes  
beneficiados
-  **25 minutos** de ahorro  
en tiempo
- Concesionaria : PINFRA.**

# Michoacán

## Uruapan-Nueva Italia


Elemento	Meta	Ejecutado acumulabl e	Faltante	18/12/2025 al 25/12/2025		Observaciones
				Programa do	Ejecutad o	
Base Asfáltica	65 km	7.90 km	57.10km	.300 km	.300 km	
Base Hidráulica	65 km	8.60 km	56.40 km	.200 km	.200 km	
Subbase	65 km	9.50 km	55.50 km	.200 km	.200 km	
Subyacente	65 km	11.60 km	53.40 km	.200 km	.200 km	
Km 100+636 Puente Cimentació n profunda	4	1	3	1	1	Cimentación profunda para pilas pilotes C1
Km 105+890 Puente Subestructu ra	5	0	5	1	1	Armado de acero de refuerzo para pilas
Km 109+369 PSV Subestructu ra	1	0	1	1	1	Colado de zapata C1 y dentellón



Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

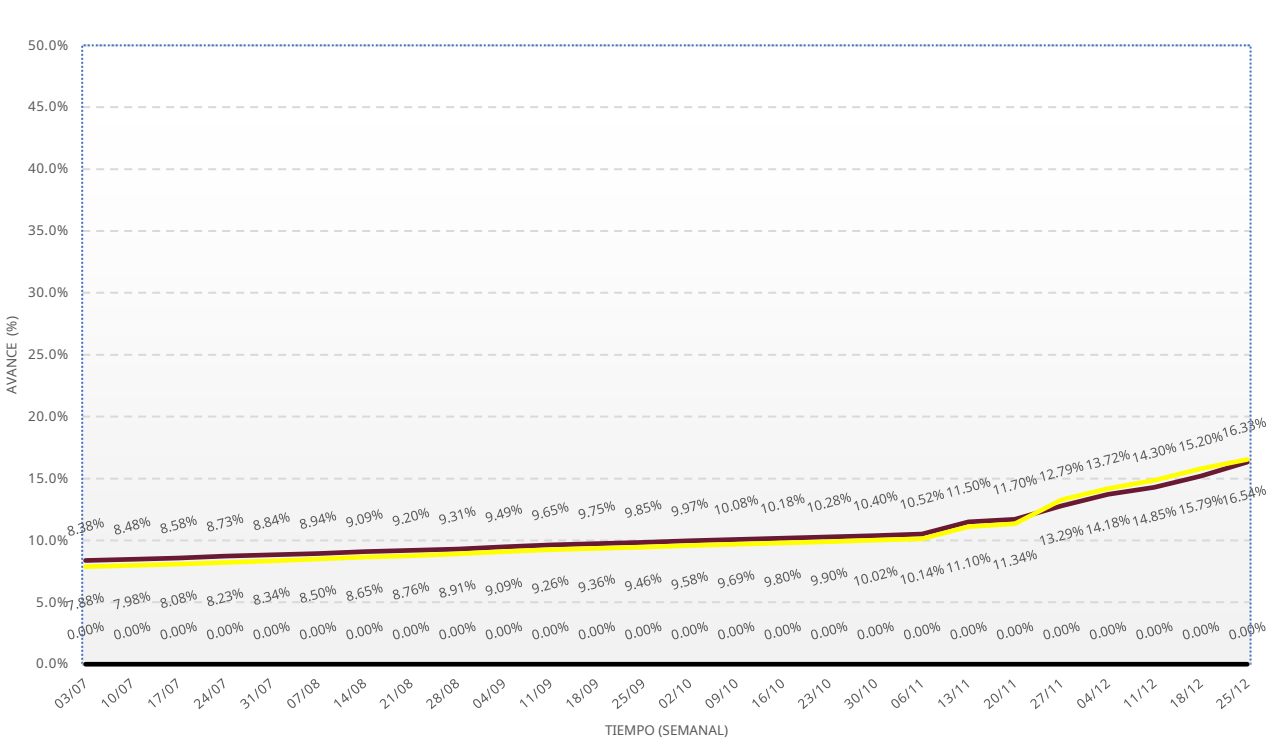

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	Del 11 de diciembre al 18 de diciembre.	Del 18 de diciembre al 25 de diciembre.
Fuerza de Trabajo (personas)	800	800
Maquinaria	245	245
Frente de Trabajo	Troncal del km 95+000 al km 140+000, PIV km 98+051, PIV km 98+968, PSG km 100+550, PSG km 101+115, Entronque Taretan km 102+140, Puente km 105+890, PSG km 107+310, Entronque Gabriel Zamora km 109+360, PSV km 109+369	Troncal del km 95+000 al km 140+000, PIV km 98+051, PIV km 98+968, PSG km 100+550, PSG km 101+115, Entronque Taretan km 102+140, Puente km 105+890, PSG km 107+310, Entronque Gabriel Zamora km 109+360, PSV km 109+369



**2025**  
Año de  
**La Mujer Indígena**
