Chiapas

Entronque San Cristóbal






Concesionaria de Autopistas del Sureste SA de CV

Avance físico • Programado: 0.00% • Semanal: 0.00%

• Real: 25.17%

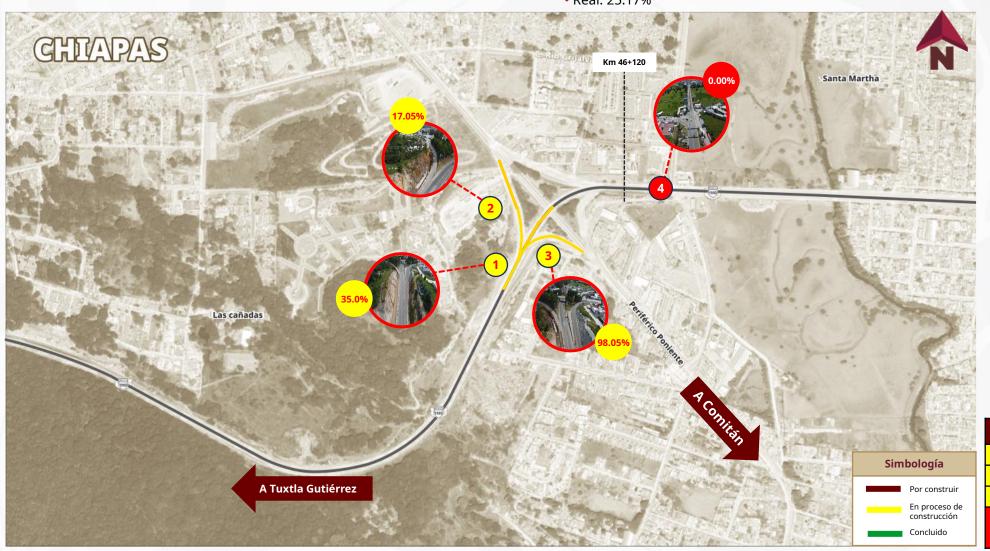

6 Inversión: 44.96 mdp

Meta: 1 Entronque

R Avance físico:

• Real: 25.17%

• Financiero: 22.96%

Inicio:

Término: Por definir

135 empleos generados

200,000 mil habitantes beneficiados

- Mayor movilidad hacia los diferentes destinos.
- Disminución de accidentes.
- Se evitan vueltas prohibidas.

| | Descripción | Observaciones |
|---|---|--|
| 1 | Eje 50: 35.00% | El 22-Jul-2025, La Concesionaria entregó a la DGDC, la solicitud de reanudación de los trabajos, junto con el programa de obra para su autorización. |
| 2 | Eje 2: 17.05% | |
| 3 | Eje 20: 98.05% | |
| 4 | Eje 4 (Glorieta a nivel de piso): 0.00% | |
