Chiapas

Entronque San Cristóbal






Concesionaria de Autopistas del Sureste SA de CV

Avance físico • Programado: 0.00% • Semanal: 0.00%

• Real: 25.17%

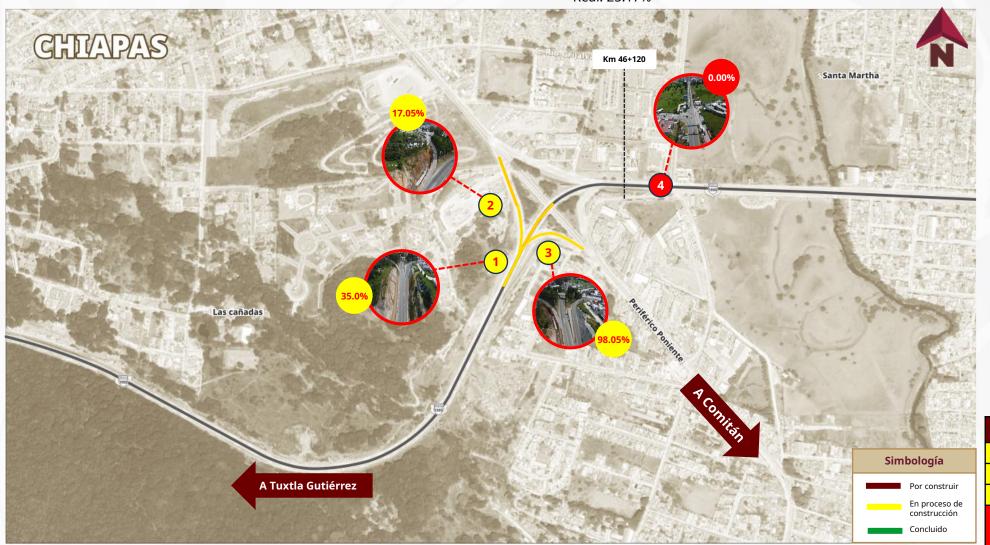

Inversión: 44.96 mdp

Meta: 1 Entronque

Avance físico:

• Real: 25.17%

• Financiero: 22.96%

Inicio:

Término: Por definir

135 empleos generados

200,000 mil habitantes beneficiados

- Mayor movilidad hacia los diferentes destinos.
- · Disminución de accidentes.
- Se evitan vueltas prohibidas.

	Descripción	Observaciones
1	Eje 50: 35.00%	El 22-Jul-2025, La Concesionaria entregó a la DGDC, la solicitud de reanudación de los trabajos, junto con el programa de obra para su autorización.
2	Eje 2: 17.05%	
3	Eje 20: 98.05%	
4	Eje 4 (Glorieta a nivel de piso): 0.00%	
