

Michoacán

Tramo Pátzcuaro-Uruapan

Avance físico


- Programado: 100 %
- Real: 99.00%
- Semanal: 0.25 %
- Financiero: 69.85%

- Fuerza de trabajo : 5,376 personas
- Empleos directos : 1,792 personas
- Empleos indirectos : 3,584 personas



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

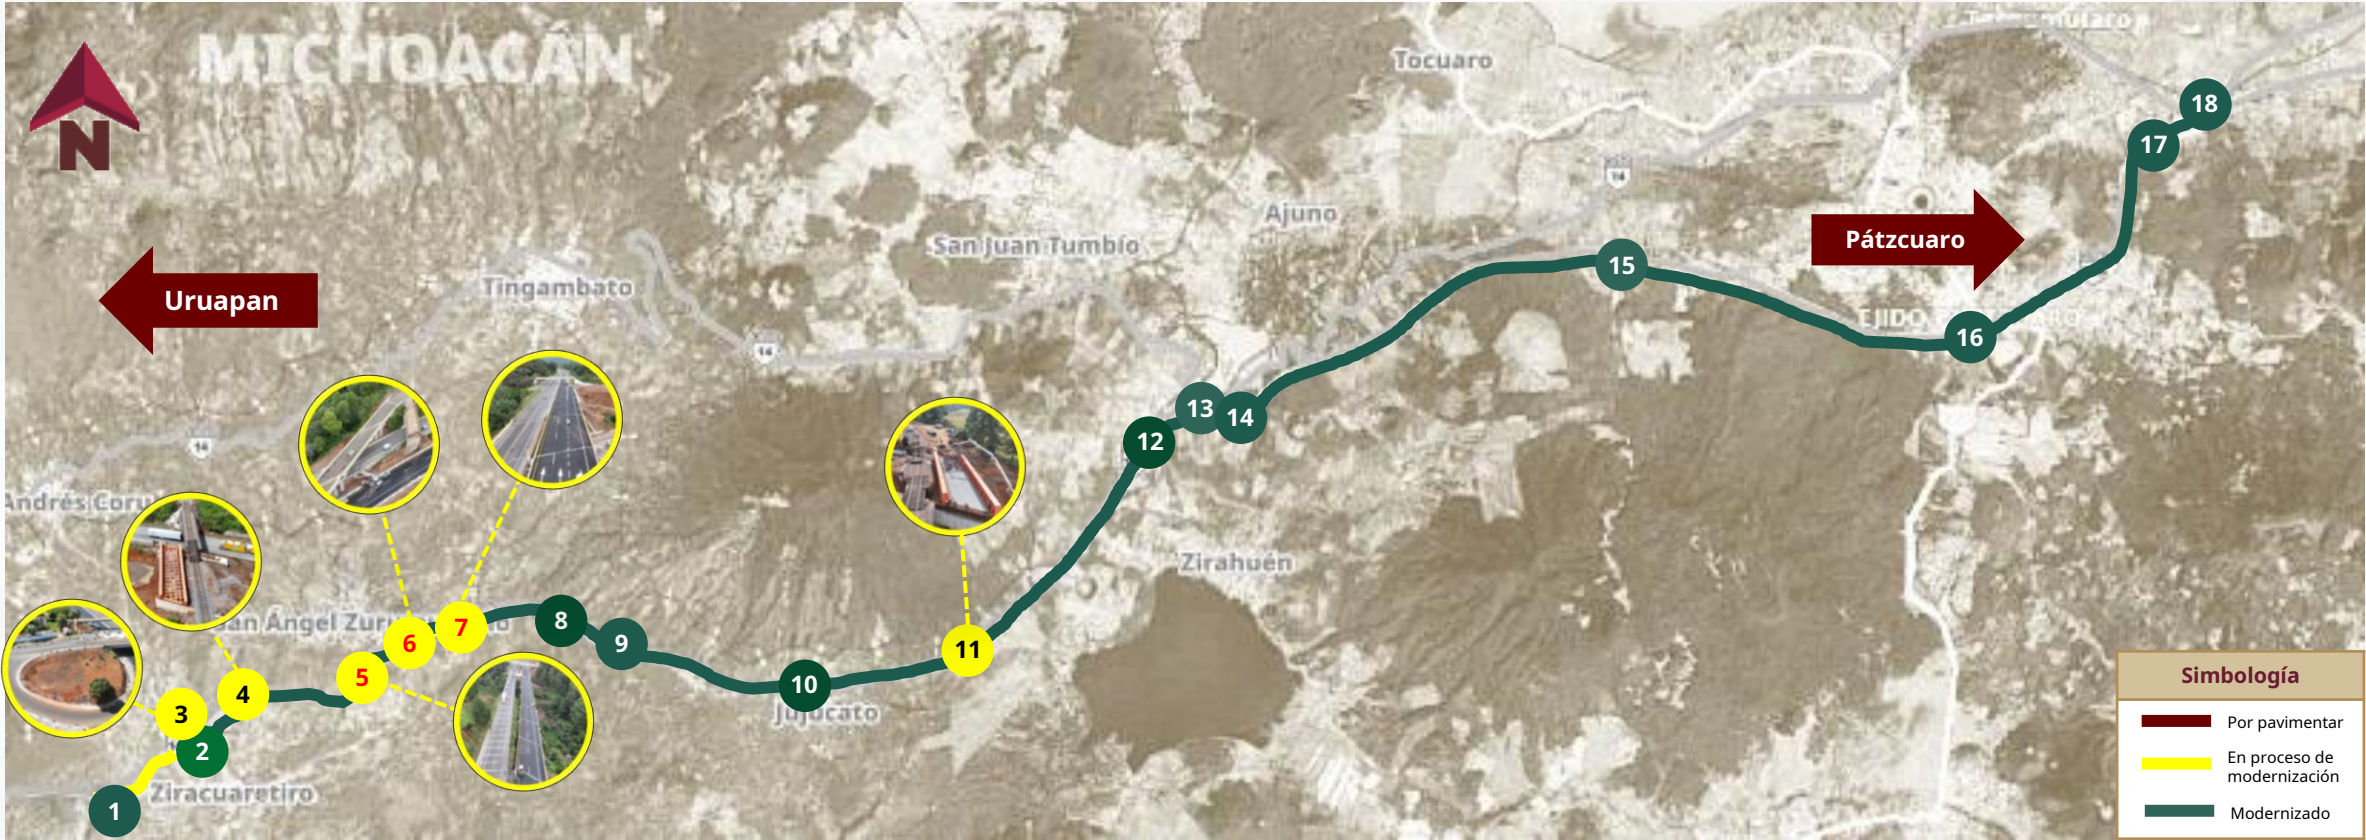

Descripción		Descripción		Descripción	
1	Entronque Zirimicuaro km 93+500	7	Entronque San Ángel km 87+400, (99.95%) En espera de verificación para recepción de los trabajos	14	Caseta de cobro remota Zirahuén 68+600
2	Puente canal km 92+210	8	Rampa de emergencia II km 86+500	15	Plaza de cobro Zirahuén km 60+500
3	Entronque Caracha km 92+100, (98.50%).	9	Rampa de emergencia I km 84+100	16	Entronque Pátzcuaro II km 53+600
4	PIFFCC km 91+754, (51.50%).	10	Entronque Jucucato km 79+489	17	Entronque Pátzcuaro I km 47+500
5	Puente Canintzio km 88+283, (99.95%) En espera de verificación para recepción de los trabajos	11	PIFFCC km 73+584, (57.00%)	18	Entronque las trojas km 47+00
6	PIV km 88+054, (99.95%) En espera de verificación para recepción de los trabajos	12	Viaducto Zirahuén km 70+278		
		13	Entronque Zirahuén km 68+600		



Inversión: 1,792 mdp



Inicio: Julio 2017
Término: febrero-2026



Meta: 46.79 km; 58 Totales (1 plaza de cobro, 1 puente, 1 viaducto, 8 entronques, 45 cruces, 2 rampas de frenado).



200 mil habitantes beneficiados



25 minutos de ahorro en tiempo.


Concesionaria : PINFRA.

Michoacán

Tramo Pátzcuaro - Uruapan

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	27/11/2025 al 04/12/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Troncal						
PIFCC km 73+584. Superestructura	2	1	1	1	1	Colado de concreto para muro de respaldo (ménsula) de cabezal
Entronque Caracha Km 92+197 Losa de acceso	1	0	1	1	1	Suministro y aplicación de pintura de parapeto metálico en PIV
PIFCC km 91+754. Superestructura	1	0	1	1	1	Limpieza y retiro de concreto en tornillería

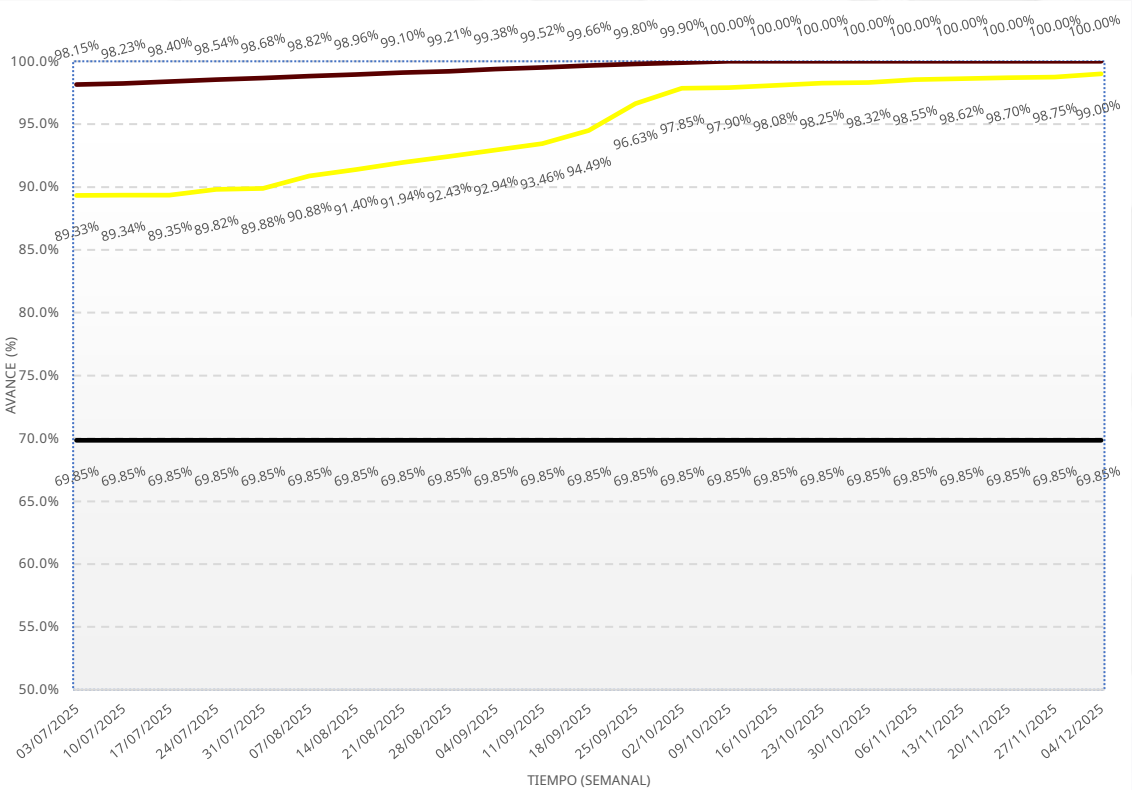

	Avance Programado	Avance Físico	Avance Financiero
	20 de noviembre al 27 de noviembre		27 de noviembre al 04 de diciembre
Fuerza de Trabajo (personas)	120		120
Maquinaria	32		32
Frente de trabajo	Entronque Caracha km 92+100, PIFFCC km 91+754 y PIFFCC km 73+584		Entronque Caracha km 92+100, PIFFCC km 91+754 y PIFFCC km 73+584



2025
Año de
La Mujer
Indígena
